



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## Změnový list

**Předkládá "Společnost ÚV Hrobice" zastoupená správcem společnosti společností VCES a.s.**

**Projekt: „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice“  
Podprojekt 1 - III. Část Intenzifikace ÚV Hrobice**

**Číslo smlouvy:** 62/20/SOD

**Číslo změnového listu:** 1/1

**Název změnového listu:** Změna druhu betonu a prefabrikované konstrukce

**Datum:** 01/2021

**Identifikační číslo EIS:** CZ. 05.1.30/0.0/0.0/17\_081/0010874

**Název smlouvy:** Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Teplého 2014  
530 02 Pardubice

**Zhotovitel:** Společnost ÚV Hrobice  
Vážní 456  
Hradec Králové, 503 14

Ve vztahu k smlouvě o dílo bude předmětná změna řešena dle zákona 134/2016  
Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou  
zakázku odst. 6, odst. 7.



## Předmět změny:

Předmětem změnového listu jsou následující změny:

SO 01 Nová budova úpravny vody

1. Změna druhu betonu FC 55/60 na beton C35/45

2. Změna monolitických konstrukcí na prefabrikované konstrukce

Vícepráce bez DPH	SO 01 Bod 1)	9 061 757,97 Kč
	SO 01 Bod 2)	459 650,20 Kč
Vícepráce bez DPH celkem		9 521 408,17 Kč
Méněpráce bez DPH	SO 01 Bod 1)	9 668 873,27 Kč
	SO 01 Bod 2)	312 734,30 Kč
Méněpráce bez DPH celkem		9 981 607,57 Kč
Rozdíl bez DPH	SO 01 Bod 1)	- 607 115,30 Kč
	SO 01 Bod 2)	+146 915,90 Kč
Rozdíl bez DPH celkem		- 460 199,40 Kč

## Zdůvodnění:

### 1. Změna druhu betonu FC 55/60 na beton C35/45

Změna druhu betonu pro nosné monolitické konstrukce nové budovy úpravy vody byla iniciována zhotovitelem z důvodu, že výrobní betonu v ekonomicky dostupné vzdálenosti nejsou schopny dodat projektovaný druh betonu s potřebnými kvalitativními certifikáty (viz příloha č. 2).

### 2. Změna monolitických konstrukcí na prefabrikované konstrukce

Změnu části monolitických konstrukcí na prefabrikované konstrukce zhotovitel inicioval z důvodu časové úspory montážních prací na staveništi na těchto konstrukcích z důvodu nezbytného omezení počtu osob při montážních pracích dle doporučení Vlády ČR v souvislosti s pandemií Covid 19. Změnou monoliticky prováděných konstrukcí na prefabrikované konstrukce dojde také ke zvýšení kvalitativních parametrů dotčených konstrukcí a možnosti výroby i za nepříznivých meteorologických podmínek omezeným počtem pracovníků.

**Z výše uvedeného vyplývá, že výše uvedené změny nebylo možno předvídat.**



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond rozvoje  
regionů

Program  
rozvoje a přerozdělení  
zemědělnictví

### Přílohy:

- Příloha č. 1 – Ocenění změny
- Příloha č. 2 – Vyjádření společnosti Cemex
- Příloha č. 3 – Vyznačení prefabrikovaných konstrukcí
- Příloha č. 4 – Bilance změn ze smlouvy ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.
- Příloha č. 5 – Stanovisko projektanta
- Příloha č. 6 – Záznam ze stavebního deníku
- Příloha č. 7 – Fotografická dokumentace

### Stanovisko projektanta:

Je formulováno v příloze 5 změnového listu.

### Změna iniciována:

Zhotovitelem na základě nepředvídatelných objektivních příčin.

### Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký:

Změnou 1 se kvalita nezmění.  
Změnou 2 se kvalita zvýší.

### Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle: NE

### Odráží se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla: NE

Termín provádění prací: 11/2020 – 04/2021

### Schválená částka změny:

Snížení ceny díla o 460 199,40 Kč bez DPH.

### Za objednatele:

Odsouhlasila: Ing. Gabriela Fialková, technická náměstkyně

Datum: 26. 2. 2021

### Za zhotovitele:

Vypracoval: Ing. Jiří Lašák

Datum: 2. 2. 21

CES a.s.  
Na Jiřské 337/3, 190 05 Praha 9  
IČ: 267 46 573

219



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

**Za Správce stavby:**

Odsouhlasil: Ing. Jaroslav Valkovič

Datum: 2. 2. 2021



ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY  
A KVALITY SV PARDUBICE  
SPRÁVCE STAVBY  
CENTROPROJEKT GROUP S.A.

**Za projektanta:**

Odsouhlasil: Ing. Jiří Forejtek

Datum: 2. 2. 2021



Vodohospodářsko-inženýrské  
služby, spol.s r.o.  
Na Střežině 1079 ①  
500 03 Hradec Králové




VCES a. s.  
Na Harfě 337/3  
Praha 9  
190 05

14. ledna 2021


**Věc: Výroba betonu C 55/60; 70 kg drátků – vyjádření**

Produkt C 55/60 nemůže být součástí dodávaných betonů na stavbu ÚV Hrobice, protože uvedený beton není v rozsahu stanoveného výrobku dle certifikátu č. 238/C6/2019/972-41 (Certifikát SŘV betonárny Pardubice Semtín). Dále jsme upozornili na pravděpodobné problémy s čerpáním betonu kvůli vysoké dávce drátků (70 kg/m<sup>3</sup>) – hrozilo by ucpávání a poškození čerpadla.

**CEMEX Czech Republic, s.r.o.**  
Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5, Stodůlky  
IČ: 27892638, DIČ: CZ27892638   
tel.: 257 257 400, fax: 257 257 480

Kateřina Cibulková  
Obchodní zástupce

**CEMEX Czech Republic, s.r.o.**  
Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, tel.: (+420) 257 257 400, www.cemex.cz  
IČ: 27892638, DIČ: CZ27892638 Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 124693  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5020017857/5500

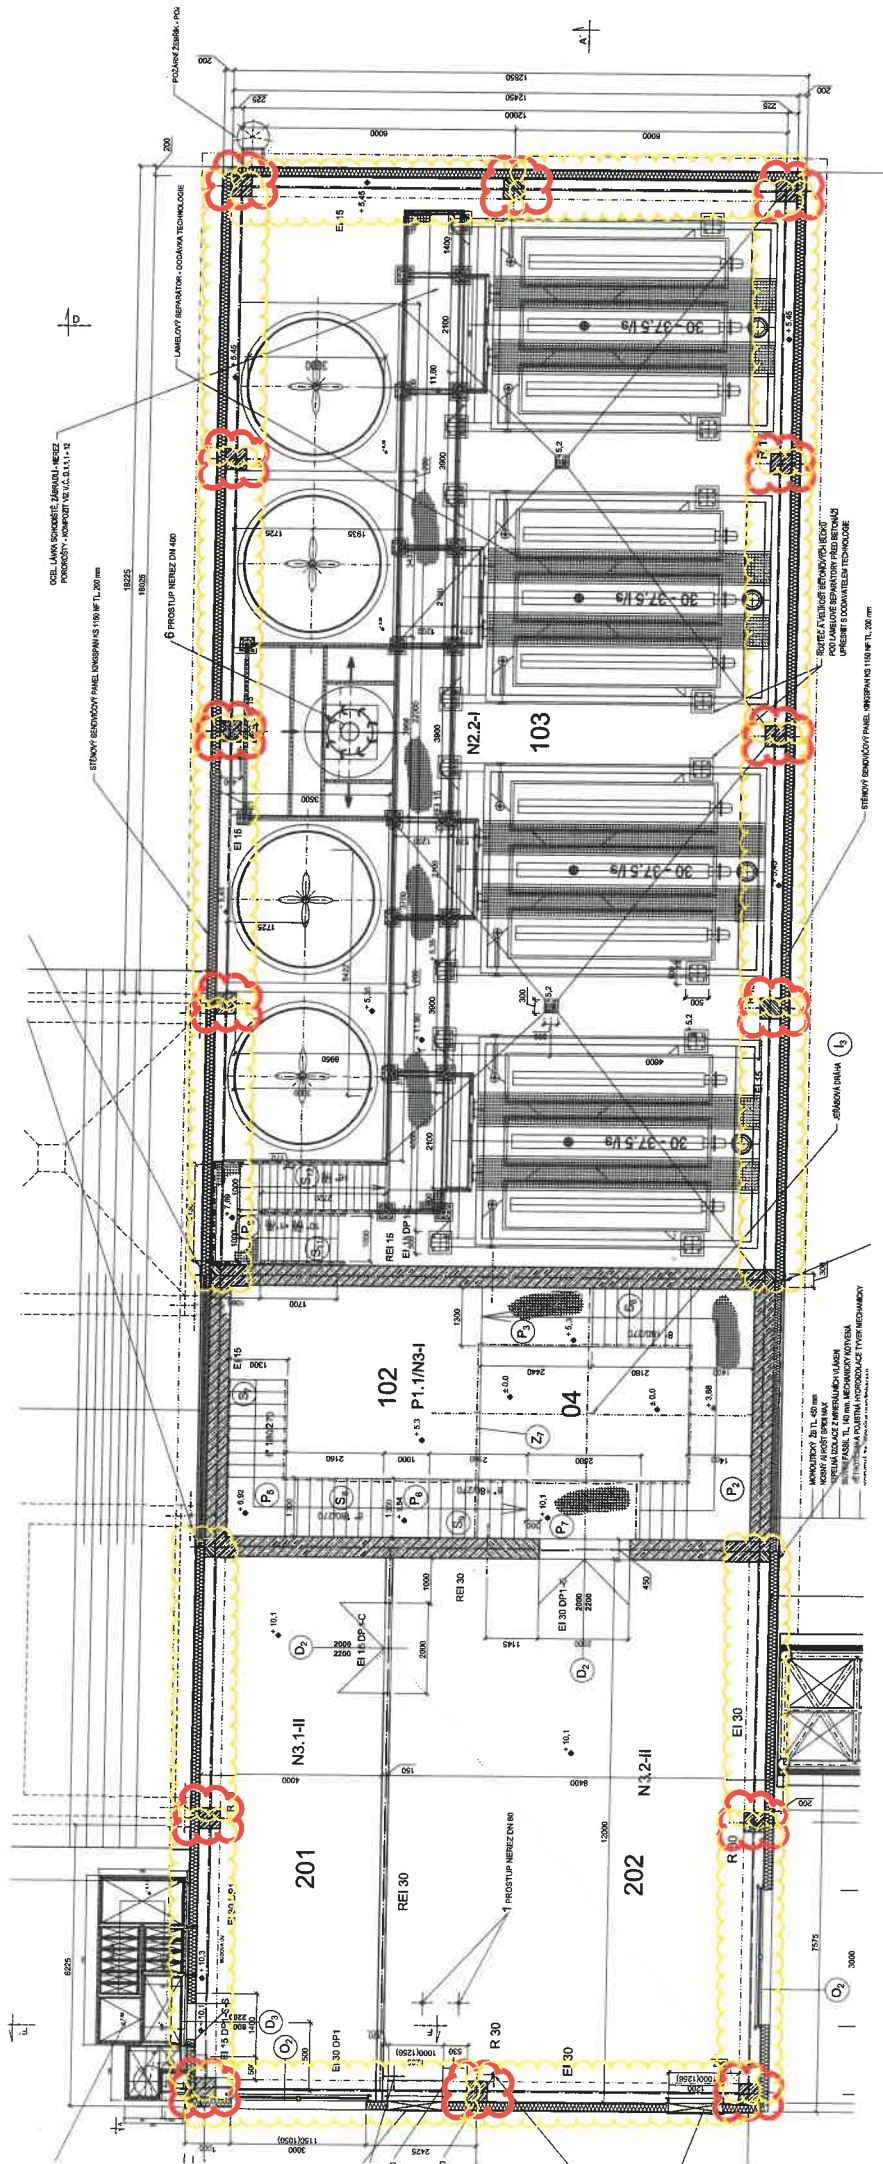

změna sloupů

změna průvlaků

**BILANCE ZMĚN ZE SMLOUVY VE SMYSLU ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 134/2016 Sb.**

Změnový list číslo a přefa konstrukce	Změna dle § 222 odst. 4 Limit 10% hodnoty smlouvy o dílo 59 695 234,27 Kč Limit 15% hodnoty stavebních prací 86 893 408,31 Kč		Změna dle § 222 odst. 5 Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč		Změna dle § 222 odst. 6 Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč		Změna dle § 222 odst. 7					
	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Rozdíl (Kč)			
1/1 Změna druhu betonu a přefa konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 650,20	312 734,30	772 384,50	9 061 757,97	9 668 873,27	-607 115,30
2. xxxxxxxxxxxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. xxxxxxxxxxxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. xxxxxxxxxxxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. xxxxxxxxxxxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Vícevýměry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 650,20</b>	<b>312 734,30</b>	<b>772 384,50</b>	<b>9 061 757,97</b>	<b>9 668 873,27</b>	<b>-607 115,30</b>





## Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice

### Podprojekt 1 III. Část intenzifikace ÚV Hrobice

#### Změnový list č.01 – stanovisko projektanta

#### Předmět ZL 01

Předmětem změnového listu je změna druhu betonu FC 55/60 na betonu C35/45 na hlavní budově objektu SO 01 (nová budova úpravny vody) a změna monolitických konstrukcí na prefa konstrukce taktéž na hlavní budově objektu SO 01

#### Stanovisko projektanta a autorského dozoru

Jedná se o změnu v zatřídění betonu nemající vliv na předpokládané konstrukční vlastnosti monolitické konstrukce budovy doložené novým statickým výpočtem v rámci RDS stavby za dodržení vstupních projektem stanovených parametrů. Změna realizace nadzemní části ŽB skeletu do prefabrikované konstrukce urychlí výstavbu a rovněž ohledně prefa konstrukce jsou zajištěny kvalitativně rozhodně lepší vlastnosti a technické parametry než monolitický sloupový systém realizovaný na stavbě.

**Projektant s navrženou změnou souhlasí.**

V Hradci Králové 28.01.2021

Ing. Jiří Forejtek

Datum: 12.8.2020

Provedena vizuální kontrola oděrných a identifikujících  
kabelů. Kabel není ve správné CETIN os.

Bauzod CETIN

147

17.8.2020 PONDĚLÍ

POĚASÍ: 7<sup>00</sup>-17<sup>00</sup> JASNO 10<sup>00</sup>+24<sup>00</sup> JASNO 15<sup>00</sup>+28<sup>00</sup> JASNOPRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>

POBĚT PRACOVNÍKŮ:

VČES THP: JOSEF KŮČA

VČES DOPRAVA: 3 PRAC., VČES ELEKTRO: 1 PRAC., V.E.G.: 2 PRAC.

MECHANIZACE: 2x MALÝ AUTOMOBIL, HOLOVÝ BAGER, PODVALKIL,

PROVÁZENÉ PRÁČE:

VČES DOPRAVA: ODVOZ MECHANIZACE, VČES ELEKTRO: PŘÍPRAVA

KABELŮ NA PŘEPOTĚNÍ, V.E.G.: RŮČNÍ KOPÁNÍ KABELŮ,

PORADNA KABELŮ NA PŘEPOTĚNÍ, ÚKLID

PROVEDENA KONTROLA PŘÍLEHÉ KOMUNIKACE - BEZ ZÁVAD

ZÁPIS KOOORDINÁTOR:

Kooordinátor provedl s objednatel zřetel dle  
betonu pro novou budovu 5001. Objednatel souhlasí s tímto záznamem.

18.8.2020

KD Kooordinátora BOZP na stavbě

Vstupní práce - do uzavřené zóny vstup je

vstup ZÁKAZ

Vstup zajišťují proti pádu  
zákaz vstupů do nebezpečného prostoru stavební  
strojí

Zajišť: VČES a.s.

Termín: Dodržování během prací

18.8.2020 ÚTERÝ

POĚASÍ: 7<sup>00</sup>+18<sup>00</sup> JASNO 10<sup>00</sup>+26<sup>00</sup> JASNO 15<sup>00</sup>+29<sup>00</sup> JASNOPRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>

147

Kuča

Příloha č.7 – Fotografická dokumentace



