



Změnový list

Předkládá "Společnost ÚV Hrobice" zastoupená správcem společnosti společností VCES a.s.

Projekt: „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice“
Podprojekt 1 - III. Část Intenzifikace ÚV Hrobice

Číslo smlouvy: 62/20/SOD

Číslo změnového listu: 1/19

Název změnového listu: PS 03 Doplnění IP telefonů v nové a staré budově

Datum: 05/2022

Identifikační číslo EIS: CZ. 05.1.30/0.0/0.0/17_081/0010874

Název smlouvy: Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice

Smluvní strany:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

Zhotovitel: Společnost ÚV Hrobice
Vážní 456
Hradec Králové, 503 14

Ve vztahu k smlouvě o dílo bude předmětná změna řešena dle zákona 134/2016
Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku odst. 5.

Předmět změny:



Předmětem změnového listu je dodávka a montáž nových videotelefonů napojených na datovou síť ÚV Hrobice.

Jsou přidány dva kusy IP telefonů na novou budovu. První je umístěn v místnosti č.04 vstup (mezi dveřmi a rozvaděčem 2DT6) a druhý je umístěn v místnosti č.104 ultrafiltrace. Oba IP telefony jsou dovedeny do místnosti č.201 ve 2.NP do rozvaděče 2DT1. Jeden intercom je umístěn na pravé straně u hlavních vchodových dveří staré budovy (ovládá otvírání vchodových dveří) a druhý je umístěn v samostatném sloupku vlevo před vjezdovou bránou mezi starou budovou a objektem Hrobice I (ovládá otvírání vjezdové brány). Oba interkomy jsou kabelově připojeny do racku (IT rack) v nové serverovně za velínem místnost č.116B.

Vícepráce bez DPH

98 029,00 Kč

Vícepráce bez DPH celkem

98 029,00 Kč

Zdůvodnění:

Změna je předložena Zhotovitelem na základě požadavku Objednatele na doplnění uvedených zařízení z důvodu zajištění komunikace obsluhy z různých míst areálu úpravny vody zejména v odpoledních a nočních hodinách.

Z výše uvedeného vyplývá, že výše uvedenou změnu nebylo možno Zhotovitelem předvídat.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění změny

Příloha č. 2 – Dispozice umístění

Příloha č. 3 – Nabídka dodavatele

Příloha č. 4 – Bilance změn ze smlouvy ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.

Příloha č. 5 – Stanovisko projektanta

Příloha č. 6 – Záznam ze stavebního deníku

Stanovisko projektanta:

Je formulováno v příloze 5 změnového listu.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Změna iniciována:
Požadavek objednatele

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký:
Změnou se kvalita zvýší.

Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle: Ne


Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla: Ne

Termín provádění prací: 05/2022 – 05/2022

Schválená částka změny:
Navýšení ceny díla o 98 029,00 Kč bez DPH.


Za objednatele:

Odsouhlasila: Ing. Gabriela Fialková, technická náměstkyně
Datum:


**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
40

Za zhotovitele:

Vypracoval: Jiří Pluskal
Datum:


GDF spol. s r.o.
Mostkov 28
788 01 OSKAVA
-12-

Za Správce stavby:

Odsouhlasil: Ing. Jaroslav Valkovič
Datum: **6 - 11 - 2022**





**ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY
A KVALITY SV PARDUBICE**
SPRÁVCE STAVBY
CENTROPROJEKT GROUP s.r.o.

Za projektanta:

Odsouhlasil: Ing. Jiří Forejtek
Datum:





VLS
Vodohospodářsko-inženýrské
služby, spol.s r.o.
Na Střežíně 1079
600 03 Hradec Králové

PŘÍLOHA č. 1 k ZL 1/19
OCENĚNÍ ŽÁDÁNÍ

Soupis provedených prací

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice
Objekt: PS 03 - Elektrotechnologie, ASŘ, přenosy
Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
Zhotovitel: Společnost ÚV Hroboce

| Pol.č. | Popis položky | M.J. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH |
|--------|---------------|------|-------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |

EZS-stará budova EZS

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|----|-------|--------|-------|-------|--------|--|
| 57 | TEG-MGBS10D3 SFP Dual Wavelength Single-Mode | ks | 1 | 1149 | 1 149 | 1 128 | 1 128 | 2 277 | 2 277 dle nabídky příloha č.3 |
| 58 | TPE-1620WS Switch 16 portů Gigabit (16x PoE/PoE+), 2x SFP, 32Gbps, 185W | ks | 1 | 12674 | 12 674 | 1 990 | 1 990 | 14 664 | 14 664 dle nabídky příloha č.3 |
| 59 | 9137131U Vario audio panel IP, 3*2 tlač., povrchová instalace | ks | 1 | 17304 | 17 304 | 1 350 | 1 350 | 18 654 | 18 654 dle nabídky příloha č.3 |
| 60 | 91378362EU IP stolní videotelefon Grandstream GXV3370 - VoIP display 7" | ks | 1 | 7200 | 7 200 | 686 | 686 | 7 886 | 7 886 dle nabídky příloha č.3 |
| 61 | Kabel datový sláněný drát 4x2x0,5 Cat5e | m | 80 | 11 | 880 | 22 | 1 760 | 33 | 2 640 dle SoD (položka 3, SB 1RH1-Motorická elektroinstalace PS 03) |
| 62 | 9135331 Nerezová stříška pro 1 modul Vario na povrchovou instalaci | ks | 1 | 1725 | 1 725 | 616 | 616 | 2 341 | 2 341 dle nabídky příloha č.3 |
| 63 | Nosné konstrukce | kpl | 1 | 7680 | 7 680 | 7 570 | 7 570 | 15 250 | 15 250 dle SoD (položka 11, SB 1DK12-Motorická elektroinstalace PS 03) |

EZS-nová budova EZS

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|----|-------|--------|-------|-------|--------|---|
| 64 | TEG-MGBS10D5 SFP Dual Wavelength Single-Mode | ks | 1 | 1670 | 1 670 | 1 128 | 1 128 | 2 798 | 2 798 dle nabídky příloha č.3 |
| 65 | 9137131U Vario audio panel IP, 3*2 tlač., povrchová instalace | ks | 1 | 17304 | 17 304 | 1 350 | 1 350 | 18 654 | 18 654 dle nabídky příloha č.3 |
| 66 | 91378362EU IP stolní videotelefon Grandstream GXV3370 - VoIP display 7" | ks | 1 | 7200 | 7 200 | 686 | 686 | 7 886 | 7 886 dle nabídky příloha č.3 |
| 67 | 9135331 Nerezová stříška pro 1 modul Vario na povrchovou instalaci | ks | 1 | 1725 | 1 725 | 616 | 616 | 2 341 | 2 341 dle nabídky příloha č.3 |
| 68 | Kabel datový sláněný drát 4x2x0,5 Cat5e | m | 80 | 11 | 880 | 22 | 1 760 | 33 | 2 640 dle SoD (položka 3, SB 1RH1-Motorická elektroinstalace PS 03) |


celkem VÍCEPRÁCE


98 029


CELKEM

98 029

2L 1-19
Příloha č. 2A

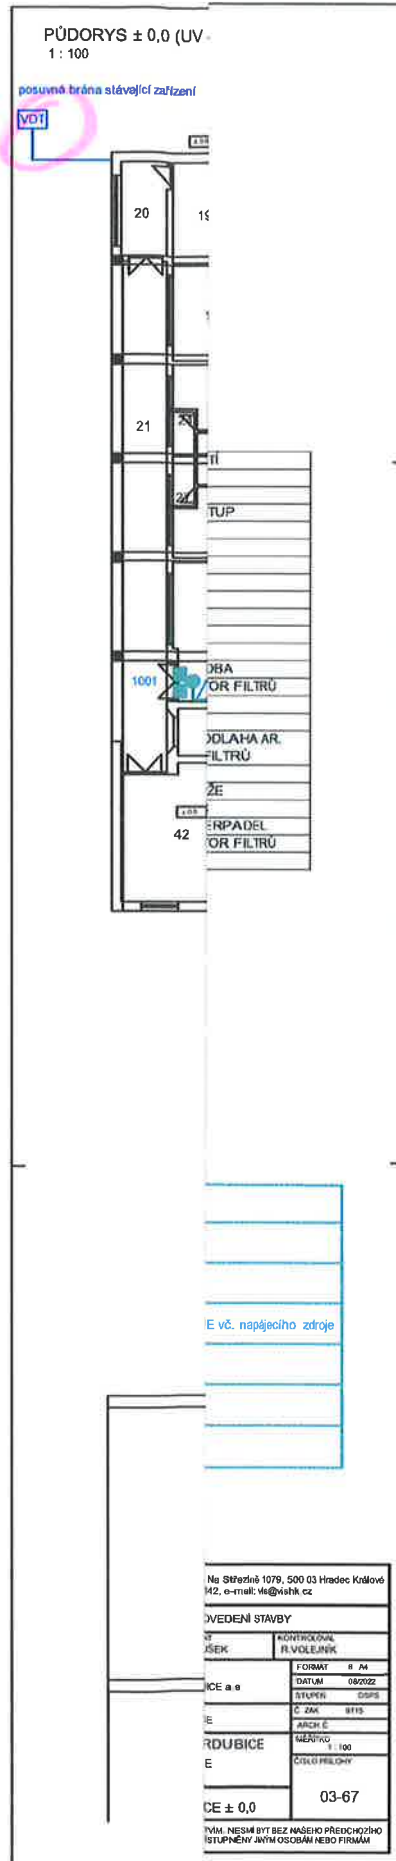

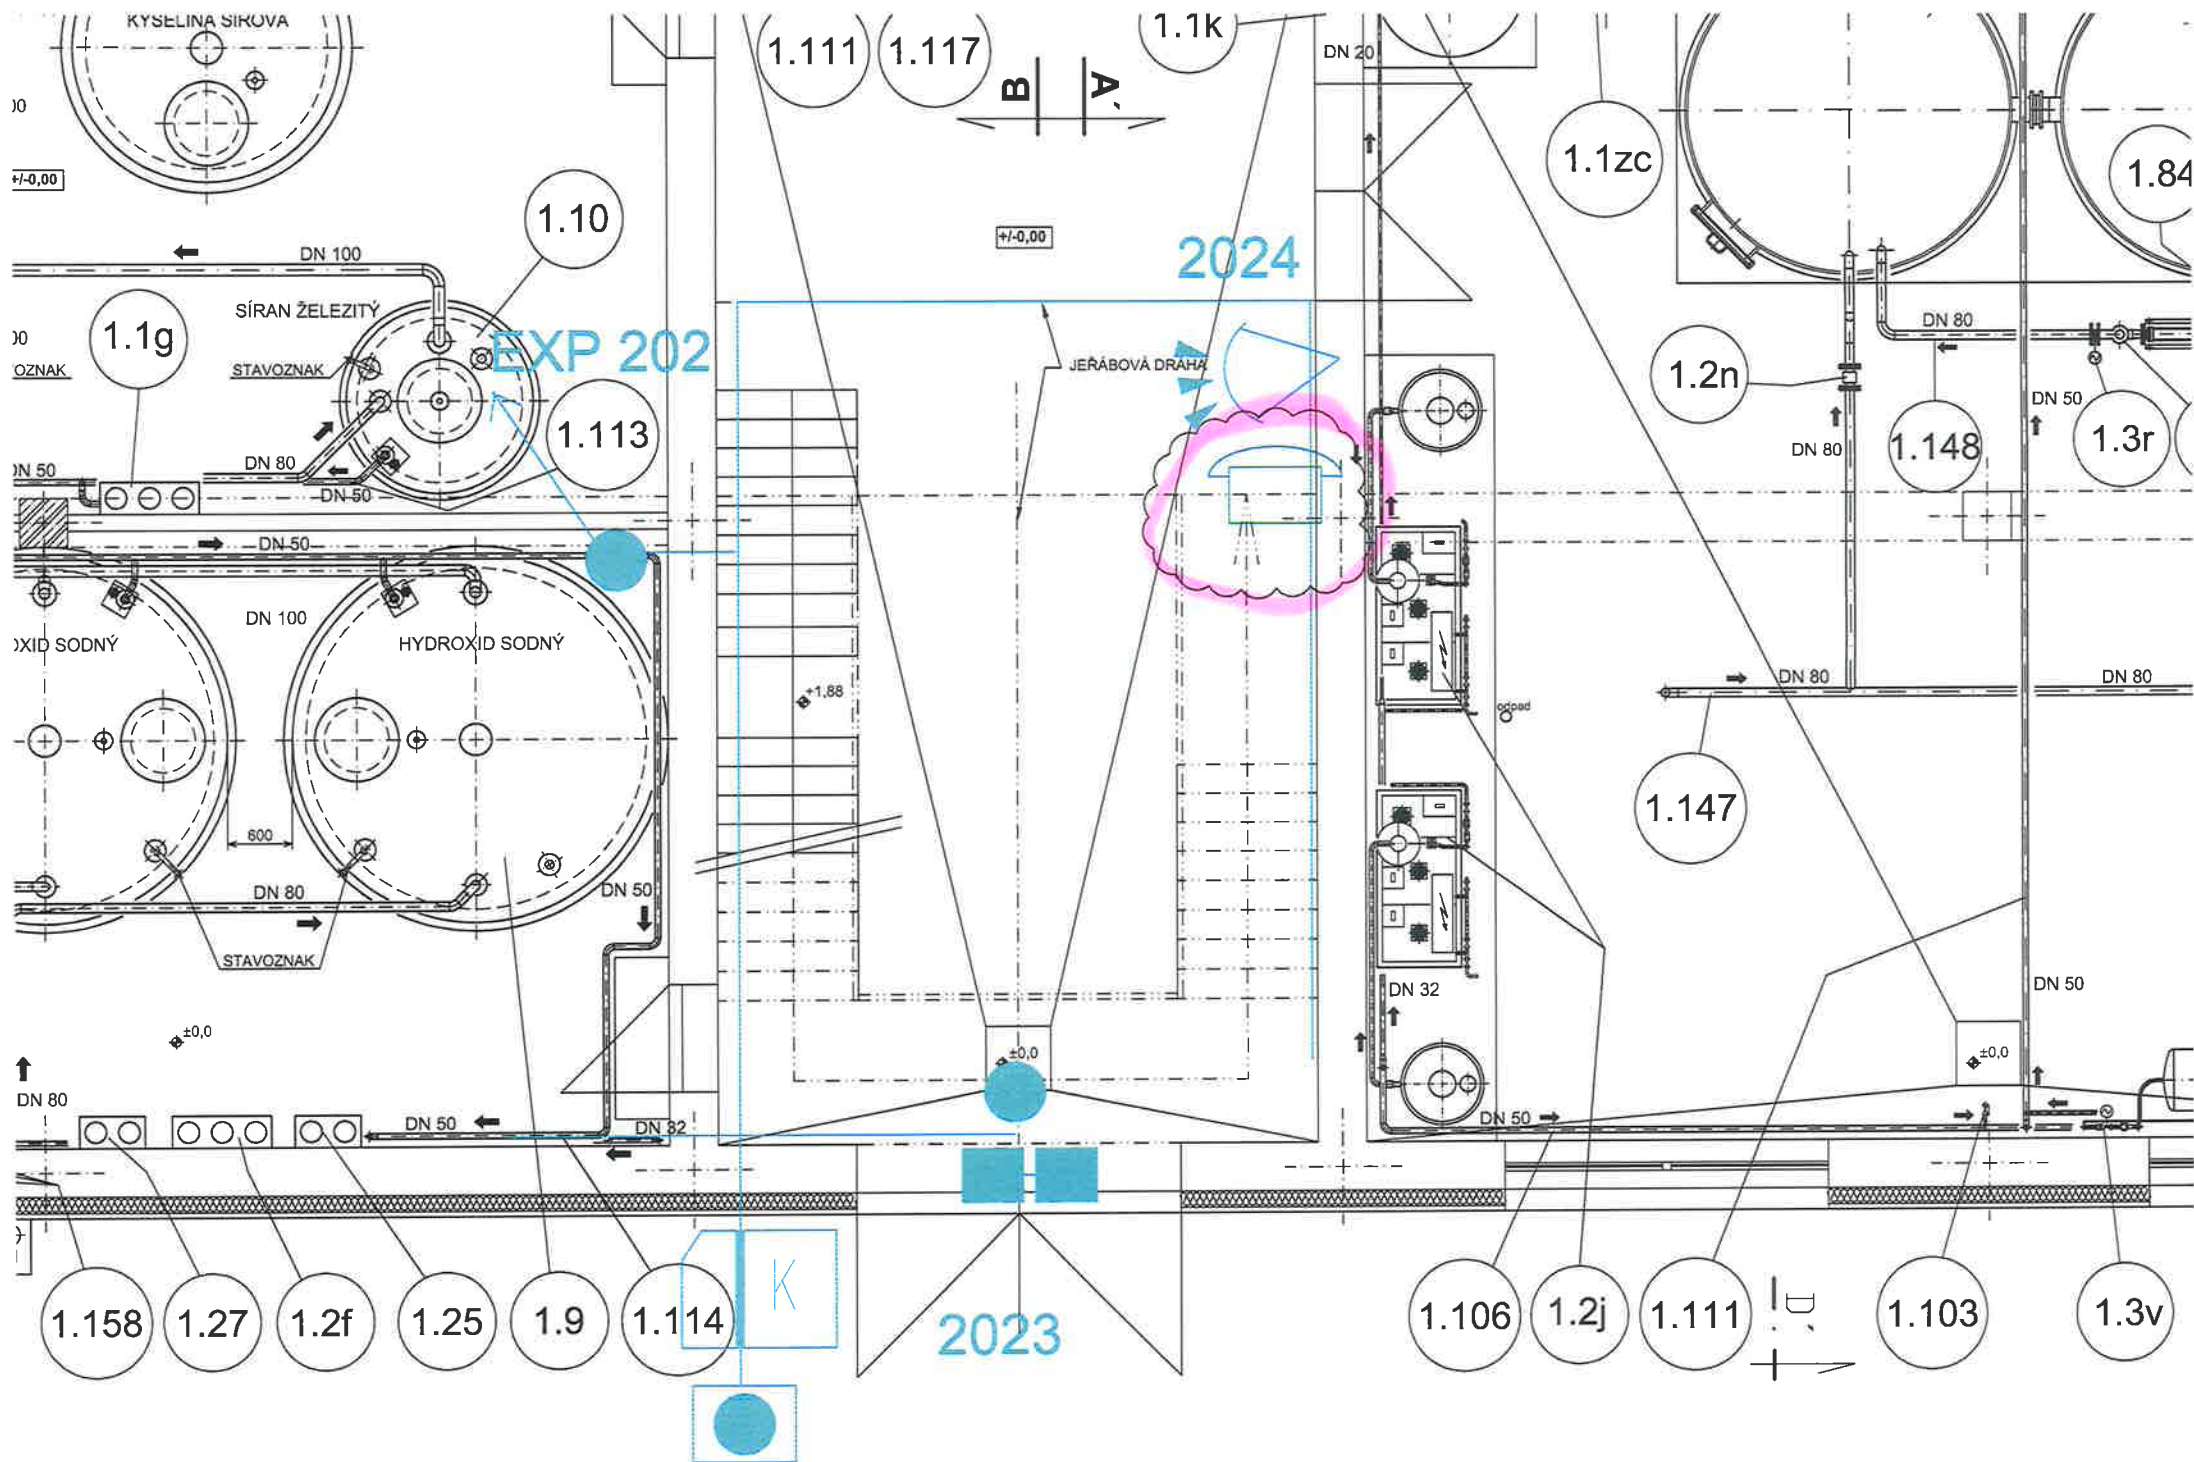

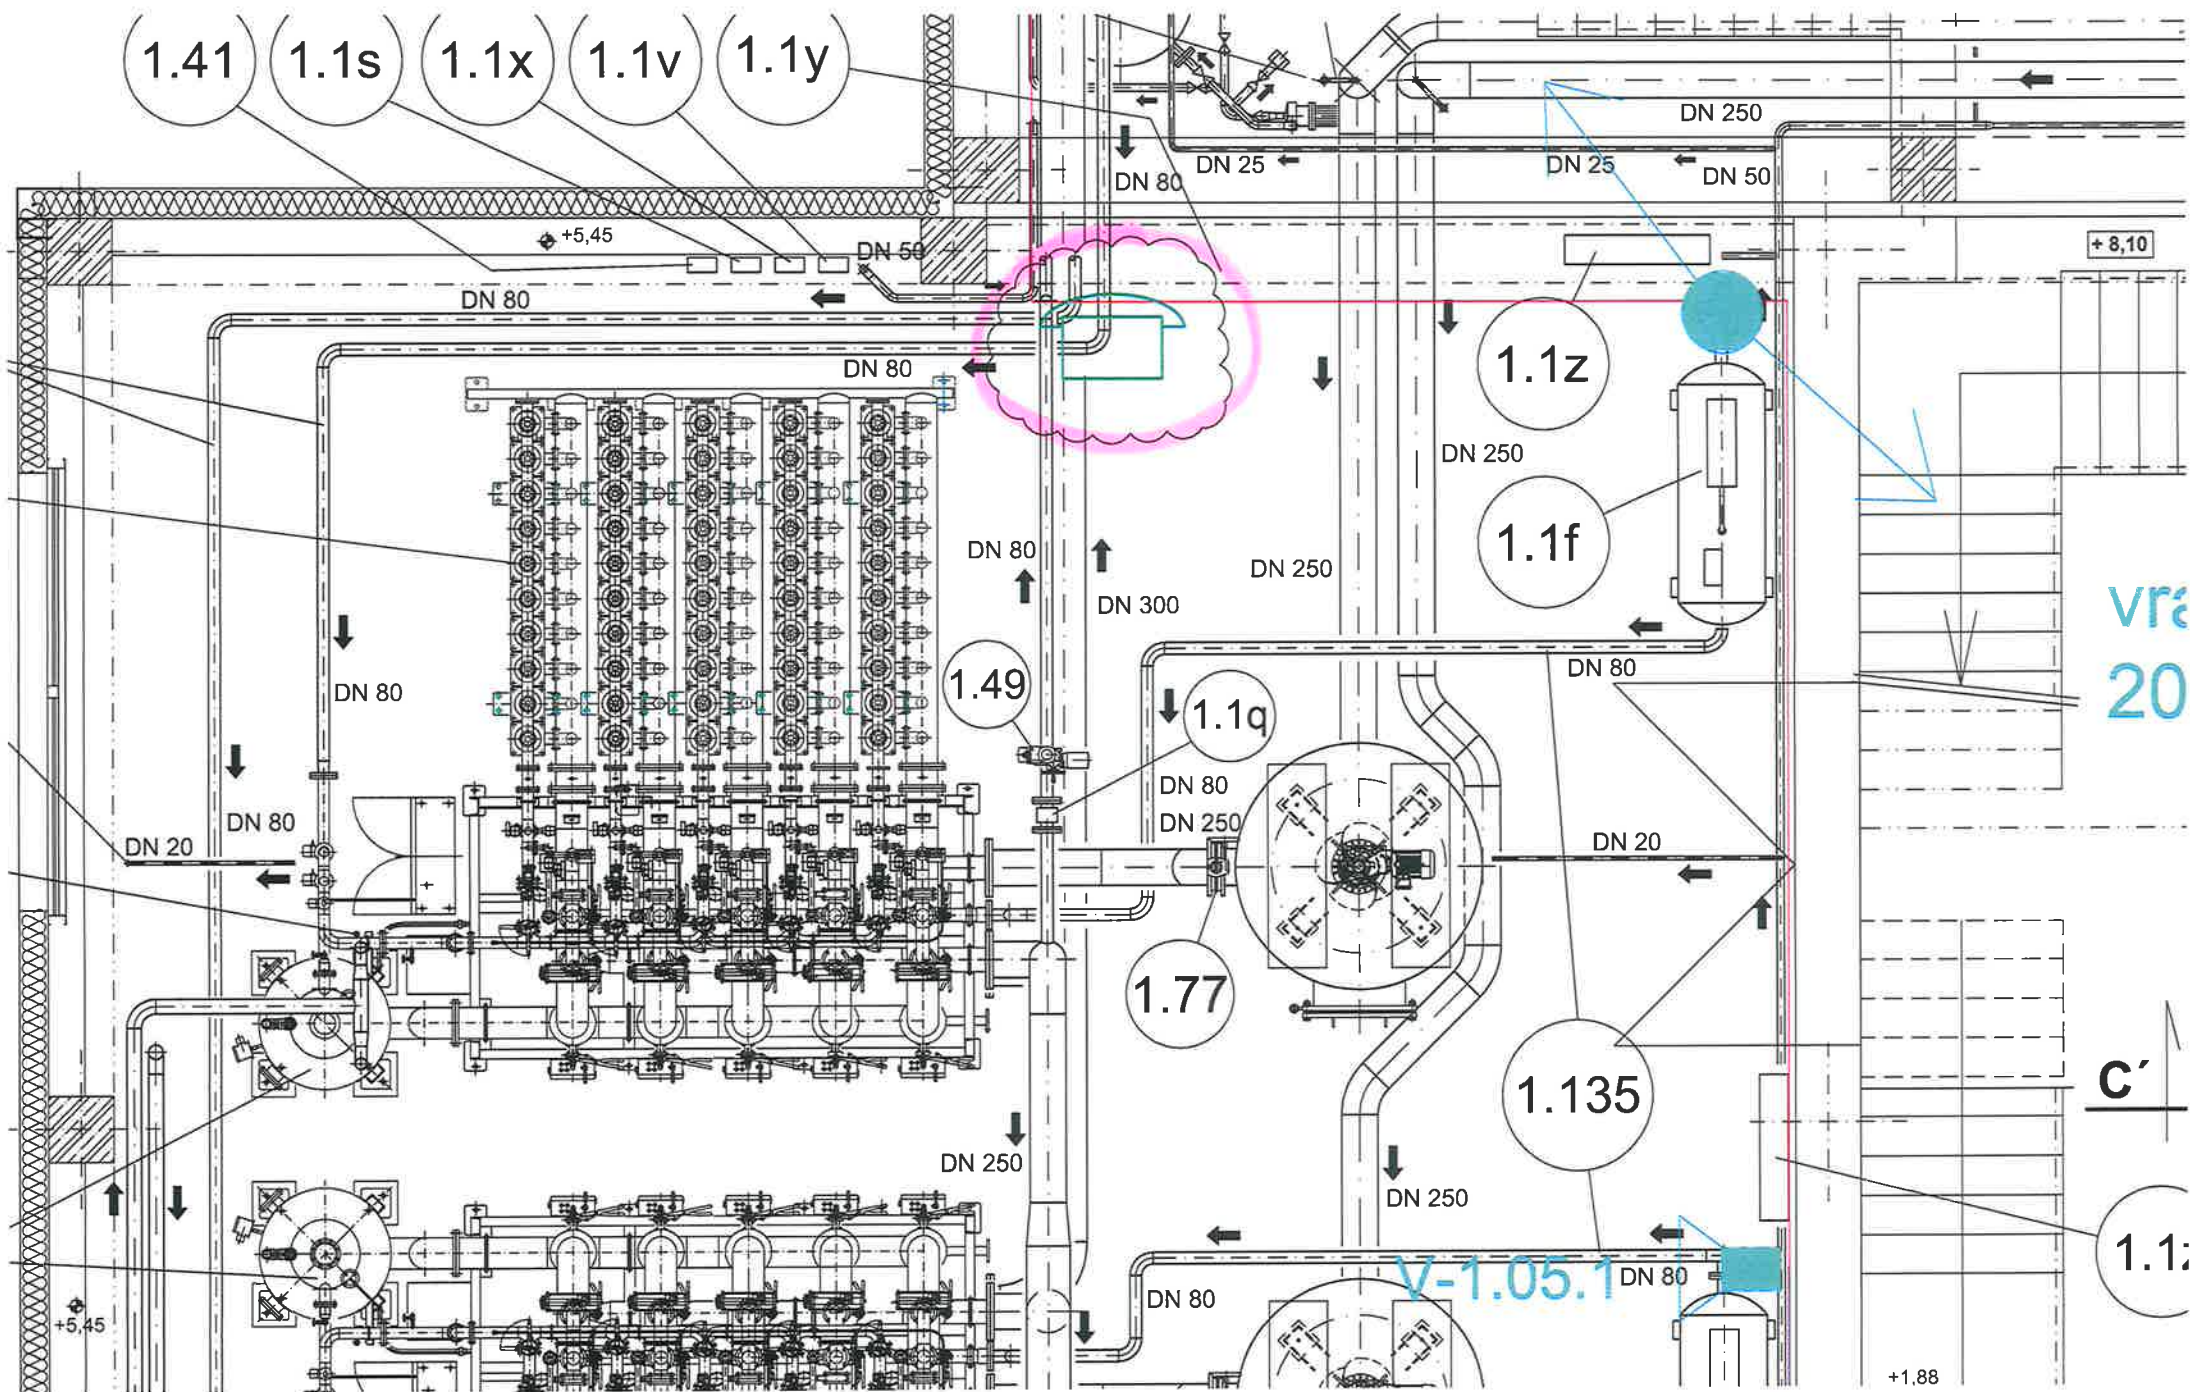

SITEL spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/46, Praha 10 - Slatiny

Stavba: UV Hrobice - IP telefony
Číslo nabídky : CNZT14012022
Objekt: UV Hrobice

Vypracoval: Zdeněk Tomášek
Dne: 30.03.2022
Platnost nabídky: 3 měsíce

| Číslo položky | text | m.j. | počet jednotek | jednotková cena materiál | celkem materiál | celkem |
|------------------|---|------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| 1 | | | | | | |
| | IP telefony | | | | 65970,80 | 65970,80 |
| | TEG-MGBS10D3 SFP Dual Wavelength Single-Mode | ks | 1 | 1115,50 | 1 115,50 | |
| | TEG-MGBS10D5 SFP Dual Wavelength Single-Mode | ks | 1 | 1621,50 | 1 621,50 | |
| | TPE-1620WS Switch 16 portů Gigabit (16x PoE/PoE+), 2x SFP, 32Gbps, 185W | ks | 1 | 12305,00 | 12 305,00 | |
| | 9137131U Vario audio panel IP, 3*2 tlač., povrchová instalace | ks | 2 | 16800,00 | 33 600,00 | |
| | 91378362EU IP stolní videotelefon Grandstream GXV3370 - VoIP display 7" | ks | 2 | 6990,00 | 13 980,00 | |
| | 9135331 Nerezová stříška pro 1 modul Vario na povrchovou instalaci | ks | 2 | 1674,40 | 3 348,80 | |
| - CELKEM bez DPH | | | | | | 65 970,80 |

Projekt : „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice“

Identifikační číslo : CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_081/0010874

BILANCE ZMĚN ZE SMLOUVY VE SMYSLU ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 134/2016 Sb.

| Změnový list číslo | Změna dle § 222 odst. 4 Limit 10% hodnoty smlouvy o dílo 59 695 234,27 Kč Limit 15% hodnoty stavebních prací 86 893 408,31 Kč | | | Změna dle § 222 odst. 5 Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč | | | Změna dle § 222 odst. 6 Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč | | | Změna dle § 222 odst. 7 | | |
|---|---|----------------|-------------|---|----------------|--------------|---|----------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------|
| | Vícepráce (Kč) | Méněpráce (Kč) | Součet (Kč) | Vícepráce (Kč) | Méněpráce (Kč) | Součet (Kč) | Vícepráce (Kč) | Méněpráce (Kč) | Součet (Kč) | Vícepráce (Kč) | Méněpráce (Kč) | Rozdíl (Kč) |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1/1 Změna druhu betonu a prefa konstrukce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 521 408,17 | 9 981 607,57 | 19 503 015,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/2 Povrchová úprava v nádrži prací vody m.č. 08 (NEREALIZOVÁNO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/3 Změna sendvičových panelů SO 01, SO 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 806 684,66 | 2 569 429,41 | 5 376 114,08 | 314 226,78 | 276 024,74 | 590 251,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/4 Výměna podhledů v m. č. 106, 114 a 115 v SO 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 522,98 | 32 508,00 | 297 030,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/5 Podlaha v serverovně v SO 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 684,51 | 62 818,90 | 142 503,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/7 Vyrovnávací podlaha v hale filtrů v SO 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 186,78 | 0,00 | 157 186,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/8 Doplnění I – profilů pro technologické potrubí na propojovací lávce mezi objekty SO 01 a SO 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 223,67 | 0,00 | 651 223,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/9 Změna povrchové úpravy v nádrži prací vody pro ultrafiltraci (místnost č. 08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 501,43 | 0,00 | 67 501,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/10 Doplnění zábradlí a přechodu na střechu - požární schodiště u objektu SO 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 773,49 | 0,00 | 338 773,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/11 Změna skladby střech SO 01 a SO 02, doplnění zachytňného systému SO 01 a SO 02, nerealizace videostěny SO 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 834,45 | 1 075 821,07 | 3 426 655,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/12 Změna střechy z kotvené na lepenou na přístavbě objektu SO 02 a změna provedení detailů na střechách objektu SO 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057 412,54 | 1 364 875,97 | 3 422 288,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 1/36 Změna a doplnění SDK konstrukcí v objektu SO 02, doplnění kazetového podhledu v přístavbě v objektu SO 02 a doplnění rozvodů ZTI (kuchyňka) v přístavbě objektu SO 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 682,00 | 270 373,13 | 885 055,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/37 Změna sanace venkovních ramp objektu SO 02, chlorovny a trafostanice; doplnění ošetření povrchu sanací dělicí žb příčky v akumulaci a odstranění stávajícího nátěru v akumulační nádrži (SO 02); sanační práce v pískových filtrech (SO 02.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 993,76 | 1 010 822,48 | 2 301 816,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/38 Zpevněné plochy - vícevýměry z nové dlažby (SO 04), Zpevněné plochy - vícevýměry ze stávající dlažby (opravy komunikací po instalaci zemnění) (SO 04) | 2 375 106,74 | 0,00 | 2 375 106,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/39 Doplnění chemického čištění CIP PS 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171 727,00 | 0,00 | 1 171 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/40 Úspora výztuže - méněvýměry (SO 01, SO 02, SO 02.3, SO 05) | 0,00 | 7 521 875,94 | 7 521 875,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/41 Doplnění podlahových vpustí v objektu SO 01 a v objektu SO 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 909,28 | 0,00 | 111 909,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/43 Bourání stávajících základů a realizace nových základů pod technologií (SO 01, SO 02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 001,16 | 0,00 | 546 001,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/46 Zpevněné plochy - doplnění záchytných míst v komunikaci (SO 04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 924,71 | 0,00 | 126 924,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice

Podprojekt 1 III. Část intenzifikace ÚV Hrobice

Změnový list č.1/19 – stanovisko projektanta

Předmět ZL 1/19

Předmětem změnového listu je dodávka a montáž nových videotelefonů napojených na datovou síť ÚV Hrobice.

Stanovisko projektanta a autorského dozoru

Jedná se o změnu, související s vylepšením zejména funkčnosti a zabezpečení objektu.

Projektant s navrženou změnou souhlasí.

V Hradci Králové

Ing. Jiří Forejtek

Denní záznamy stavby

SD č. / strana č. 0000015

Datum: 8.6. 2012 GOF spol. s r.o.

PRACOVNÍ DOBA: 4⁰⁰ - 11³⁰

POČASÍ: ZATAŽENO - POLOJASNO 14°C

PRACOVNÍCI: HAJEK, SADOUSKI, PAULICEK, LETOKOV, ZAHKO,
VOLENIK, ZYBA, MUŽIK, HALOCH, PÍCHA

PROVEDENÉ PRÁCE:

- MONTÁŽ KABELOVÝCH TRAS, TAHAČÍ KABELŮ
- MONTÁŽ A ZAPOJOVÁNÍ SVÍTEL NA OKLOPOVÉ
- TAHAČÍ KABELŮ A TECHNOLOGICKÝ PRUKLŮ
- TAHAČÍ KABELAŽE PRO SYSTÉMY EZS, CCTV A STRUKTUR
- KABELAŽE V PROSTOŘECH STARÝCH LABORATORŮ
- A CHODBY PRŮZEMÍ
- MONTÁŽ HROMOSVODNÝCH SVODŮ NA STŘEŠE DUMOLE

ZAPSAL: VOLENIK



Zápis zhotovitele:

Zhotovitel projednával s objednatelům
následující úpravy a změny

- expandla u vodní vod, 3M1.1, 3M1.2, 3M1.3, 3M1.4, 3M1.5
- nejsou pro funkci měření záhadu chytce
- Lítidace azbest desek, stáv. nosných konstrukcí 2002.
- Snímce pro měření unie a v chlorovce
- a skladu tabulí se upevňují instalovat, jsou
- dodávkou tech. části.

- Doplnění IP telefonů do objektu 2007

- Zkouška způsobu měření hladiny na čm?

ACAD, ACID

- Propojovací kabely mezi RHA a DA nejsou

součástí PD.

- Rozčíslení a úprava optické sítě na 2002.

Vše by se řešelo ZL.

Zapsal: L. P. Pláskal
