



## Změnový list

### Předkládá "Společnost ÚV Hrobice" zastoupená správcem společnosti společností VCES a.s.

**Projekt:** „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice“  
Podprojekt 2 - II.část intenzifikace prameniště Hrobice

<b>Číslo smlouvy:</b>	62/20/SOD
<b>Číslo změnového listu:</b>	2/3
<b>Název změnového listu:</b>	Sanace pomocné studny ČS Čeperka (SO 03)
<b>Datum:</b>	12/2021
<b>Identifikační číslo EIS:</b>	129 300 MZE
<b>Název smlouvy:</b>	Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice
<b>Smluvní strany:</b>	
<b>Objednatel:</b>	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014 530 02 Pardubice
<b>Zhotovitel:</b>	Společnost ÚV Hrobice Vážní 456 Hradec Králové, 503 14

Ve vztahu k smlouvě o dílo bude předmětná změna řešena dle zákona 134/2016  
Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou  
zakázku odst. 6.



### Předmět změny:

Předmětem změnového listu je realizace sanace pomocné studny u ČS Čeperka.

Vícepráce bez DPH (SO 03 Prameniště Čeperka) 278 152,26 Kč

---

Vícepráce bez DPH celkem 278 152,26 Kč

Méněpráce bez DPH 0,00 Kč

---

Méněpráce bez DPH celkem 0,00 Kč

Rozdíl bez DPH celkem + 278 152,26 Kč

### Zdůvodnění:

Na základě dodatečného stavebního průzkumu fyzického stavu pomocné studny u ČS Čeperka Objednatel dojde k realizaci sanace betonových konstrukcí pomocné studny u ČS Čeperka.

Sanace bude provedena ve skladbě:

- otryskání stávající betonové konstrukce pomocné studny vysokotlakým vodním paprskem
- ochranný nátěr výztuže
- spojovací můstek
- reprofilace cementovou sanační maltou tl. do 20 mm
- finální hydroizolační vrstva v tl. do 5 mm

### Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění změny

Příloha č. 2 – Fotografická dokumentace

Příloha č. 3 – Bilance změn ze smlouvy ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.

Příloha č. 4 – Stanovisko projektanta

Příloha č. 5 – Záznam ze stavebního deníku



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

**Stanovisko projektanta:**

Je formulováno v příloze 4 změnového listu.

**Změna iniciována:**

Objednatel po dodatečném stavebním průzkumu, analýze účelnosti zvýšení životnosti a funkčnosti dotčené části díla.

**Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký:**

Změnou se kvalita zvýší.

**Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle: NE**

**Odráží se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla: NE**

**Termín provádění prací: 12/2021 – 01/2022**


**Schválená částka změny:**

Zvýšení ceny díla o 278 152,26 Kč bez DPH.

**Za objednatele:**

Odsouhlasila: Ing. Gabriela Fialková, technická náměstkyně

Datum: 26.1.2022

  
VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO: 60 10 86 31 DIČ: CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
40

**Za zhotovitele:**

Vypracoval: Ing. Jiří Lašák

Datum: 26.1.2022

  
VCEŠ s.r.o.  
Mlýnský náhon 13, 190 05 Praha 9  
219

**Za Správce stavby:**

Odsouhlasil: Ing. Jaroslav Valkovič

Datum: 26.1.2022





ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY  
A KVALITY SV PARDUBICE  
SPRÁVCE STAVBY  
CENTROPRŮMYSL PARDUBICE

**Za projektanta:**

Odsouhlasil: Ing. Jiří Forejtek

Datum:





<b>Položkový soupis prací a dodávek - VÍCEPRÁCE</b>							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Sanace pomocné studny na ČS Čeperka</b>							<b>278 152,26</b>
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
12a	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> v do 25 m	m3	72,77	71,37	5 193,56
	VV		3,14*1,5*1,5*10,3 "sanace pomocné studně"		72,77		
13a	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití	m3	1 018,77	1,69	1 721,73
	VV		1*14**72,77		1 018,77		
14a	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> v do 25 m	m3	72,77	51,90	3 776,74
	VV		3,14*1,5*1,5*10,3 "sanace pomocné studně"		72,77		
20a	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěna a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů	m2	106,50	276,91	29 490,92
	VV		2*3,141519*1,5*10,3 "vnitřní strana studny"		97,08		
	VV		2*3,141519*1,5*1*1 "vnější strana studny"		9,42		
6a	K	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	106,50	1 132,81	120 644,27
22a	K	985312114	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm	m2	106,50	604,17	64 344,11
23a	K	985321111	Ochranný nátěr výtluže na cementové bázi stěn, lícе kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	85,20	352,43	30 027,04
	VV		0,8*106,50*80% celkové plochy sanace"		85,20		
24a	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	106,50	151,04	16 085,76
	VV		106,5		106,50		
D	997		Přesun sutě				
26a	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na mezideponii do 1 km	t	7,46	193,34	1 441,35
	VV		0,07*106,50		7,46		
27a	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,46	38,93	290,22
28a	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	223,65	4,80	1 073,52
	VV		7,46*30 "Přepočtené koeficientem množství"		223,65		
29a	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,46	321,16	2 394,25
30a	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,46	107,70	802,90
	D	998	Přesun hmot				
31a	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	4,39	136,25	598,16
	VV		0,03885*106,50+0,00099*85,2+0,00158*106,50		4,39		
32a	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	4,39	60,99	267,75
<b>celkem MĚNĚPRÁCE</b>							<b>0,00</b>
<b>celkem VÍCEPRÁCE</b>							<b>278 152,26</b>
<b>CELKEM</b>							<b>278 152,26</b>




příloha č.2 k ZL 2/3







Schématický řez pomocnou studní u ČS Čeperka

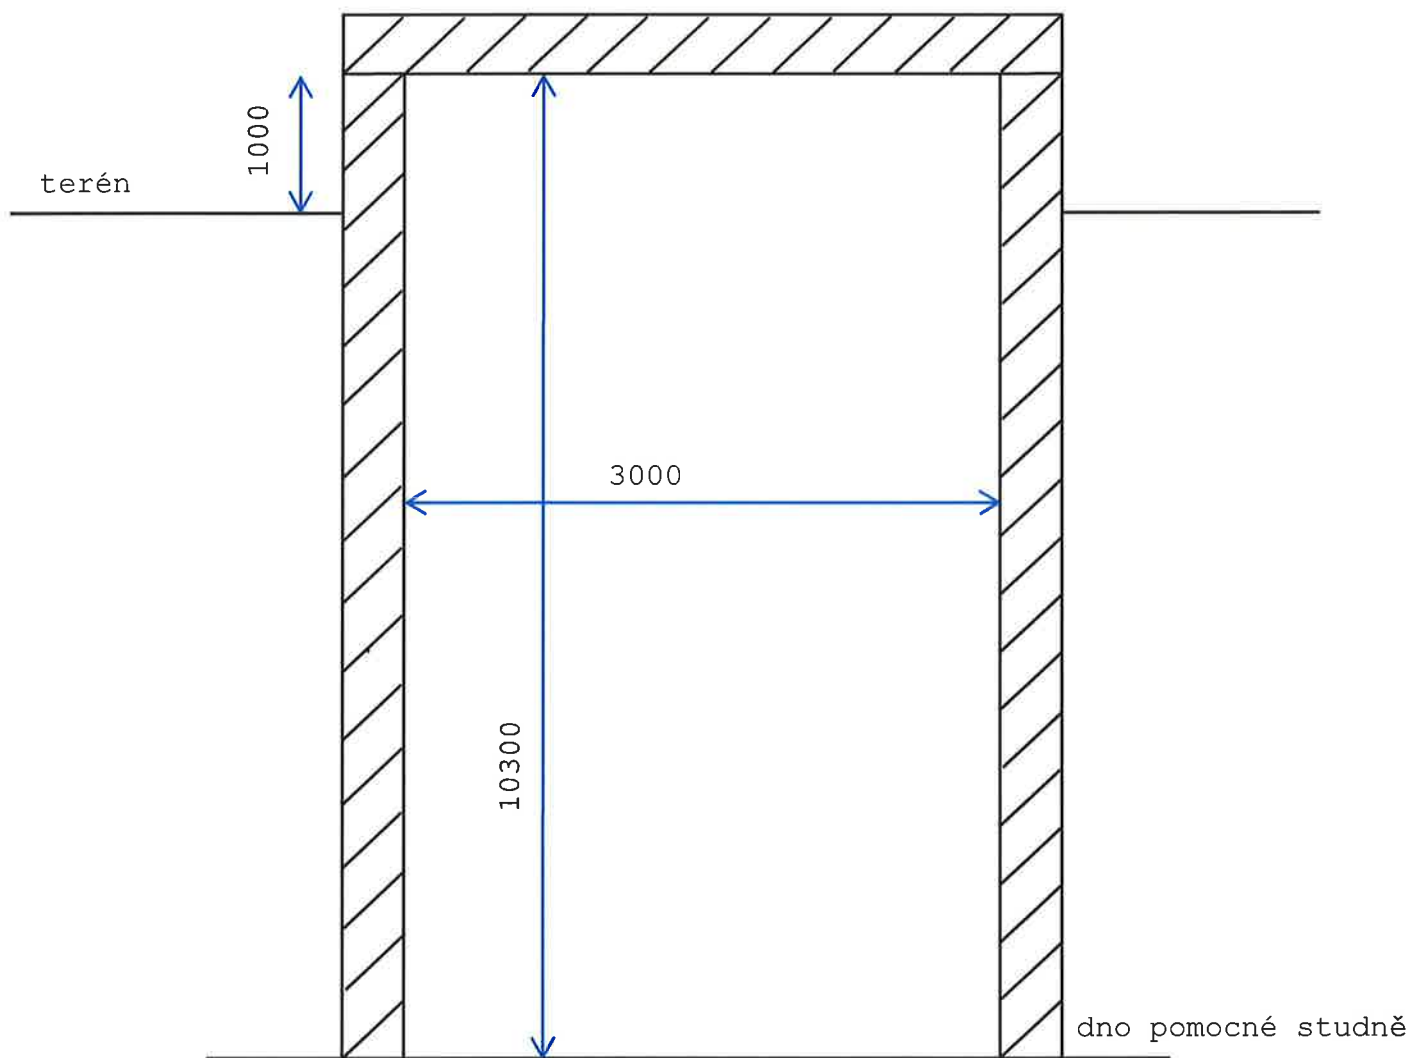



**Projekt : „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice“**

Identifikační číslo : CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_081/0010874

Příloha č. 3

**BILANCE ZMĚN ZE SMLOUVY VE SMYSLU ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 134/2016 Sb.**

Změnový list číslo	Změna dle § 222 odst. 4 Limit 10% hodnoty smlouvy o dílo 59 695 234,27 Kč Limit 15% hodnoty stavebních prací 86 893 408,31 Kč			Změna dle § 222 odst. 5 Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč			Změna dle § 222 odst. 6 Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč			Změna dle § 222 odst. 7		
	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Rozdíl (Kč)
1/1 Změna druhu betonu a přefa konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521 408,17	9 981 607,57	19 503 015,74	0,00	0,00	0,00
1/2 Povrchová úprava v nádrži prací vody m.č. 08 (NEREALIZOVÁNO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/3 Změna sendvičových panelů SO 01, SO 02	0,00	0,00	0,00	2 806 684,66	2 569 429,41	5 376 114,08	314 226,78	276 024,74	590 251,52	0,00	0,00	0,00
1/4 Výměna podhledů v m. č. 106, 114 a 115 v SO 02	0,00	0,00	0,00	264 522,98	32 508,00	297 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/5 Podlaha v serverovně v SO 02	0,00	0,00	0,00	79 684,51	62 818,90	142 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/7 Vyrovnávací podlaha v hale filtrů v SO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 186,78	0,00	157 186,78	0,00	0,00	0,00
1/9 Změna povrchové úpravy v nádrži prací vody pro ultrafiltraci (místnost č. 08)	0,00	0,00	0,00	67 501,43	0,00	67 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/1 Úprava rozsahu a provedení čerpacích zkoušek	0,00	0,00	0,00	2 105 578,22	5 413 135,41	7 518 713,63	506 811,87	0,00	506 811,87	0,00	0,00	0,00
2/3 Sanace pomocné studny ČS Čeperka (SO 03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 152,26	0,00	278 152,26	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 323 971,80</b>	<b>8 077 891,72</b>	<b>13 401 863,52</b>	<b>10 777 785,86</b>	<b>10 257 632,31</b>	<b>21 035 418,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ZL č. 2/3 Sanace pomocné studny ČS Čeperka (SO 03)

DSO/PS	Změna dle § 222 odst. 4 Limit: 10% hodnoty smlouvy o dílo 59 695 234,27 Kč Limit: 15% hodnoty stavebních prací 86 893 408,31 Kč		Změna dle § 222 odst. 5 Limit: 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč		Změna dle § 222 odst. 6 Limit: 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč		Změna dle § 222 odst. 7		
	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Rozdíl (Kč)
Sanace pomocné studny na ČS Čeperka						278 152,26	278 152,26		
						-	-		
						-	-		
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 152,26</b>	<b>278 152,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice

### **Podprojekt 2 II. Část Intenzifikace prameniště Hrobice**

#### **Změnový list č.2/3 – stanovisko projektanta**

#### **Předmět ZL 2/3**

Předmětem změnového listu je realizace sanace pomocné studny u ČS Čeperka.

#### **Stanovisko projektanta a autorského dozoru**

Projektem sanace nebyla řešena. V rámci PD byla řešena pouze hlavní studna ČS Čeperka

**Projektant s navrženou změnou souhlasí.**

V Hradci Králové 26.01.2022

Ing. Jiří Forejtek





Datum: /

PETRO, PEŠKA, IVAN PETRUSKO, IVAN TSAR  
PROVADEMS PRACE:

VŠET MONOIT: - PROVADENI STYKOVE DIZAY A  
VSTAVNI A KROVI TRNS DEJCI PETOM V  
AMULACNI VADZCI POD II. STUPNI FILTACE  
V OBJEKTU SO 02

SAPIL: - ODVOZ VIBOVANHO MATERIALU Z FIZRU č. 4  
A č. 5 (II. STUPNI FILTACE SO 02)

- BOURANI OBJEKTU A VNITRNI ZLADU VE FIZRU  
č. 3 A č. 2 (II. STUPNI FILTACE SO 02)

31. 12. 21 ZAPIS ZKONOTIZACE

ZKONOTIZACE PROJEKTA S OBJEDNATELEM TATO ZEMT:

- SANACE AMULACNI VADZCI II. A III. POD I. STUPNI FILTACE
- REALIZACE POZADOVANICH KOTROVICH BODU NA OTVORU VNITRI OBJEKTU
- ZEMT POUKOVU UPRAVU PODLAHY V m.č. 114 a 115 V SO 02, DALE V PRISTAVBE SO 02
- ZEMT PODLAHY NA VEKNU SO 02 (V PD JE UVAZOVANO POUZE S NI MENOU DOSEK ZBOVENE PODLAHY ZA KONCU PODLAHY, ALE BUDE VNITRI NI MENA PODPORNE K-CE TETO PODLAHY)
- REALIZACE NOVEHO PROPOSE VITLANU Z OPLACIA A VITLANU NA LAGONY
- UPRAVU STAVACICH, ZEBZICH NA FASADACH OBJEKTU SO 02 (POUKOVA UPRAVA, VSPRAVENI, UPRAVA KOTEV DOPLEMNI - UPRAVA - VZKLUKAM K AKTUALNE PLANE LEGISLATIVE BOEP)
- REALIZACE NOVIH VSTUPICH VAT DO MISTNOSU TLAKOVICH FIZRU V SO 02
- OPRAVU KONIU A MATEZILICH NA STRECHACH OBJEKTU SO 02 (POUKOVA UPRAVA, NI MENA STAVACIHO OPLECHOVANU)
- DOPLEMNI STAVISUY NA ROZVADZCI V SO 01
- UPRAVU VAVY LAMELOVICH SEPARACIOM - PRISTUP NA MARSZE - DOPLEMNI VAVY A ZABRANU
- REALIZACE NOVIH PRISTUPOVICH ZEBZICH A KOTROVICH BODU NA STRECHU VEDLE PRISTAVBY SO 02 A DOPLEMNI PRICERU NA STRECHU PRISTAVBY SO 02

Datum: 31.12.21

A KOTVENÍM PAV DO STĚNY OBJEVU KAD TOUTO  
STĚNOU

- DOPLNĚNÍ PASTROVĚKO PODHLAVU A MÍSTNÍM ODSIKOV  
V PŘÍSTAVBĚ SO 02 A ROZKROJ ŽEJ PRO BUDOVU  
KUCHYNĚ V PŘÍSTAVBĚ SO 02
- SANKČÍ POMOČNÍ STUDNĚ NA ČS ČEPERKA
- MĚNĚNÍ STAVBY K-CE - LAMNA, PŘÍSTUP. ŽEBŘÍK, ZA  
NOVÉ K-CE Z MĚŘZ. MATERIÁLŮ A KOMPOZIT.  
ROŠTŮ
- DOPLNĚNÍ VEDVĚNÍKŮ A KACÍKŮ NA MÍSTNĚM Z ČS  
ČEPERKA, VČ. NAPOJENÍ (NOVĚ PROJEKOVĚ - STAVBY  
NEBYLO MOŽNÉ ZAROVNAT Z DŮVODU ZBETONOVANÍ  
VELKÝM MNOŽSTVÍM PŮTOKŮ - NAPOJENÍ Z ČS KROBICE  
I. A ČS KROBICE II.) DO STAVBY ŠAKTY  
MEZI OBJEKTY SO 01 A SO 02
- OPRAVA ŠAKTY NA PROTLAK (MÍSTNĚ) POD ŽELEZNIČNÍ  
TRÁŤ (ČEPERKA - STĚBLOVA)

VŠECHNY MĚSE UVEDENÉ PRÁCE BUDOU DĚLNY ZL.

ZA ZPRACOVATELE: MŠP

