



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: VCES-5635

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS

2/ **Zhotovitel:** **Společnost ÚV Mokošín**
Účastníci společnosti: **VCES a.s.**, Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 - vedoucí společník
KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice – Hranice I - Město

sídlo/místo podnikání: Vážní 456, 503 41 Hradec Králové
společnost je zapsána: VCES a.s. – vedoucí společník
u MĚS v Praze, oddíl B, vložka 8052
KUNST, spol. s r.o. – společník
U KS v Ostravě, oddíl C, vložka 690

zastoupena: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s.
Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva VCES a.s.

IČO: VCES a.s. – vedoucí společník
267 46 573
KUNST, spol. s r.o. – společník
190 10 591

DIČ: VCES a.s. – vedoucí společník
CZ26746573
KUNST, spol. s r.o. – společník
CZ19010591



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: **7563252/0800**
telefon: 226 056 506
fax: 226 056 500
e-mail: vces@vces.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s.
Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva VCES a.s.
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat:
Ing. Miloš Emmer, člen představenstva VCES a.s.
Ing. Tomáš Kouba, obchodní manažer
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Jan Hnilička, Senior Project Manager
Ing. Vlastimil Mrázek, Project Manager

Smluvní strany se dohodly na změnách a úpravě předmětné Smlouvy o dílo ze dne 12.9.2017 (dále také jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 tak, jak je níže uvedeno:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně díla (vícepráce a méněpráce) a to způsobem a v rozsahu změnových listů č. 1 – č. 8 obsahujících přesný popis a specifikaci změn včetně případných dopadů do ceny díla; změnové listy 1 - 8 jsou přílohou tohoto dodatku a současně jako Příloha č. 7 jsou nedílnou součástí Smlouvy:

Změnové listy stavby:

- ZL č. 1 – bez dopadu do ceny – SO 02 Trubní propoje – Změna typu potrubí části objektu
- ZL č. 2 – bez dopadu do ceny – PS 01 UV Mokošín, rekonstrukce a intenzifikace UV – Změna výrobce reakční nádrže 10m³ a výrobce montážních vložek
- ZL č. 3 - cena -213 819,84 Kč – PS 08 ČS Luhy – Vyjmutí z předmětu dodávku a montáž tlakové nádoby a motýlové klapky
- ZL č. 4 – cena + 344 604,00 Kč – PS 01 UV Mokošín, rekonstrukce a intenzifikace UV – Změna dodávky zákaloměrů
- ZL č. 5 – bez dopadu do ceny - PS 01 UV Mokošín, rekonstrukce a intenzifikace UV – Změna typu UV Lamp – doplnění stírání senzorů
- ZL č. 6 – cena – 496 816,65 Kč – SO 01 Zahušťovací nádrž – Změna pažení a založení objektu SO 01 – Zahušťovací nádrže
- ZL č. 7 – cena + 259 603,00 Kč – SO 03 Stavební úpravy provozní budovy – Změna rozsahu úpravy a opravy stávajících ŽB konstrukcí pískového filtru č. 4 u objektu SO 03.1.2
- ZL č. 8 – bez dopadu do ceny – PS 01 UV Mokošín, rekonstrukce a intenzifikace UV – Změna filtrační náplně dvouvrstvé pro pískový filtr č. 4 a č. 3 a výkonu pracích čerpadel pro pískové filtry.



III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Smluvní strany se s ohledem na změnu díla dle výše uvedených změnových listů dohodly na změně článku III. odst. 1 Smlouvy, který nově zní:

1) Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

- A) Termín zahájení díla: 13. 10. 2017 (předání staveniště)
- B) Milník č. 1 – Přípravné práce: do 29. 12. 2017
- C) Milník č. 2 – Nové objekty: do 30. 10. 2018
- D) Milník č. 3 – UV: do 31. 3. 2019
- E) Milník č. 4 – Dokončení prací dle SOD/Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31. 7. 2019

Bližší popis jednotlivých milníků je přílohou tohoto dodatku a současně jako Příloha č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy.

IV. CENA DÍLA

S ohledem na změnu díla a na základě dohody obou smluvních stran se cena díla sníží o rozdíl víceprací a méněprací, tj. o částku ve výši 106 429,49 Kč bez DPH (slovy: jedno sto šest tisíc čtyři sta dvacet devět korun českých a čtyřicet devět haléřů), článek IV. odst. 1 Smlouvy tak nově zní:

- 1) Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH 127 681 814,10 Kč

(slovy: jedno sto dvacet sedm milionů šest set osmdesát jeden tisíc osm set čtrnáct korun českých a deset haléřů).

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy č. 5, 6 a 7 Smlouvy a to ve znění, které tvoří přílohy dodatku. S ohledem na tuto skutečnost se článek X. odst. 8 Smlouvy mění následujícím způsobem:

Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. října 2016

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

Příloha č. 4: Stavební povolení



Příloha č. 5: Finanční harmonogram stavby

Příloha č. 6 : Nahrazuje v plném rozsahu příloha č.2 Smlouvy o dílo

Příloha č. 7: Změnové listy č. 1 - 8

OSTATNÍ USTANOVENÍ

1/ Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jeho obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

4/ Přílohy k Dodatku č. 2:

Příloha č. 1: Finanční harmonogram stavby

Příloha č. 2 : Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: Změnové listy č. 1 - 8

5/ Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

V Pardubicích dne 2. 6. 2018

V Praze dne 14.6.2018

Za objednatele:

Ing. Aleš Vavříčka
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

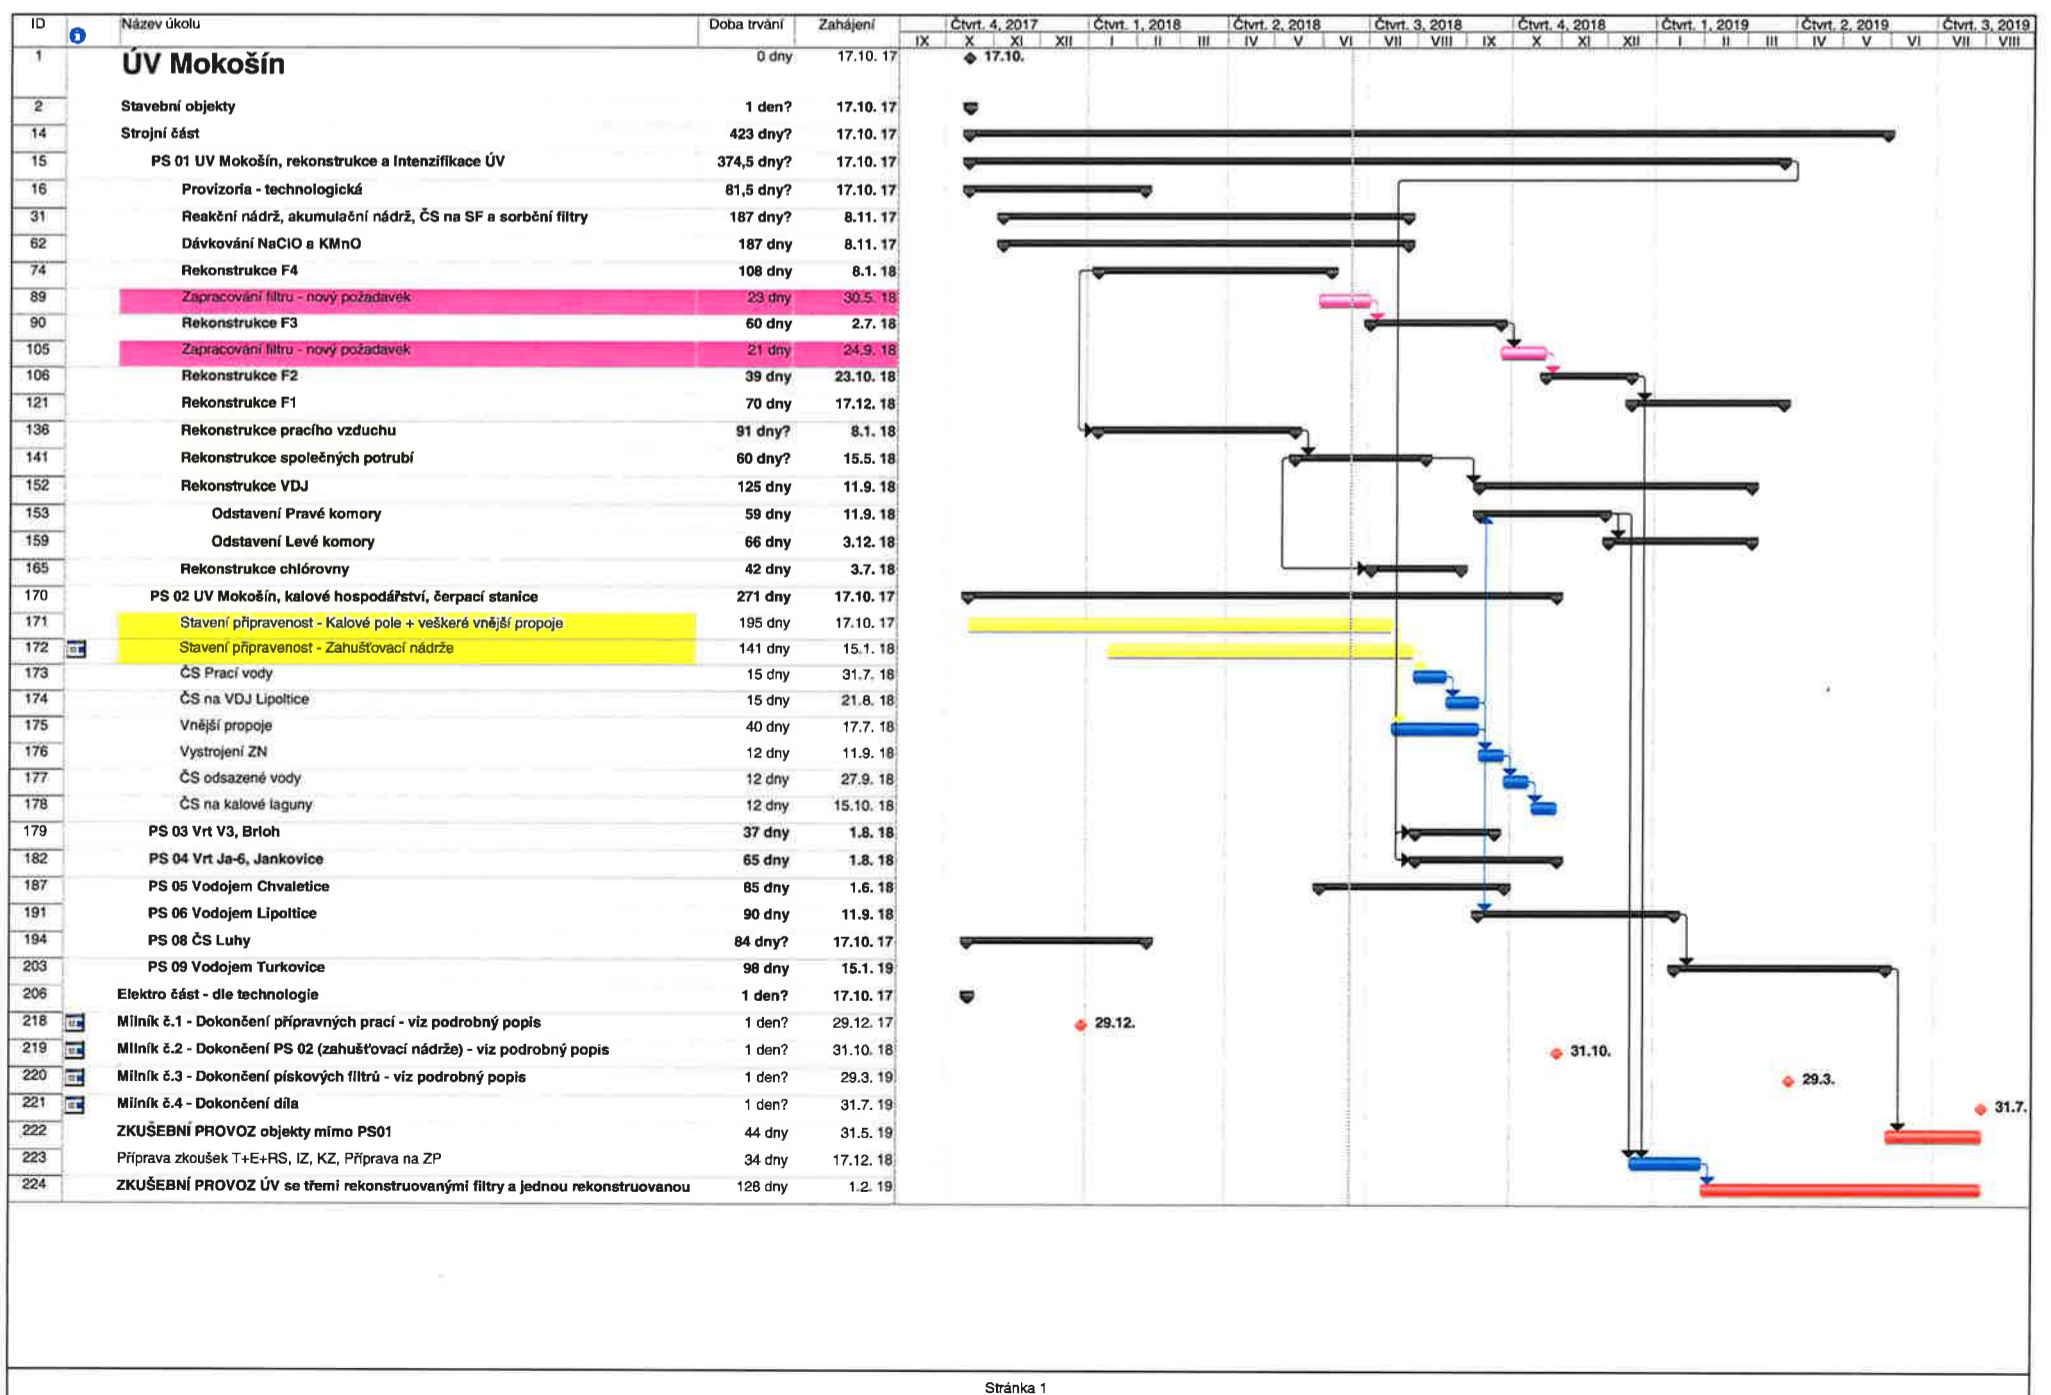
Za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Pokorný
předseda představenstva VCES a.s.

VCES a.s.
Na Heršově 337/3, 190 05 Praha 9
IČ: 267 46 573, 347

Anthony Christian Joel De Busschere
člen představenstva VCES a.s.

VCES a.s.
Na Heršově 337/3, 190 05 Praha 9
IČ: 267 46 573, 347



UV Mokošín Podrobnější popis plnění milníků – aktualizace 13.6.2018:

- 1) Milník č.1 – do 29.12.2017 – Přípravné práce - **Splněno**
 - Vzorky kalové pole
 - ČS Luhy – výměna potrubí na části čerpání pitné vody na UV Mokošín
 - Přeložka PVC 225 ČS Luhy – zahloubení
- 2) Milník č.2 – Do 30.10.2018 – Nové objekty
 - Dokončení objektu zahušťovací nádrže vč. strojovny
 - Vystrojení objektu zahušťovací nádrže PS02 - ČS prací vody, ČS Lipoltice
 - Dávkování Manganistan, chlornan
 - Reakční nádrž
- 3) Milník č.3 – do 31.3.2019 – UV
 - Dokončení VDJ Mokošín
 - Dokončení pískových filtrů
 - Relining přivaděč UV Mokošín – Jankovice
 - Dokončení VDJ Lipoltice
- 4) Milník č. 4 – Do 31.7.2019 – Dokončení prací dle SOD.
 - Dokončení VDJ Turkovice





Zahájení zkušebního provozu Zdrojů Jankovice a Brloh, UV Mokošín PS01 jen se třemi rekonstruovanými filtry – filtr č. 1 (není určen pro linku likvidace As), PS 02, Vdj Mokošín aktivní jen jedna komora, na VDJ Mokošín bude prováděn 2 měsíční zkušební provoz.











NÁZEV AKCE: Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín
 ČÍSLO AKCE: 5665
 INVESTOR AKCE: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
 SPRÁVCE STAVBY: Ing. Bohumír
 ZHOTOVITEL AKCE: Společnost ÚV Mokošín - VCS a KUNST

Finanční HMG stavby





	SDD	říjen 17	listopad 17	prosince 17	leden 18	únor 18	březen 18	duben 18	květen 18	červen 18	červenec 18	srpen 18	září 18	říjen 18	listopad 18	prosince 18	leden 19	únor 19	březen 19	duben 19	květen 19	červen 19	červenec 19	Celkem		
Stavěná část																										
SO 01 Zkušební nádrže	35 522 397,28 Kč			148 386,00 Kč	186 795,00 Kč			222 289,00 Kč	242 354,00 Kč	1 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 722 573,28 Kč											0,00 Kč	
SO 02 Průpustná potrubí	3 238 451,41 Kč			1 289 337,00 Kč						500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	445 134,41 Kč													15 522 397,28 Kč
SO 03 Stavební úpravy prozatímní budovy	24 851 525,83 Kč				187 763,00 Kč	558 986,00 Kč	418 889,00 Kč	113 943,00 Kč		500 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	500 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč				371 964,83 Kč			14 651 525,83 Kč
SO 04 Stavební úpravy na vrtu Břoluh - V3	502 664,25 Kč													502 664,25 Kč												502 664,25 Kč
SO 05 Stavební úpravy na vrtu Berkovice - V8	1 031 209,96 Kč													1 031 209,96 Kč												1 031 209,96 Kč
SO 06 Stavební úpravy V01 Chvalčovice	1 228 981,82 Kč									100 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč														1 228 981,82 Kč
SO 07 Stavební úpravy V01 Lipolčice	2 439 975,31 Kč																									2 439 975,31 Kč
SO 08 Rekonstrukce stávajícího příkopu	17 354 677,35 Kč											500 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	5 334 677,35 Kč	2 000 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč									17 354 677,35 Kč
SO 09 Stavební úpravy ÚV Luhy	1 465 565,64 Kč							97 879,00 Kč	265 565,64 Kč	500 000,00 Kč	400 000,00 Kč	202 125,00 Kč														1 465 565,64 Kč
SO 10 Stavební úpravy ÚV Turkařovice	2 109 839,97 Kč																									2 109 839,97 Kč
územní plochy, příslušenství ÚV Mokošín	4 532 447,69 Kč																									4 532 447,69 Kč
Stavěná část celkem	64 133 736,53 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 437 723,00 Kč	374 558,00 Kč	558 986,00 Kč	418 889,00 Kč	336 212,00 Kč	340 229,00 Kč	2 348 345,64 Kč	7 300 000,00 Kč	7 700 000,00 Kč	9 447 238,41 Kč	11 256 447,49 Kč	8 034 677,35 Kč	4 000 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	2 118 937,13 Kč	2 871 964,83 Kč	1 809 839,97 Kč	632 447,69 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	64 133 736,53 Kč	
Technologická část																										
PS 01 ÚV Mokošín, rekonstrukce a intenzifikace ÚV	10 231 806,38 Kč			734 473,00 Kč	121 190,00 Kč	110 208,00 Kč	7 430 970,00 Kč	3 284 913,00 Kč	1 322 609,00 Kč	2 100 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč							30 231 806,38 Kč
PS 02 ÚV Mokošín, kalíškové hospodářství, depozitárna	3 204 125,17 Kč											500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč											3 204 125,17 Kč
PS 03 Vrt V3, Břoluh	443 763,20 Kč																									443 763,20 Kč
PS 04 Vrt 16, Berkovice	2 150 251,67 Kč																									2 150 251,67 Kč
PS 05 Vodojem Chvalčovice	666 172,77 Kč											400 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	700 000,00 Kč	89 251,67 Kč											666 172,77 Kč
PS 06 Vodojem Lipolčice	1 573 151,02 Kč											200 000,00 Kč	266 172,77 Kč													1 573 151,02 Kč
PS 08 ÚV Luhy	3 225 484,97 Kč				919 557,00 Kč	651 818,00 Kč	874 605,00 Kč	538 129,00 Kč					241 091,87 Kč													3 225 484,97 Kč
PS 09 Vodojem Turkařovice	1 193 950,88 Kč														500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč									1 193 950,88 Kč
Elektr. část	17 434 400,00 Kč																									17 434 400,00 Kč
Provozní soubory celkem	60 372 126,96 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 654 212,00 Kč	1 024 787,00 Kč	2 020 374,00 Kč	8 897 159,00 Kč	3 645 917,00 Kč	2 239 839,00 Kč	3 380 000,00 Kč	2 934 140,00 Kč	3 942 091,87 Kč	6 156 140,15 Kč	8 929 382,56 Kč	3 325 790,55 Kč	3 640 473,60 Kč	2 180 315,26 Kč	2 081 748,96 Kč	2 487 941,17 Kč	2 089 172,54 Kč	1 149 346,96 Kč	443 221,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60 372 126,96 Kč	
Vedlejší rozpočtové náklady	3 282 381,00 Kč																									3 282 381,00 Kč
Celkem	127 784 243,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 235 418,00 Kč	1 593 945,00 Kč	2 639 360,00 Kč	9 233 688,00 Kč	4 918 729,00 Kč	2 664 724,00 Kč	5 565 565,64 Kč	9 834 140,00 Kč	13 241 091,87 Kč	15 803 379,54 Kč	18 385 830,05 Kč	11 980 467,90 Kč	7 240 473,60 Kč	4 380 515,26 Kč	3 081 748,96 Kč	4 786 858,32 Kč	5 161 642,57 Kč	3 159 000,93 Kč	1 295 669,05 Kč	187 918,00 Kč	0,00 Kč	127 784 243,59 Kč	

Projekt „Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín“			
ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 1	
Komu: Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s.		Datum: 4.5.2018	
Odesláno/			
předáno:			
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 02 – Propojovací potrubí	
Odkazy:	na specifikaci:	Trubní materiál	
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny: Změna typu potrubí části objektu SO 02 <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Na základě zjištění skutečného použitého materiálu trubních rozvodů bude použit na trubní vodovodní propoje místo PVC materiál HDPE 100 adekvátního DN, čímž je splněna podmínka zachování stejné nebo vyšší kvality dodávaného materiálu. Změna nemá dopad do ceny a termínů realizace. Oznámení vydává: Společnost ÚV Mokošín			
Potvrzením změnového listu dává objednatel souhlas s jeho fakturací.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : Datum: 4.5.2018  <small>VCEB a.s. Na Haršě 337/3, 190 05 Praha 9 IČ: 267 46 573, DIČ: CZ267 46 573</small>		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 8.5.2018 	
Za TDS: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 8.5.2018 		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 8.5.2018 	





Projekt „Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín“			
ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 2	
Komu: Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s.		Datum: 4.5.2018	
Odesláno/			
předáno:			
Stavební objekt (provozní soubor):	PS 01 – PS 09		
Odkazy:	na specifikaci:	Strojní specifikace	
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny: Změna výrobce rektční nádrže 10m3 a montážních vložek			
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>			
Na základě požadavku zhotovitele dochází ke změně oproti specifikaci v nabídce do soutěže u výrobků:			
1) Reakční nádrž stojatá 10m3 – z dodavatele „Vaněk Trutnov“ na dodavatele „STEP Trutnov“			
2) Montážní vložky – z dodavatele „Busch“ na dodavatele „AVK“ – typ vložky			
Montážní přírubová vložka se závitovou tyčí a střední přírubou AVK 17.7 PN 10			
- materiál tvárná litina, epoxidová povrchová ochrana			
- materiál spojovacího materiálu a svorníků: nerez			
Záměnou dodavatele je dodržen kvalitativní standart dodávky dle SOD			
Změna nemá dopad do ceny a termínů realizace.			
Oznámení vydává: Společnost ÚV Mokošín			
Potvrzením změnového listu dává objednatel souhlas s jeho fakturací.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí :		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí	
Datum:  4.5.2018 <small>YCES a.s. Na Měsí 337/3, 190 05 Praha 9 IČ: 267 46 573, DIČ: CZ 267 46 573</small>		Datum:  4.5.2018	
Za TDS: Souhlasí - nesouhlasí :		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí	
Datum:  4.5.2018		Datum:  4.5.2018	

Projekt „Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín“			
ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 3	
Komu: Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s.		Datum: 4.5.2018	
Odesláno/			
předáno:			
Stavební objekt (provozní soubor):		PS 08 – ČS Luhy	
Odkazy:	na specifikaci:	Strojní specifikace	
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny: Vyjmutí z předmětu dodávku a MT tlakové nádoby a motýlové klapky			
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Na základě skutečnosti, že z provozních důvodů došlo před zahájením realizace k výměně tohoto zařízení a tedy z předmětu díla zhotovitele se vyjímá: <ol style="list-style-type: none"> 1) Položka č. 8.1.20 Tlaková nádoba s vakem z potravinářské pryže, 2000 l 2) Položka č. 8.1.22 Uzavírací motýlová klapka DN 65 			
Součástí oznámení změny je: Propočet nejvyššího cenového dopadu změny – - 213.819,84,- Kč bez DPH Stanovisko projektanta			
Oznámení vydává: Společnost ÚV Mokošín			
Potvrzením změnového listu dává objednatel souhlas s jeho fakturací.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí – nesouhlasí :		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí	
Datum:  <small>VCES a.s. Na Hrádkě 337/3, 190 05 Praha 9 IČ: 267 46 573, DIČ: CZ267 46 573</small> 4.5.2018		Datum:  8.5.2018	
Za TDS: Souhlasí – nesouhlasí :		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí-	
Datum:  8.5.2018		Datum:  8.5.2018	

Projekt „Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín“			
ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 4	
Komu: Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s.		Datum: 4.5.2018	
Odesláno/			
předáno:			
Stavební objekt (provozní soubor):	PS 01 – ÚV Mokošín, rekonstrukce a intenzifikace ÚV		
Odkazy:	na specifikaci:	Strojní specifikace	
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny: Změna dodávky zákaloměrů dle požadavku objednatele			
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>			
Na základě požadavku objednatele dochází ke změně zákaloměrů z dodavatele HACH na fy SIGRIST vč. změny způsobu měření zákalu. Záměnou výrobce jsou prvky vyšší kvality.			
Popis podrobný zákaloměrů vč. cenové kvantifikace			
Součástí oznámení změny je:			
1) Podrobný popis zákaloměrů vč. Propočtu nejvyššího cenového dopadu změny – + 344.604,- Kč bez DPH			
2) Specifikace zasláná objednatelem			
3) Stanovisko projektanta			
Oznámení vydává: Společnost ÚV Mokošín			
Potvrzením změnového listu dává objednatel souhlas s jeho fakturací.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí :		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí	
<small>VCES a.s. Na Hrádkách 200/13, 450 05 Praha 9 IČ: 267 46 573, DIČ: CZ 267 46 573</small> Datum: 4.5.2018		Datum: 8.5.2018	
Za TDS: Souhlasí - nesouhlasí :		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí	
Datum: 8.5.2018		Datum: 8.5.2018	

Projekt „Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín“			
ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 5	
Komu: Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s.		Datum: 4.5.2018	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		PS 01 – ÚV Mokošín, rekonstrukce a intenzifikace ÚV, PS 05 – VDJ Chvaletice, PS 06 – VDJ Lipoltice	
Odkazy:	na specifikaci:	Strojní specifikace	
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny: Změna typu UV Lamp - doplnění stírání senzorů			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě požadavku objednatele dochází ke změně typu UV lamp pro hygienizaci vody v rámci UV Mokošín.			
Součástí oznámení změny je:			
1) Propočtu nejvyššího cenového dopadu změny s popisem změny – + 0,00,- Kč bez DPH			
2) Specifikace výrobku fy DISA Brno			
3) Stanovisko projektanta			
Oznámení vydává: Společnost ÚV Mokošín			
Potvrzením změnového listu dává objednatel souhlas s jeho fakturací.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí :		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí	
Datum:  9.5.2018 <small>VČES a.s. Na Hšíř 337/3, 190 05 Praha 9 IČ: 267 46 573, DIČ: CZ 267 46 573</small>		Datum:  8.5.2018	
Za TDS: Souhlasí – nesouhlasí :		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí.	
Datum:  8.5.2018		Datum:  4.5.2018	

Projekt „ Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín “			
ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 6	
Komu: Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s.		Datum: 13.6.2018	
Odesláno/ předáno:			
Stavební objekt (provozní soubor):	SO 01 – Zahušťovací nádrže		
Odkazy:	na specifikaci:	Založení objektu, pažení stavební jámy	
	na výkresy:	Projektová dokumentace výkres č. D 1.1.1	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:	HMG stavby vč. stanovení milníků	
<p>ZMĚNA – popis změny: Změna pažení a založení objektu SO 01 – Zahušťovací nádrže</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě zkoušky beranění bylo zjištěno, že není možno provést štětovnicovou stěnu do požadované hloubky dle PD. Stávající lokální geologická situace neumožňuje provést štětovnicovou stěnu v plném rozsahu a bude nutné provést svahovaný výkop vč. zajištění a ošetření základové spáry a stěn. Touto nepředvídatelnou změnou došlo ke změně způsobu založení objektu zahušťovacích nádrží.</p> <p>Díky přímé kolizi objektu se stávající nalezenou ŽB jámkou, je nutné tuto jámku odstranit.</p> <p>Součástí oznámení změny je: 1) Stanovisko projektanta 2) Zápis geologické posouzení in situ 3) Zákres změny základové jámy 4) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny – - 496.816,65,- Kč bez DPH</p> <p>Změna má dopad do milníku č. 2, kde dochází k posunu termínu na 30.10.2018 milníku č. 3, kde dochází k posunu termínu na 31.3.2019 milníku č. 4 / Termín dokončení díla, kde dochází k posunu termínu na 31.7.2019</p> <p>Oznámení vydává: Společnost ÚV Mokošín</p>			
Potvrzením změnového listu dává objednatel souhlas s jeho fakturací.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : Datum: 13.6.2018 <small>VCEB a.s. Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 IČ: 267 46 573, DIČ: CZ267 46 573</small>		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí- Datum: 13.6.2018	
Za TDS: Souhlasí - nesouhlasí : Datum: 13.6.2018		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 13.6.2018	

Projekt „Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín“			
ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 7	
Komu: Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s.		Datum: 9.5.2018	
Odesláno/ předáno:			
Stavební objekt (provozní soubor):	SO 03.1.2 - Stavební úpravy provozní budovy - rekonstrukce filtrů		
Odkazy:	na specifikaci:	Skutečný stav stávajících ŽB konstrukcí	
	na výkresy:	Projektová dokumentace výkres č. D 1.3.1.7 – Rekonstrukce filtrů	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
<p>ZMĚNA – popis změny: Změna rozsahu úpravy a opravy stávajících ŽB konstrukcí pískového filtru č.4 u objektu SO 03.1.2</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě skutečného tvaru a stavu stávajících ŽB konstrukcí stěn a dna pískového filtru č. 4 po odstranění filtrátu a meziden bylo zjištěno, že pro osazení technologie dle PD je nezbytné upravit tvar dna pískového filtru bouráním části pod stávajícími mezidny (tvar filtru není obdelník) a následnou sanací, vč. sanace stěn z důvodu nutnosti vyrovnání nerovností konstrukce až 12 cm. Jedná se o nepředvídatelnou změnu díla.</p> <p>Součástí oznámení změny je:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Propočtu nejvyššího cenového dopadu změny + 259.603,- Kč bez DPH 2) Stanovisko projektanta <p>Oznámení vydává: Společnost ÚV Mokošín</p>			
Potvrzením změnového listu dává objednatel souhlas s jeho fakturací.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : Datum:  <small>WCS s.r.o. 104 In: Horní 334/3, 190 05 Praha 9 IČ: 267 46 523, DIČ: CZ 267 46 573</small>		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum:  9.5.2018	
Za TDS: Souhlasí – nesouhlasí : Datum:  9.5.2018		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum:  9.5.2018	

Projekt „Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín“			
ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 8	
Komu: Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s.		Datum: 9.5.2018	
Odesláno/			
předáno:			
Stavební objekt (provozní soubor):		PS 01 – ÚV Mokošín, rekonstrukce a intenzifikace ÚV	
Odkazy:	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace Strojní část PS 01	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr	
	na jinou část smlouvy:		
<p>ZMĚNA – popis změny: Změna filtrační náplně dvouvrstvé pro pískový filtr č. 4 a č.3 a výkonu pracích čerpadel pro pískové filtry</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě doporučení dodavatele náplně pískových filtrů, které je přiloženo u tohoto návrhu změny a zmiňuje „pravděpodobnou tvorbu větších železitých vloček, které by zalepily vrchní filtrační vrstvu“ je odsouhlasena změna frakce filtračního materiálu pro pískový filtr č. 3 a 4 dle návrhu dodavatele, tedy Filtrační náplň dvouvrstvá v zrnitosti – spodní vrstva zrno 1 – 1,6 mm a horní vrstva zrno 1,5 – 2,5 mm. Změnou jsou dotčeny prací čerpadla, kde dojde v dodání motoru se jmenovitým výkonem 37kW, hydraulická část čerpadel bude beze změn. Změna náplně splňuje požadavek na dodávku stejné nebo vyšší kvality. Změna byla nepředvídatelná.</p> <p>Součástí oznámení změny je: 1) Propočtu nejvyššího cenového dopadu změny – + 0,00,- Kč bez DPH 2) Podrobný popis změny 3) Doporučení dodavatele filtračního materiálu fy ENVIPUR 4) Stanovisko projektanta</p> <p>Oznámení vydává: Společnost ÚV Mokošín</p> <p>Potvrzením změnového listu dává objednatel souhlas s jeho fakturací.</p> <p>Vyjádření dotčených:</p>			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí <small>VČES a.s. IČO: 331/3, 190 05 Praha 9 IČ: 167 46 573, DIČ: CZ267 46 573</small> Datum: 9.5.2018		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 9.5.2018	
Za TDS: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 9.5.2018		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 9.5.2018	



A BOUTYGHES CONSTRUCTION COMPANY
