



## Změnový list

**Předkládá "Společnost ÚV Hrobice" zastoupená správcem společnosti společností VCES a.s.**

**Projekt: „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice“  
Podprojekt 1 - III. Část Intenzifikace ÚV Hrobice**

<b>Číslo smlouvy:</b>	62/20/SOD
<b>Číslo změnového listu:</b>	1/29
<b>Název změnového listu:</b>	PS 03 Výměna elektro pohonu 12YV6 v místnosti kotelny
<b>Datum:</b>	06/2022
<b>Identifikační číslo EIS:</b>	CZ. 05.1.30/0.0/0.0/17_081/0010874
<b>Název smlouvy:</b>	Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice
<b>Smluvní strany:</b>	
<b>Objednatel:</b>	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014 530 02 Pardubice
<b>Zhotovitel:</b>	Společnost ÚV Hrobice Vážní 456 Hradec Králové, 503 14

Ve vztahu k smlouvě o dílo bude předmětná změna řešena dle zákona 134/2016  
Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou  
zakázku odst. 5.





### **Předmět změny:**

Předmětem změnového listu jsou vícepráce spojené s požadovanou výměnou elektropohonu 12YV6 v PS 03.

Vícepráce bez DPH

4 459 Kč

---

### **Zdůvodnění:**

Změna je předložena Zhotovitelem na základě požadavku Objednatele na výměnu uvedeného zařízení z důvodu jeho nefunkčnosti

**Z výše uvedeného vyplývá, že výše uvedenou změnu nebylo možno Zhotovitelem předvídat.**

### **Přílohy:**

Příloha č. 1 – Ocenění změny

Příloha č. 2 – Grafická příloha - Obvodové schéma

Příloha č. 3 – Faktura / nabídka

Příloha č. 4 – Bilance změn ze smlouvy ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.

Příloha č. 5 – Stanovisko projektanta

Příloha č. 6 – Záznam ze stavebního deníku

### **Stanovisko projektanta:**

Je formulováno v příloze 5 změnového listu.

### **Změna iniciována:**

Zhotovitelem na základě nepředvídatelných objektivních příčin.

**Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký:**  
Ne





OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

**Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle: Ne**

**Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla: Ne**

**Termín provádění prací: 05/2022 – 06/2022**

**Schválená částka změny:**

Zvýšení ceny díla o 4 459 Kč bez DPH.

**Za objednatele:**

Odsouhlasila: Ing. Gabriela Fialková, technická náměstkyně

Datum:

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE

IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631

OR KS HK, oddíl B, vložka 999

40

**Za zhotovitele:**

Vypracoval: Jiří Pluskal

Datum:

GDF spol. s r.o.  
Mostkov 28  
788 01 OSTAVA  
-12-

**Za Správce stavby:**

Odsouhlasil: Ing. Jaroslav Valkovič

Datum: 6. 11. 2022



ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY  
A KVALITY SV PARDUBICE

SPRÁVCE STAVBY  
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

**Za projektanta:**

Odsouhlasil: Ing. Jiří Forejtek

Datum:

Handwritten signature of Ing. Jiří Forejtek



Vodohospodářsko-inženýrské  
služby, spol.s r.o.  
Na Střežině 1079  
500 03 Hradec Králové



## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ


Stavba: Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice  
 Objekt: PS 03 - Elektrotechnologie, ASŘ, přenosy  
 Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.  
 Zhotovitel: Společnost ÚV Hrobice

Pol.č.	Popis položky	M.J.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
Položkový soupis prací a dodávek -VÍCEPRÁCE									
SB 1DK12-Motorická elektroinstalace									
64	Pohon elektro Belimo V ceně je obsažena kompletní dodávka pohonu	ks	1	4 209	4 209	250	250	4 459	4 459
celkem VÍCEPRÁCE									4 459
CELKEM									4 459

$$4'086,43 \times 1,03 = 4'209 \text{ Kč} \checkmark$$





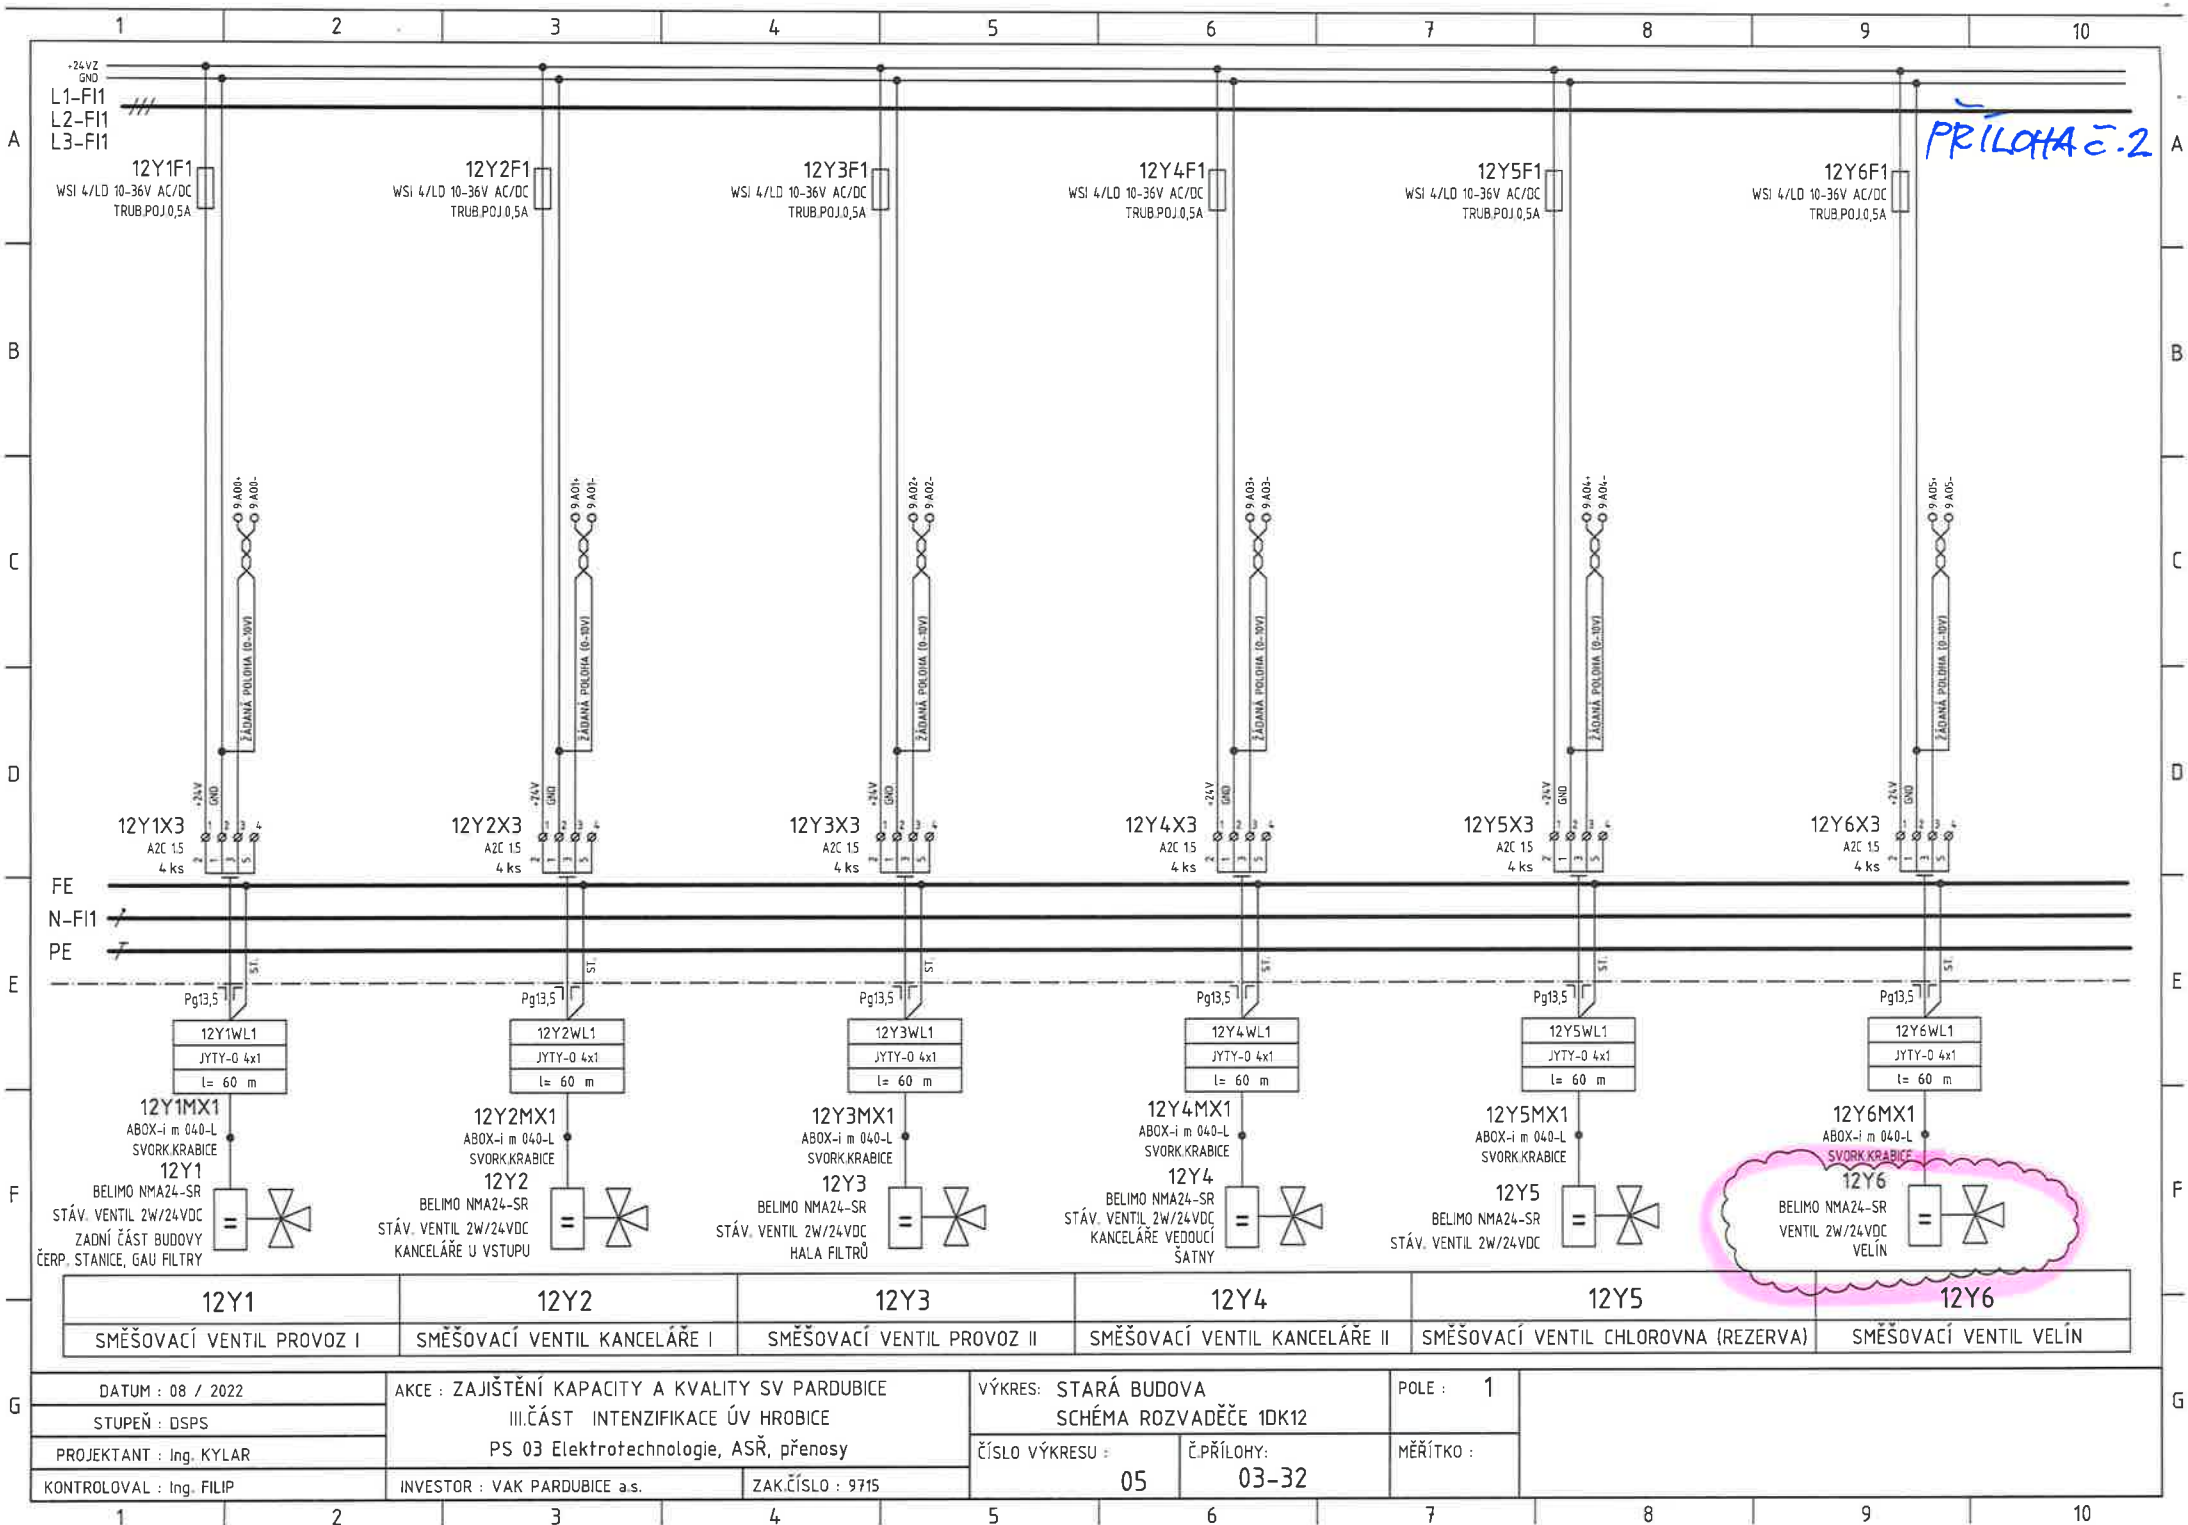



Page 10 of 23





<b>Dodavatel:</b> BOLA spol. s r.o. Charkovská 16 101 00 Praha 10-Vršovice Česká republika		<b>FAKTURA - daňový doklad</b>		22209583	
IČ: 18630219 DIČ: CZ18630219 www.bola.cz Městský soud v Praze : oddíl C , vložka 2611		<b>Odběratel:</b>		Objednávka: 220922030 Zakázka: Dod. list: 2022018729 Konst. symbol: 0008 Variabilní symbol: 22209583	
Peněžní ústav: ČSOB, Praha 2 Číslo účtu: 616065953/0300 SWIFT kód: CEKOCZPP IBAN kód: CZ89 0300 0000 0006 1606 5953		GDF spol. s r.o.  Mostkov 28 78801 Oskava - Mostkov Česká republika			
Příjemce: GDF spol. s r.o. GDF spol. s r.o., Mostkov 28, 78801 Oskava - Mostkov, Česká republika		IČ: 47151901 DIČ: CZ47151901			
Způsob dopravy: CZCP		<b>Dodací a platební podmínky:</b> Datum splatnosti: 06.10.2022 Forma úhrady: Dobírkou Datum uskutečnění plnění: 22.09.2022 Datum vystavení: 22.09.2022			
Označení dodávky		Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva % Cena bez DPH [CZK] Sazba DPH v % Celkem s DPH [CZK]
Fakturuje Vám					
• Servopohon Belimo NM 24 A-SR		1	ks	3 980,64	3 980,64 21 4 816,57
• Česká pošta (Balík Do ruky)		1		81,82	81,82 21 99,00
• Dobírka		1		23,97	23,97 21 29,00
Rekapitulace DPH v CZK		4 086,43 4 944,57			
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	4 086,43	858,14	0,00	4 086,43	858,14
Zaokrouhlení:					0,43 Kč
K úhradě:					4 945,00 Kč
Přílohy: Fakturu vystavil: Knapová Bohumila Tel.: 257310358 Fax: 257310358,257310348 Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby. Provozovna : Praha - západ, Jinočany. Severní 276, 252 25		Strana: 1 / 1 knapova@bola.cz		BOLA Charkovská 16 101 00 Praha 10 Provozovna: Praha - západ Jinočany, Severní 276 DIČ: CZ18630219 bola@bola.cz	



**Projekt : „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice“**

Identifikační číslo : CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_081/0010874

Příloha č. 4

**BILANCE ZMĚN ZE SMLOUVY VE SMYSLU ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 134/2016 Sb.**

Změnový list číslo	Změna dle § 222 odst. 4 Limit 10% hodnoty smlouvy o dílo 59 695 234,27 Kč Limit 15% hodnoty stavebních prací 86 893 408,31 Kč			Změna dle § 222 odst. 5 Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč			Změna dle § 222 odst. 6 Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč			Změna dle § 222 odst. 7		
	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Rozdíl (Kč)
1/1 Změna druhu betonu a prefa konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521 408,17	9 981 607,57	19 503 015,74	0,00	0,00	0,00
1/2 Povrchová úprava v nádrži prací vody m.č. 08 (NEREALIZOVÁNO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/3 Změna sendvičových panelů SO 01, SO 02	0,00	0,00	0,00	2 806 684,66	2 569 429,41	5 376 114,08	314 226,78	276 024,74	590 251,52	0,00	0,00	0,00
1/4 Výměna podhledů v m. č. 106, 114 a 115 v SO 02	0,00	0,00	0,00	264 522,98	32 508,00	297 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/5 Podlaha v serverovně v SO 02	0,00	0,00	0,00	79 684,51	62 818,90	142 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/7 Vyrovnávací podlaha v hale filtrů v SO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 186,78	0,00	157 186,78	0,00	0,00	0,00
1/8 Doplnění I – profilů pro technologické potrubí na propojovací lávce mezi objekty SO 01 a SO 02	0,00	0,00	0,00	651 223,67	0,00	651 223,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/9 Změna povrchové úpravy v nádrži prací vody pro ultrafiltraci (místnost č. 08)	0,00	0,00	0,00	67 501,43	0,00	67 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/10 Doplnění zábradlí a přechodu na střechu - požární schodiště u objektu SO 01	0,00	0,00	0,00	338 773,49	0,00	338 773,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/11 Změna skladby střech SO 01 a SO 02, doplnění zachytňého systému SO 01 a SO 02, nerealizace videostěny SO 02	0,00	0,00	0,00	2 350 834,45	1 075 821,07	3 426 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 Změna střechy z kotvené na lepenou na přístavbě objektu SO 02 a změna provedení detailů na střechách objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	2 057 412,54	1 364 875,97	3 422 288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/13 Změna podlahy na velinu objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 552,76	0,00	0,00	285 780,81	596 552,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1/14 Změna podlahy v m.č. 114 a m.č. 115 a v přístavbě v objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 021,77	0,00	0,00	470 711,36	812 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1/15 Doplnění a úpravy technologie v PS 01 a PS 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 500,00	0,00	0,00	462 822,00	1 994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/17 PS 03 Nieužití čerpadel nosné vody pro měření zákeu za pískovými filtry. Provizorní čerpání na VDI Kunětická Hora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 953,00	0,00	0,00	107 600,00	151 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/18 Nieužití detektorů úniku Cl v chlorovné a skládě chlorovny PS 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 420,00	0,00	0,00	193 420,00	193 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/19 PS 03 Doplnění IP telefonů v nové a staré budově	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 029,00	0,00	0,00	98 029,00	98 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/21 Změna měření hladiny z plováku na radar v PS 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	9 860,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/22 Doplnění kabelových propojí pro napojení dieselagregátu v PS 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 361,00	0,00	0,00	0,00	88 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/23 Doplnění protipožárních prostupů v PS 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 180,00	0,00	0,00	213 180,00	213 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/24 Rozšíření optické sítě PS 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 492,00	0,00	0,00	74 492,00	74 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/25 PS 03 Venkovní kabelové trasy UV Hrobice	0,00	158 100,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/26 Vícevýměř - Prodložen trubního vedení u UM (PS 01), Doplnění klapky (PS 02)	201 060,00	0,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/27 PS 03 Doplnění topných kabelů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 218,00	0,00	0,00	31 218,00	31 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/28 PS 03 Osvětlení a hromosvod. Vícevýměř a měřivměř	40 580,00	69 142,00	109 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/29 PS 03 Výměna elektro pohonu 12VV6 v místnosti kotelny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459,00	0,00	0,00	4 459,00	4 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1/32 Doplnění přístupových žebříků na střechu vedle přístavby SO 02, doplnění stříšky nad rozvaděče v SO 01, doplnění pomocných profilů pro montáž opláštění přístavby SO 02 sendvičovými panely, kiosek na plyn u objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	259 791,38	0,00	259 791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/33 Nahrazení kamenného koberce mozaikovou omítkou (SO 02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 091,51	174 848,55	322 940,06	0,00	0,00	0,00
1/34 Dveře a jejich dovybavení v SO 01, změna ručních sprch v SO 01, změna pokládky keramické dlažby v SO 01, odpočet nerealizovaných prací a dodávek v SO 01 a požární ucpávky zdiva a kanalizace v SO 01	0,00	0,00	0,00	102 229,18	309 599,81	411 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/35 Změna kanalizačního potrubí v objektu SO 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 805,61	531 577,13	639 382,73
1/36 Změna a doplnění SDK konstrukcí v objektu SO 02, doplnění kazetového podhledu v přístavbě v objektu SO 02 a doplnění rozvodů ZTI (kuchyňka) v přístavbě objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	614 682,00	270 373,13	885 055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/37 Změna sanace venkovních ramp objektu SO 02, chlorovny a trafostanice; doplnění ošetření povrchu sanací dělicí žb příčky v akumulaci a odstranění stávajícího nátěru v akumulární nádrži (SO 02); sanační práce v pískových filtrech (SO 02.1)	0,00	0,00	0,00	1 290 993,76	1 010 822,48	2 301 816,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/38 Zpevněné plochy - vícevýměry ± nové dlažby (SO 04), Zpevněné plochy - vícevýměry ze stávající dlažby (opravy komunikací po instalaci zemnění) (SO 04)	2 375 106,74	0,00	2 375 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/39 Doplnění chemického čištění CIP PS 01	0,00	0,00	0,00	1 171 727,00	0,00	1 171 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/40 Úspora výztuže - mėnėvymėry (SO 01, SO 02, SO 02.3, SO 05)	0,00	7 521 875,94	7 521 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/41 Doplnění podlahovėch vpustı v objektu SO 01 a v objektu SO 02	0,00	0,00	0,00	111 909,28	0,00	111 909,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/43 Bourání stávajících základů a realizace nových základů pod technologiı (SO 01, SO 02)	0,00	0,00	0,00	546 001,16	0,00	546 001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/46 Zpevněné plochy - doplnění záchytných míst v komunikaci (SO 04)	0,00	0,00	0,00	126 924,71	0,00	126 924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/1 Úprava rozsahu a provedení čerpacích zkoušek	0,00	0,00	0,00	2 105 578,22	5 413 135,41	7 518 713,63	506 811,87	0,00	506 811,87	0,00	0,00	0,00
2/2 Změna materiálového provedení poklopů a jejich zajištění	0,00	0,00	0,00	133 962,53	0,00	133 962,53	367 632,62	517 980,66	885 613,28	0,00	0,00	0,00
2/3 Sanace pomocné studny ČS Čeperka (SO 03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 152,26	0,00	278 152,26	0,00	0,00	0,00
2/7 Čištění stávajících vrtů v prameništi Hrobice II. a jejich nové zystrojení (SO 02.1_1)	0,00	0,00	0,00	301 827,08	0,00	301 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2/8 Vícevýměry a mėnėvymėry v prameniřti Čeperka (armaturní řachty, proplachovací řachty, vodomėrnė řachty, napojení vrtů na násosky, násosky JZ, SV a ZV)	1 645 723,83	1 261 011,24	2 906 735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/4 ČS Oplatil - výměna trubního propoje mezi jímacím objektem a ČS - PS 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 645,00	0,00	178 645,00	0,00	0,00	0,00
4/5 Stavební úpravy na ČS Oplatil (SO 01)	0,00	0,00	0,00	162 634,35	0,00	162 634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>4 262 470,57</b>	<b>9 010 129,18</b>	<b>13 272 599,74</b>	<b>18 225 829,76</b>	<b>13 639 578,36</b>	<b>31 865 408,11</b>	<b>11 560 515,99</b>	<b>10 950 461,52</b>	<b>22 510 977,51</b>	<b>107 805,61</b>	<b>531 577,13</b>	<b>639 382,73</b>







**Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice**

**Podprojekt 1 III. Část intenzifikace ÚV Hrobice**

**Změnový list č.1/29 – stanovisko projektanta**

**Předmět ZL 1/29**

Předmětem změnového listu jsou vícepráce spojené s požadovanou výměnou elektropohonu 12YV6 v PS 03.

**Stanovisko projektanta a autorského dozoru**

Jedná se změnu vyvolanou provozem na základě nefunkčnosti stávajícího zařízení.

**Projektant s navrženou změnou souhlasí.**

V Hradci Králové

Ing. Jiří Forejtek





## Denní záznamy stavby

Datum: 1.4. 2022

SD č. ... / strana č. 0000025

GdF spol. s r.o.

PRACOVNÍ DOBA: 4<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup>

POČASÍ:

POČASÍ - ZATÍŽENO 19°C

PRACOVNÍCI: HÁJEK, SADOWSKI, PAULICEK, KETKOV,  
BÁHLO, VOLEJNÍK, HALOCH

PROVEDENÉ PRÁCE:

- HOUTAŘE KABELOVÝCH TRAS, KABELŮ A SVÍTIDEL  
V SUTERÉNU POD ROZVODNOU
- LÍPRAVA ZEPNÝCH SVODŮ PRO HROTHOSVOD  
STARÉ BUDOVY
- ZAPOJOVÁNÍ KABELAŽE V ROZVODNÝCH NA  
STROJOVNĚ

ZAPSAL: VOLEJNÍK



Zhotovitel projednával s objednatelům  
následující úpravy a změny:

- Doplnění topných kabelů na  
potrubí NaOH v budově 3001 a 3002
- Výměna stávajícího ventilu 1246  
za nový - třícestný ventil hotelu a  
- stávající nefunkční
- Doplnění měření el. energie u  
tepelných čerpadel 3. etáže  
monitorování na PC

Bude řešeno 26

Zapsal

LH Pluskal

