



DODATEK č.2 k SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: EP/6/MK/2022

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: **ENVI-PUR, s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice
společnost je zapsána Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 167596
zastoupena: Milanem Drdou, jednatelem společnosti
IČO: 25166077
DIČ: CZ25166077
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9986490237/0100
telefon: 381 203 211
fax: není
e-mail: info@envi-pur.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Milan Drda, jednatel společnosti
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a

Vícepráce

Soupis prací DPS 02

podepisovat:

ve věcech technických : Pavel Zíka, projektový manažer

ve věcech smluvních: Ing. Miloš Kočárník, manažer pro klíčové projekty

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. číslo: EP/6/MK/2022
ze dne 8.3.2022 (dále jen „Smlouva“):

1. Článek II - PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se upravuje tak, že se rozšiřuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy.“

2. Článek IV - CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Cena díla se na základě změnového listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy, se zvyšuje o **525 925 Kč bez DPH**.

Položka 4 - Žebřík v čerpací stanici předčištěných vod
Vícepráce 51 577 Kč bez DPH

Položka 5 –

5.1 – Nové napojení potrubí přebytečného kalu
Vícepráce 12 208 Kč bez DPH

5.2 – neobsazeno

5.3 – zaslepovací příruby DN 1000:

- Pol. z SOD 2.6.1. – náhrada přivařovací příruby DN 800 za DN 1000 – bez dopadu na cenu
- Pol. z SOD 2.6.2 – náhrada zaslepovací příruby – dopad na cenu ano

Vícepráce 110 494 Kč bez DPH

5.4 – demontáž servoklapek
Vícepráce 44 585 Kč bez DPH

6 – spojky, armatury
Vícepráce 75710 Kč bez DPH

7 – neobsazeno

8 – technické prohlášení + prodloužení záruky o 12 měsíců_ kompozitové rošty – bez dopadu na cenu

9 – lávka, podvěsný koš
Vícepráce 231 351 Kč bez DPH

**Celková cena díla po započtení VCP v dodatku č.1 činí:
46 522 608,-Kč bez DPH."**

**Celková cena díla po započtení VCP v dodatku č.2 činí:
47 048 533,-Kč bez DPH."**

3. Článek XI - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se doplňují takto:

- a. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.
- b. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží dva exempláře.
- c. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední z obou předmětných smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 dodatku č. 2 Smlouvy o dílo – ZL č.2

Soubor příloh č. 2 - přílohy k ZL č.2

V Pardubicích dne 28. 4. 2023

V Pardubicích dne 5. 4. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS MK, oddíl B, vložka 999



Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Ing. Martin Charvát
předseda představenstva

ENVI-PUR, s.r.o.
Na Víťovce 13/4, 160 00 Praha 6
Provozovna:
Wilsonova 420, 392 01 Soběslav
Tel.: 381 203 211, fax: 381 251 739
IČO: 25166077 DIČ: CZ25166077



ENVI-PUR, s.r.o.
Milan Drda
Jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum: 13.12.2021

Název stavby: BČOV Pardubice, investice
záměr D.07 - příjem dovážených odpadů (úpravy nádrží AN13,14)

Zakázkové číslo: 1250-89c

8 051 006,07

Rozpočtové náklady						červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	Zbývá
Základ pro DPH	15 %														
DPH	15 %														
Základ pro DPH	21 %														
DPH	21 %														
Cena celkem za stavbu						54 348 923									
Rekapitulace stavebních objektů															
Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	Zbývá
SO 04 Úpravy nádrží AN13,14	19 060 501		15 752 480	3 308 021	100,0	181500	613040,45	1313106,15	3382876,57	808667,71	797861,08	1763542,00	236514,03	228847,74	6 426 534
Celkem za stavbu	19 060 501		15 752 480	3 308 021	100,0										
Rekapitulace provozních souborů částí strojní															
Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	Zbývá
DPS 02 Příjmová stanice 2	24 416 267		20 178 733	4 237 534	100,0	96800	301433	787575,00			597069,00	1656974,00	1003057,00	1237368,00	14 498 457
Celkem za celek	24 416 267		20 178 733	4 237 534	100,0										
Rekapitulace provozních souborů částí elektro a ASŘ															
Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	Zbývá
DPS 05 Příjmová stanice 2	9 470 371		7 826 752	1 643 618	100,0			104017,18				1043561,59		2241014,91	4 438 159
Celkem za celek	9 470 371		7 826 752	1 643 618	100,0										
Vedlejší a ostatní náklady stavby															
Celkem za celek	1 401 785		1 158 500	243 285	100,0	44000	110000	176000	66000	66000	33000	66000		66000	531 500

Vícepráce 1 dle DODATKU č.1

		Listopad
Položka č.1 - 40.1.40.2 _Chemické kotvy, trny, vrtání	1 095 520	1 095 520
Položka č.2 - 40.4 - Kluzná ložiska	192214	192214
Položka č.3 - Sanace betonových ploch	318409	318409
Celkem vícepráce 1	1 606 143	1 606 143

Vícepráce 2 dle DODATKU č.2

Položka č.4	žebříky	51 577
Položka č.5.1	nápojení potrubí přebytečného kalu	12208
Položka č.5.3	zaslepovací příruby DN 1000	110494
Položka č.5.4	demontáž servoklapek	44585
Položka č.6	spojky, armatury	75710
Položka č.7	neobsazebno	
Položka č.8	nosnot lávky, prodloužení záruky	
Položka č.9	lávka_podvsný koš_oprava	231351
Celkem vícepráce 2		626 926

ENVI-PUR, s.r.o.

Na Vítkovce 1346, 160 00 Praha 6
Tel.: 220 923 088, fax: 220 972 305
IČO: 25168077 DIČ: CZ25168077



Název stavby: BČOV Pardubice, záměr D.07 - příjem dovážených odpadů	
Změnový list č.2 k dodatku č.2 SOD	
Část stavby dotčená změnou:	DPS 02
Projekční zpracování změny:	Ne-změna se týká upřesnění řešení dle požadavků provozovatele
POPIS ZMĚNY: DSP 02 – Strojně technologická část	
Méněpráce x	
Vícepráce <u>Soupis prací DPS 02</u> Položka 4 - Žebřík v čerpací stanici předčištěných vod Vícepráce 51 577 Kč bez DPH Položka 5 – 5.1 – Nové napojení potrubí přebytečného kalu Vícepráce 12 208 Kč bez DPH 5.2 – neobsazeno 5.3 – zaslepovací příruby DN 1000: • Pol. z SOD 2.6.1. – náhrada přivařovací příruby DN 800 za DN 1000 – bez dopadu na cenu • Pol. z SOD 2.6.2 – náhrada zaslepovací příruby – dopad na cenu ano Vícepráce 110 494 Kč bez DPH 5.4 – demontáž servoklapek Vícepráce 44 585 Kč bez DPH 6 – spojky, armatury Vícepráce 75 710 Kč bez DPH 7 – neobsazeno 8 – technické prohlášení + prodloužení záruky o 12 měsíců_ kompozitové rošty – bez dopadu na cenu 9 – lávka, podvěsný koš Vícepráce 231351 Kč bez DPH	
Ohodnocení změny	Vícepráce dle REKAPITULACE VCP do ZL č.2: + 525 925 Kč Výsledná bilance = 525 925 Kč bez DPH
Ohodnocení změny (slovy):	pětsetdvacetpěttisícdevětsetdvacetpět korun
Vliv změny na termín dokončení:	ne



Přílohy změnového listu:

-Položka č. 4 – Příloha k ZL č.2 obsahující:

- 4_Kalkulace_žebřík – tabulka dle OP
- Výkresy 4 x
- Kusovník 1 x

-Položka č.5 – Příloha k ZL č.2 obsahující:

5.1_nové napojení přebytečného kalu DN 150

- 5.1_Kalkulace_nové napojení přebytečného kalu DN 150 – tabulka dle OP
- 5.1_Nákladové položky_nové napojení přebytečného kalu DN 150
- 5.1_Faktura dodavatele
- 5.1_fotografie 2x

5.2_neobsazeno

5.3_zaslepovací příruby

- 5.3_Kalkulace_zaslepovací příruby – tabulka dle OP
- 5.3_Nákladové položky_zaslepovací příruby
- 5.3_Faktura dodavatele
- 5.3_fotografie 3x

5.4_demontáž servoklapek

- 5.4_Kalkulace_demontážservoklapek – tabulka dle OP
- 5.4_Nákladové položky_demontáž servoklapek
- 5.4_Faktura dodavatele
- 5.4_fotografie 4x

6_spojky, armatury

- 5.4_Kalkulace_demontáž servoklapek – individuální kalkulace
- Zápis z KD

7_neobsazeno

8_lávka nosnost, prodloužení záruky

- Prohlášení o nosnosti
- Příloha č.1_k prohlášení o nosnosti

9_lávka, podvěsný koš

- Kalkulace lávka,podvěsný koš
- Nákladová cena SAP
- Výkresy 8x



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

IČO 60108631, OR KS V HK oddíl B, vložka 999, DIČ CZ60108631

Za investora:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Podpis:

~~zamítnuto~~ - doporučeno

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

~~zamítnuto~~ - doporučeno

Podpis:

Datum:

Za projektanta:

~~zamítnuto~~ - doporučeno

EKO EKO s.r.o.
Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice
IČO 25184750 DIČ CZ25184750
Tel: 385 775 111 Fax 385 775 125

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:
ENVI-PUR, s.r.o.

~~zamítnuto~~ - doporučeno

Podpis:

ENVI-PUR, s.r.o.
Na Vlčovce 134, 160 00 Praha 6
Provozovna:
Wilsonova 420, 392 01 Soběslav
Tel.: 381 203 211, fax: 381 251 739
IČO: 25166077 DIČ: CZ25166077

Datum:

Za TDI:

~~Zamítnuto~~ - doporučeno

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
73

Podpis:

Datum:

[illegible]


D Kusovník žebřík_27.9.2023

IS č.79 - Kalkulační sazby (montáž 2x510 Kč)


0 stříkání

Cena za 2 ks žebříků

51577

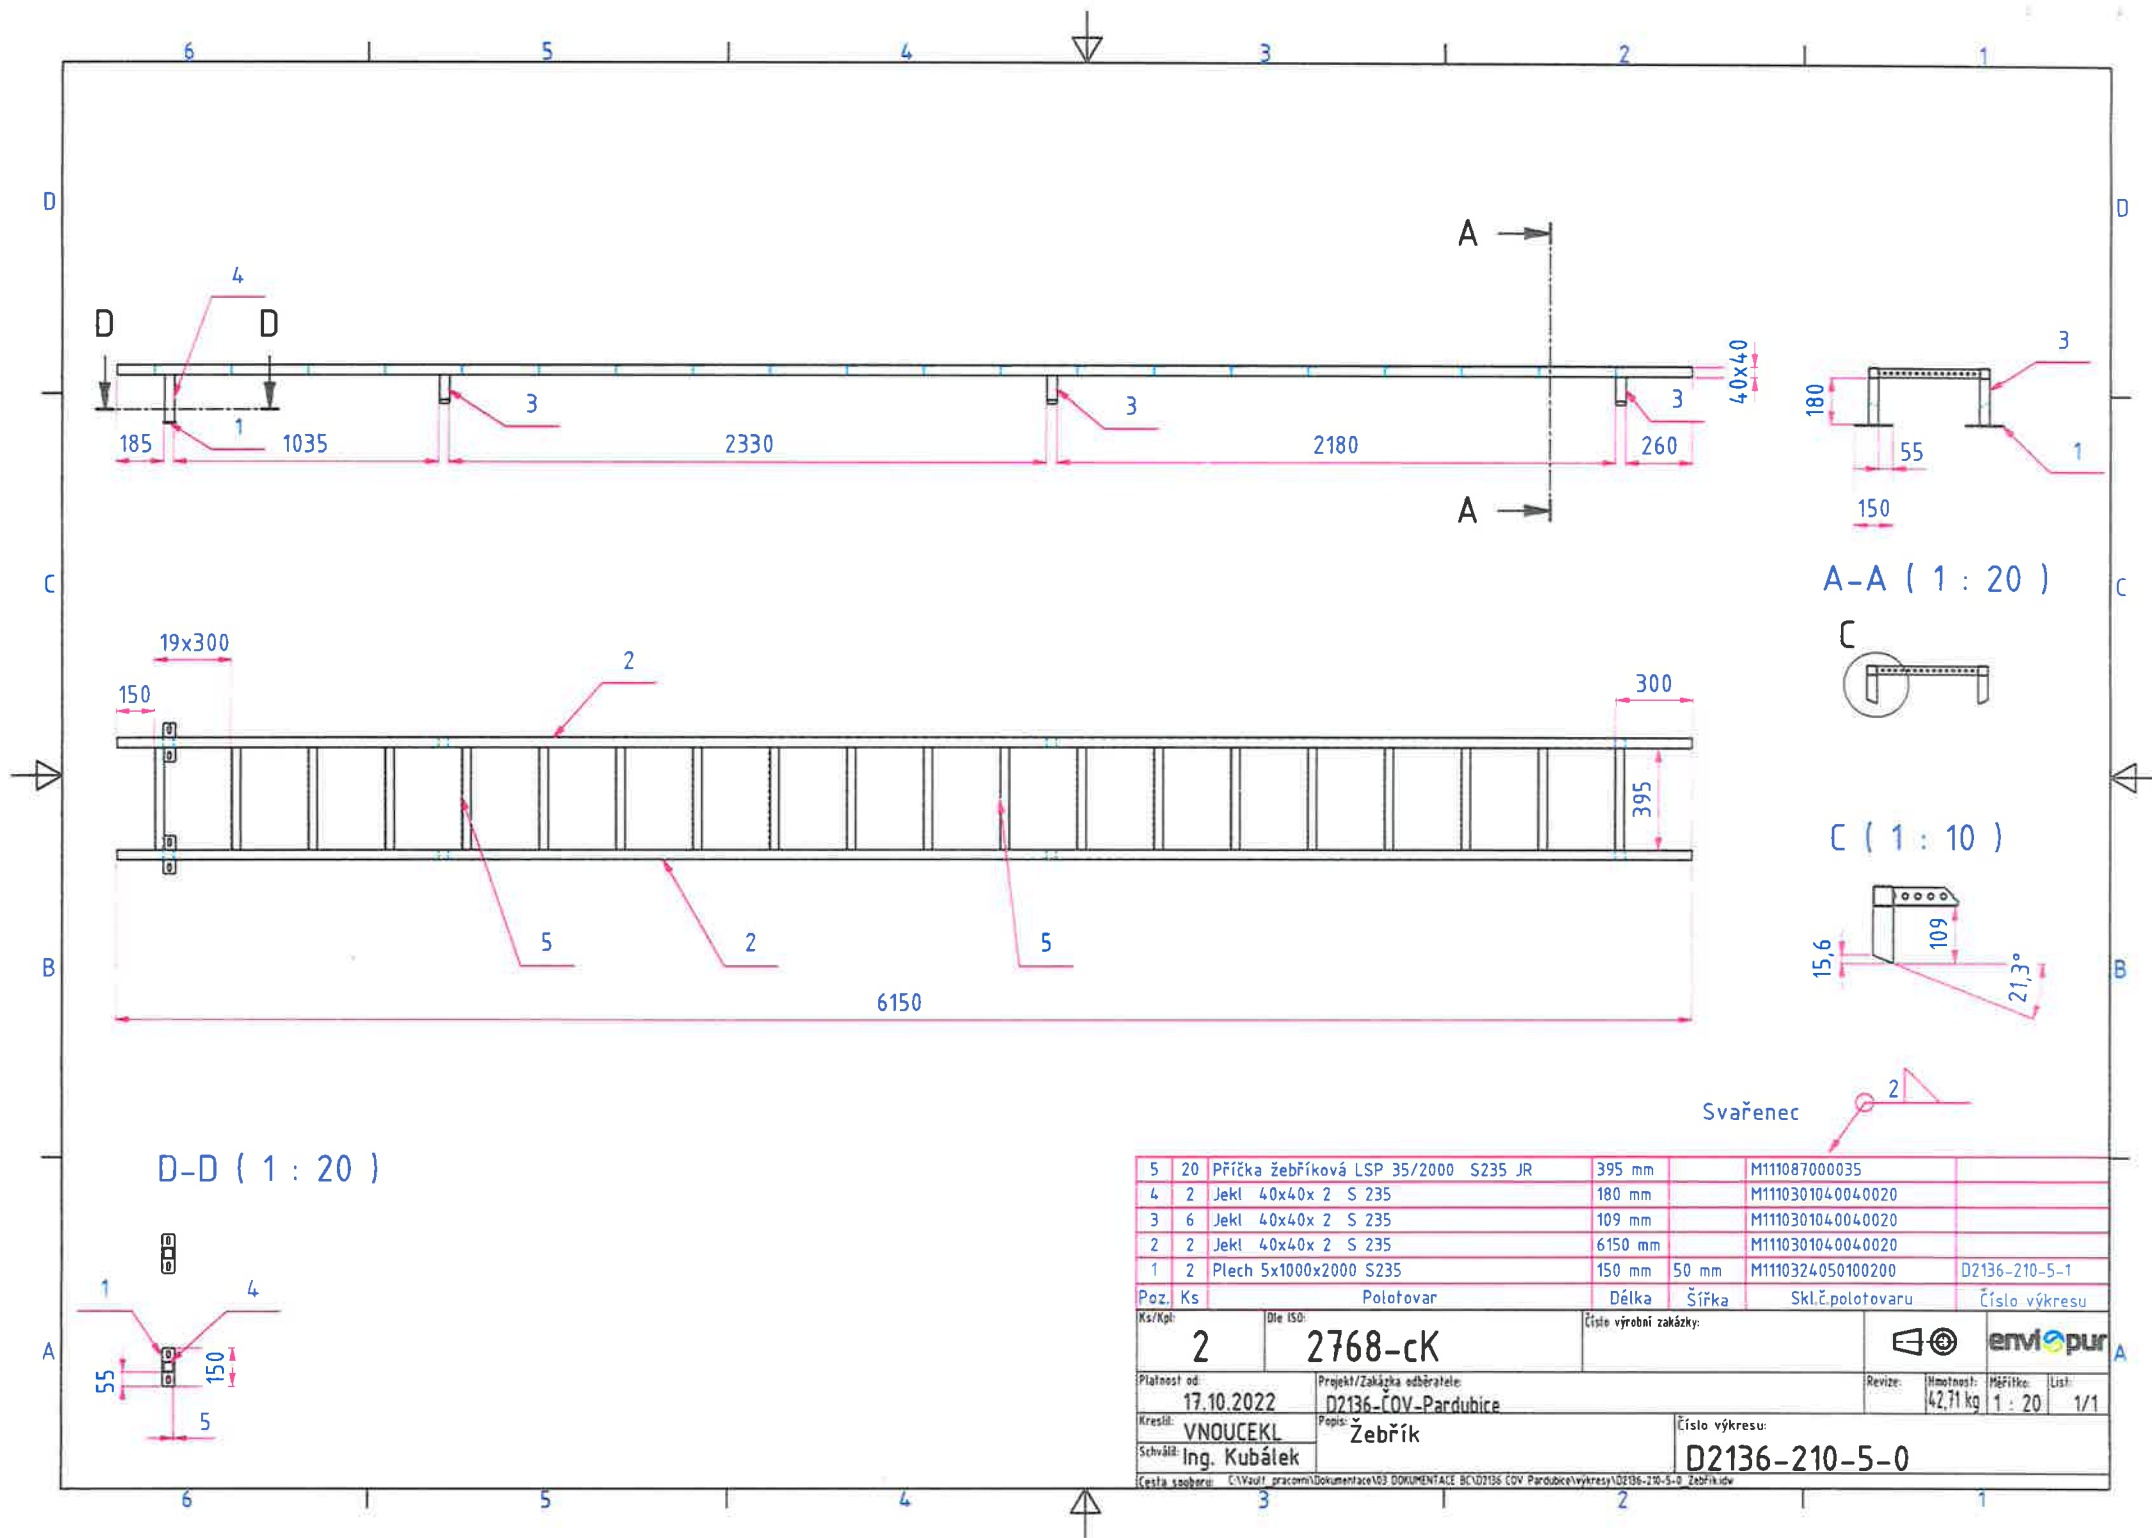

Plech 5x1000x2000 S235
Tl 5 mm - 150 mm x 50 mm
4 KS
D2136-210-5-1

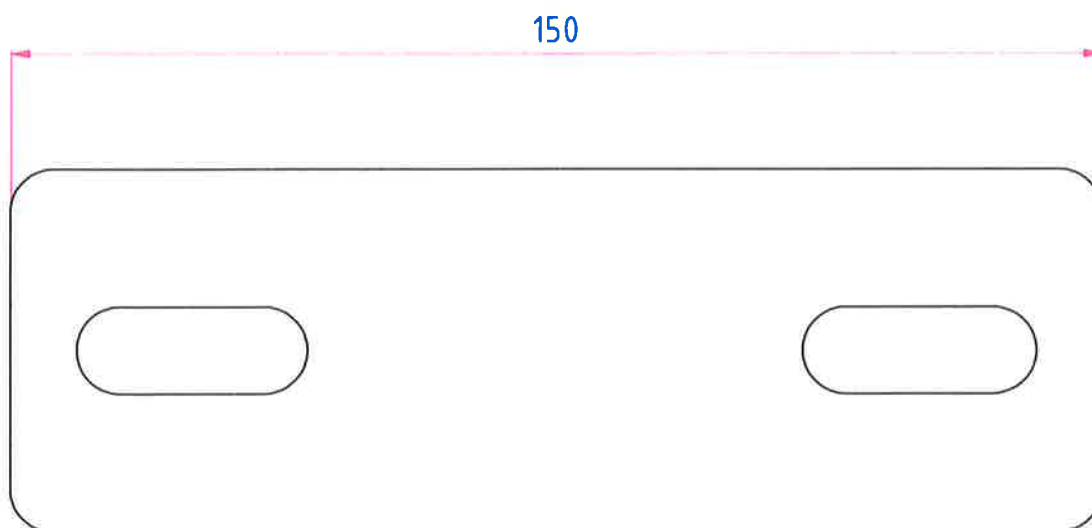

Výpalek

Ks/Kpl:	Dle ISO:	Číslo výrobní zakázky:				
4	2768-cK			envlo pur		
Platnost od:	Projekt/Zakázka odběratele:		Revize:	Hmotnost:	Měřítka:	List:
17.10.2022	D2136-ČOV-Pardubice			0,27 kg	1 : 1	1/1
Kreslil:	Popis:		Číslo výkresu:			
VNOUCEKL	Žebřík plech		D2136-210-5-1			
Schválil:						
Ing. Kubálek						
Cesta souborů: C:\Vault\pracovní\ Dokumentace\03 DOKUMENTACE BC\D2136 ČOV Pardubice\výkresy\D2136-210-5-1 Žebřík plechidw						

ENVI-PUR, s.r.o.

Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6, CZ

Kusovník

Kód produktu: I8X00234
 Popis produktu: ***** Pomocný kusovník při
 Množství: 1
 Typ: Výroba

Datum: 27/09/2022
 Čas: 06:40
 Uživateli: Lachout Zdeněk
 DIČ: CZ25166077

#	Artikl	Popis artiklu	MJ	Množství	Zásoba	Sklad	Cena za kus	Celkem
1	M1110301040040020	Jekl 40x40x 2 S 235	m	12	25	021-1	99,48	1.193,76
2	M111037000035	Přčka žebříková LSP 35/2000 S235 JR	ks	3,2	8	021-1	543,00	1.737,60
3	M116000000104	Svařecí drát WELD G3Si 1mm - black 15kg	ks	0.05	12	021-1	523,50	26,175
4	8010	R0010-PRÁCE-výroba KOVO		12		021-1	460,00	5.760,00
5	M1050916040040	Záslepka 40x40 černá	ks	4	153	021-1	4,78	19,04

Komponenty celkem: 8.736,58 CZK
Nadřazená cena: 8.736,58 CZK



FAKTURA

Daňový doklad

1201300

DODAVATEL IČ 08084572 DIČ CZ08084572
MADRA.cz s.r.o.
Lannova 2061/8
110 00 Praha 1

Konst.symb. 8
Var.symbol = EČDD : 1201300
Objednávka 70220715
Zakázka
Dod. l. č.:01-2-2461

Ev.číslo 01-2-0001300

Peněžní ústav Československá obchodní banka,

ODBĚRATEL IČ 25166077 (00) DIČ CZ25166077

ENVI-PUR, s.r.o.

ENVI-PUR, s.r.o.

III Uhrad'te na číslo účtu IIIBIC (SWIFT): **CEKOCZPP**
288089947/0300 BLZ:

Na Vlčovce 13/4
160 00 Praha 6

18 -07- 2022

Číslo účtu dle měny :

Česká republika

PŘIJATO

CZK288089947/0300 IBAN CZ24 0300 0000 0002 8808 9947
EUR288812269/0300 IBAN CZ53 0300 0000 0002 8881 2269
USD288863162/0300 IBAN CZ44 0300 0000 0002 8886 3162

PŘÍJEMCE

ENVI-PUR, s.r.o.

Na Vlčovce 13/4
160 00 Praha 6

Den splatnosti **25.07.2022**
Datum DPH 04.07.2022
Den vystavení 04.07.2022
Forma úhrady Př. k úhr.
Kód operace N - tuzemsko, reverse
Povaha transakce 90
Dodací podmínky

Druh dopravy: Top Trans

název	množství	mj	cena za mj	DPH	celkem bez DPH
1 příruba plochá EN1092-1/01-B1 P250GH PN 10 DN 200	3,000	ks	799,00	--	2 397,00
2 příruba plochá EN1092-1/01/B1 P250GH PN16 DN150/159	2,000	ks	654,00	--	1 308,00
3 příruba plochá EN1092-1/01/B1 P250GH PN10 DN500/508	2,000	ks	3 660,00	--	7 320,00
4 Příruba zaslepovací EN1092-1/05/B1 DN1000 PN10 mat.S235	1,000	ks	66 300,00	--	66 300,00
5 Příruba zaslepovací EN1092-1/05/B1 DN500 PN10 mat.S235	1,000	ks	10 415,00	--	10 415,00
6 Příruba plochá EN1092-1/01/B1 DN1000/1016 PN10 mat.S235	1,000	ks	12 480,00	--	12 480,00
7 trubka bezešvá pr. 159 x 4,5 11 353	1,120	m	1 135,00	--	1 271,20
8 Trubka bzš. pr.508 x 11mm S235JRH	1,010	m	9 240,00	--	9 332,40
9 pálení	1,000	--	900,00	--	900,00
10 oblouk EN10253-1-A 90st.3D S235 159 x 4,5	1,000	ks	590,00	--	590,00
11 oblouk EN10253-1-A 90st. 3D 219,1 x 6,3 S235	1,000	ks	1 310,00	--	1 310,00
12 paleta dřevěná obyč- nevratný obal	3,000	ks	180,00	--	540,00
13 doprava TopTrans	1,000	--	4 767,00	--	4 767,00

Fakturovaná částka podléhá režimu přenesení daň.povinnosti,viz zák.o DPH,č235/2004 Sb., (§92a-92e) a jste povinni doplnit výši daně a přiznat daň místně příslušnému FÚ = daň odvede zákazník podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona o DPH

V případě nedodržení lhůty splatnosti činí úrok 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení, dle § 369 obch. zák.
Až do úplného zaplacení zůstává předmět dodávky výhradním vlastnictvím dodavatele. Uvedené ceny stanoveny dohodou.
Vážení zákazníci, toto je originál naší faktury. Neobsahuje razítko a podpis. Dle Zákona o DPH č.235/2004 §28 to nejsou povinné údaje
MADRA.cz s.r.o. tel.+420-315722002, 315722457 fax.
Zapsána v OR u Měst. soudu v Praze,oddíl C, vložka 312657

Vystavil(a) Jana Tallerová

Strana 1



FAKTURA

Daňový doklad

1201300

DODAVATEL IČ 08084572 DIČ CZ08084572
MADRA.cz s.r.o.

Lannova 2061/8
110 00 Praha 1

Peněžní ústav Československá obchodní banka,

!!! Uhrad'te na číslo účtu IIBIC (SWIFT): CEKOCZPP
288089947/0300 BLZ:

Číslo účtu dle měny :

CZK 288089947/0300 IBANCZ24 0300 0000 0002 8808 9947

EUR 288812269/0300 IBANCZ53 0300 0000 0002 8881 2269

USD 288863162/0300 IBANCZ44 0300 0000 0002 8886 3162

PŘIJEMCE

ENVI-PUR, s.r.o.

Na Vlčovce 13/4
160 00 Praha 6

Druh dopravy: Top Trans

název

množství mj cena za mj DPH celkem bez DPH

REKAPITULACE DPH 0%

Základ 118 930,60

Daň 0,00

CELKEM 118 930,60

hmotnost celkem kg :

CELKEM

Zaokrouhlení 0,00

CZK 118 930,60



The realisation of the payment
of this invoice is monitored by
Payment Behavior Monitoring
of Czech and Slovak companies.

www.bisnode.cz



Realizace platby této faktury
je sledována Monitorinkem
platební chování českých
a slovenských firem.

www.bisnode.cz

Fakturovaná částka podléhá režimu přenesení daň.povinnosti,viz zák.o DPH,č235/2004 Sb., (§92a-92e) a
jste povinni doplnit výši daně a přiznat daň místně příslušnému FÚ = daň odvede zákazník podle § 29
odst. 2 písm. c) zákona o DPH

V případě nedodržení lhůty splatnosti činí úrok 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení, dle § 369 obch. zák.

Až do úplného zaplacení zůstává předmět dodávky výhradním vlastnictvím dodavatele. Uvedené ceny stanoveny dohodou.

Vážení zákazníci, toto je originál naší faktury. Neobsahuje razítko a podpis. Dle Zákona o DPH č.235/2004 §28 to nejsou povinné údaje.

MADRA.cz s.r.o. tel.+420-315722002, 315722457 fax.

Zapsána v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 312657

Vystavil(a) Jana Tallerová





5.1 Kalkulace napojení potrubí přebytečného kalu DN150

1	Přímý materiál												1938
2	Mzdy												1530
3	Odvody												536
4	Stroje												
5	Ostatní přímé náklady								300km	12 Kč/Km			3600
6	Přímé zpracovací náklady												5666
	Přímé náklady												7604
7	Režie výrobní												2776
8	Režie správní												1530
	Nepřímé náklady												4306
	Náklady celkem												11909
9	Zisk												299
10	Nekalkulované náklady												
	Jednotková cena celkem												12208

Faktrura MADRA 4.7.2022

nákladový soupis prací, materiálu

IS č.79 - Kalkulační sazby (montáž 2x510 Kč)

mapy.cz Soběslav-Pardubice a zpět

Poz.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
Nové napojení ocelového potrubí DN 150 přebytkého kalu z 1° biologického čištění					
1.	Trubka bezešvá 159 4,5 mm; ocel tř.11353	m	0,25	1 135 Kč	284 Kč
2.	Příruba přivařovací EN1092-1/01/S1 P250GH PN16 DN150/159	ks	1,0	654 Kč	654 Kč
3.	Demontáž stávajícího napojení, příprava a vybroušení svářecího místa; svářecí práce elektrodou, manipulace na pozici, natěračské práce	hod.	3,0	510 Kč	1 530 Kč
4.	brusné kotouče 125mm, svářecí elektrody Ok 3,2mm.	kpl	1,0	1 000 Kč	1 000 Kč
Celková cena bez DPH					3 468 Kč

Pozn.

Práce provedena

Nákladové položky

Vypracoval: Zíka P.

Datum: 13.11.2022

5.2 Kalkulace výměny vodárenského šoupěte

1	Přímý materiál												7464
2	Mzdy												1020
3	Odvozy												357
4	Stroje												
5	Ostatní přímé náklady							300km	12 Kč/Km				3600
6	Přímé zpracovací náklady												4977
	Přímé náklady												12441
7	Režie výrobní												2438,73
8	Režie správní												1343,79
	Nepřímé náklady												3782,52
	Náklady celkem												16223,52
9	Zisk												262,7856
10	Nekalkulované náklady												
	Jednotková cena celkem												16486,31

nákladový soupis prací, materiálu

IS č.79 - Kalkulační sazby (montáž 2x510 Kč)

mapy.cz Soběslav-Pardubice a zpět

Poz.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
Výměna nového vodárenského ručního šoupátka za stávajícího; trasa stávajících čerpadel přebytečného kalu z 1° Biologického Čištění					
1.	Šoupě přírubové AVK DN150/PN16 s kolem; sklad. pol. SAP M10536000150R	ks	1,0	7 464 Kč	7 464 Kč
2.	Demontáž stávajícího nefunkčního šoupátka DN 150; výměna gumového těsnění a opětovná montáž do trubního rozvodu. Použito již	hod	2,0	510 Kč	1 020 Kč
Celková cena bez DPH					8 484 Kč


Pozn.

Platnost nabídky do konce roku 2022

Vypracoval: Zíka P.

Datum: 13.11.2022



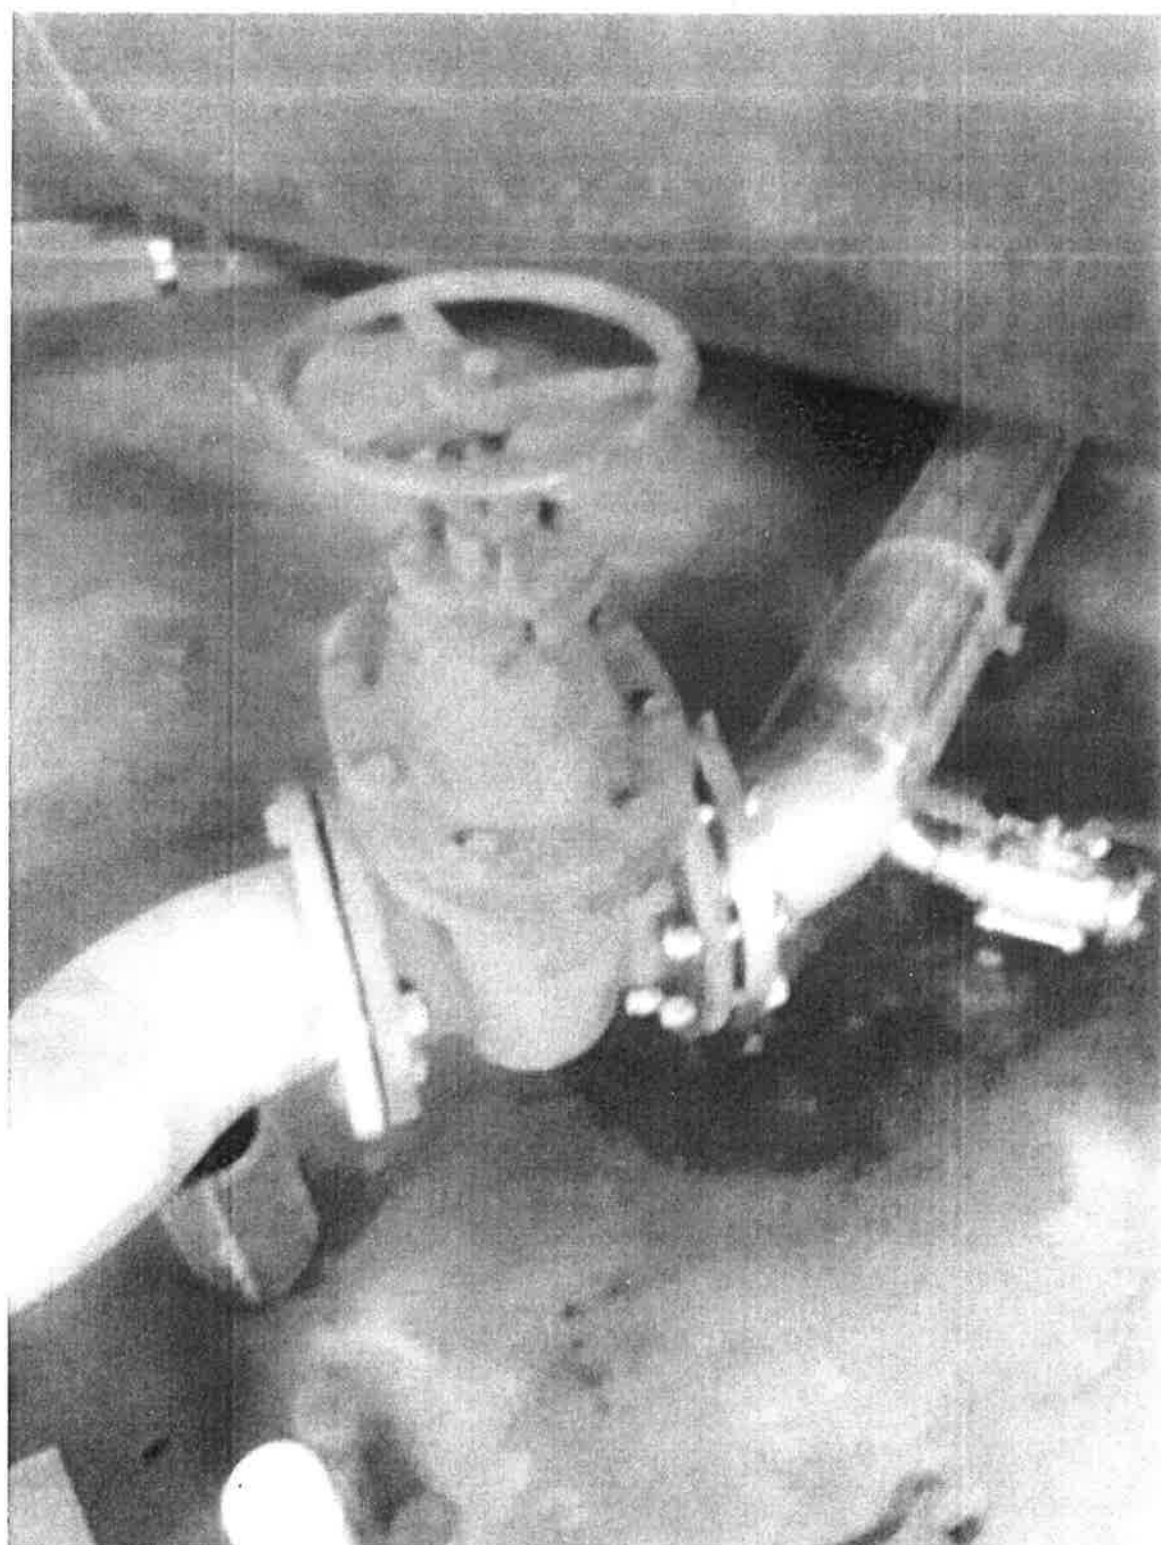



66810



FAKTURA

Daňový doklad

1201300

DODAVATEL IČ 08084572 DIČ CZ08084572 MADRA.cz s.r.o. Lannova 2061/8 110 00 Praha 1	Konst.symb. 8 Var.symbol = EČDD : 1201300 Objednávka 70220715 Zakázka Dod. l. č.:01-2-2461	Ev.číslo 01-2-0001300
--	---	-----------------------

Peněžní ústav Československá obchodní banka, III Uhradte na číslo účtu IIIBIC (SWIFT): CEKOCZPP 288089947/0300 BLZ: Číslo účtu dle měny : CZK 288089947/0300 IBAN CZ24 0300 0000 0002 8808 9947 EUR 288812269/0300 IBAN CZ53 0300 0000 0002 8881 2269 USD 288863162/0300 IBAN CZ44 0300 0000 0002 8886 3162	ODBĚRATEL IČ 25166077 (00) DIČ CZ25166077 ENVI-PUR, s.r.o. Na Vičovce 13/4 160 00 Praha 6 Česká republika	ENVI-PUR, s.r.o. 18 -07- 20:2 PŘIJATO
---	--	---

PŘÍJEMCE ENVI-PUR, s.r.o. Na Vičovce 13/4 160 00 Praha 6	Den splatnosti 25.07.2022 Datum DPH 04.07.2022 Den vystavení 04.07.2022 Forma úhrady Př. k úhr. Kód operace N - tuzemsko, reverse Povaha transakce 90 Dodací podmínky
--	--

Druh dopravy: Top Trans

	název	množství	mj	cena za mj	DPH celkem bez DPH
1	příruba plochá EN1092-1/01-B1 P250GH PN 10 DN 200	3,000	ks	799,00	-- 2 397,00
2	příruba plochá EN1092-1/01/B1 P250GH PN16 DN150/159	2,000	ks	654,00	-- 1 308,00
3	příruba plochá EN1092-1/01/B1 P250GH PN10 DN500/508	2,000	ks	3 660,00	-- 7 320,00
4	Příruba zaslepovací EN1092-1/05/B1 DN1000 PN10 mat.S235	1,000	ks	66 300,00	-- 66 300,00
5	Příruba zaslepovací EN1092-1/05/B1 DN500 PN10 mat.S235	1,000	ks	10 415,00	-- 10 415,00
6	Příruba plochá EN1092-1/01/B1 DN1000/1016 PN10 mat.S235	1,000	ks	12 480,00	-- 12 480,00
7	trubka bezešvá pr. 159 x 4,5 11 353	1,120	m	1 135,00	-- 1 271,20
8	Trubka bzš. pr.508 x 11mm S235JRH	1,010	m	9 240,00	-- 9 332,40
9	pálení	1,000	--	900,00	-- 900,00
10	oblouk EN10253-1-A 90st.3D S235 159 x 4,5	1,000	ks	590,00	-- 590,00
11	oblouk EN10253-1-A 90st. 3D 219,1 x 6,3 S235	1,000	ks	1 310,00	-- 1 310,00
12	paleta dřevěná obyc- nevratný obal	3,000	ks	180,00	-- 540,00
13	doprava TopTrans	1,000	--	4 767,00	-- 4 767,00

Fakturovaná částka podléhá režimu přenesení daň.povinnosti,viz zák.o DPH,č235/2004 Sb., (§92a-92e) a jste povinni doplnit výši daně a přiznat daň místně příslušnému FÚ = daň odvede zákazník podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona o DPH

V případě nedodržení lhůty splatnosti činí úrok 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení, dle § 369 obch. zák.
 Až do úplného zaplacení zůstává předmět dodávky výhradním vlastnictvím dodavatele. Uvedené ceny stanoveny dohodou.
 Vážení zákazníci, toto je originál naší faktury. Neobsahuje razítko a podpis. Dle Zákona o DPH č.235/2004 §28 to nejsou povinné údaje.
 MADRA.cz s.r.o. tel.+420-315722002, 315722457 fax.
 Zapsána v OR u Měst. soudu v Praze,oddíl C, vložka 312657

Vystavil(a) Jana Tallerová



FAKTURA

Daňový doklad

1201300

DODAVATEL IČ 08084572 DIČ CZ08084572
MADRA.cz s.r.o.

Lannova 2061/8
110 00 Praha 1

Peněžní ústav Československá obchodní banka,

!!! Uhradte na číslo účtu IIBIC (SWIFT): CEKOCZPP
288089947/0300 BLZ:

Číslo účtu dle měny :

CZK 288089947/0300 IBANCZ24 0300 0000 0002 8808 9947
EUR 288812269/0300 IBANCZ53 0300 0000 0002 8881 2269
USD 288863162/0300 IBANCZ44 0300 0000 0002 8886 3162

PŘIJEMCE

ENVI-PUR, s.r.o.

Na Vlčovce 13/4
160 00 Praha 6

Druh dopravy: Top Trans

název

množství mj cena za mj DPH celkem bez DPH

REKAPITULACE DPH	0%
Základ	118 930,60
Daň	0,00
CELKEM	118 930,60

hnotnosti celkem kg :

CELKEM

Zaokrouhlení 0,00

CZK 118 930,60



The realisation of the payment
of this invoice is monitored by
Payment Behavior Monitoring
of Czech and Slovak companies

www.bisnode.cz



Realizace platby této faktury
je sledována Monitorováním
platební chování českých
a slovenských firem.

www.bisnode.cz

Fakturovaná částka podléhá režimu přenesení daň.povinností,viz zák.o DPH,č235/2004 Sb., (§92a-92e) a
jste povinni doplnit výši daně a přiznat daň místně příslušnému FÚ = daň odvede zákazník podle § 29
odst. 2 písm. c) zákona o DPH

V případě nedodržení lhůty splatnosti činí úrok 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení, dle § 369 obch. zák.


Až do úplného zaplacení zůstává předmět dodávky výhradním vlastnictvím dodavatele. Uvedené ceny stanoveny dohodou.


Vážení zákazníci, toto je originál naší faktury. Neobsahuje razítko a podpis. Dle Zákona o DPH č.235/2004 §28 to nejsou povinné údaje.

MADRA.cz s.r.o. tel.+420-315722002, 315722457 fax.

Zapsána v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 312657

Vystavil(a) Jana Tallerová

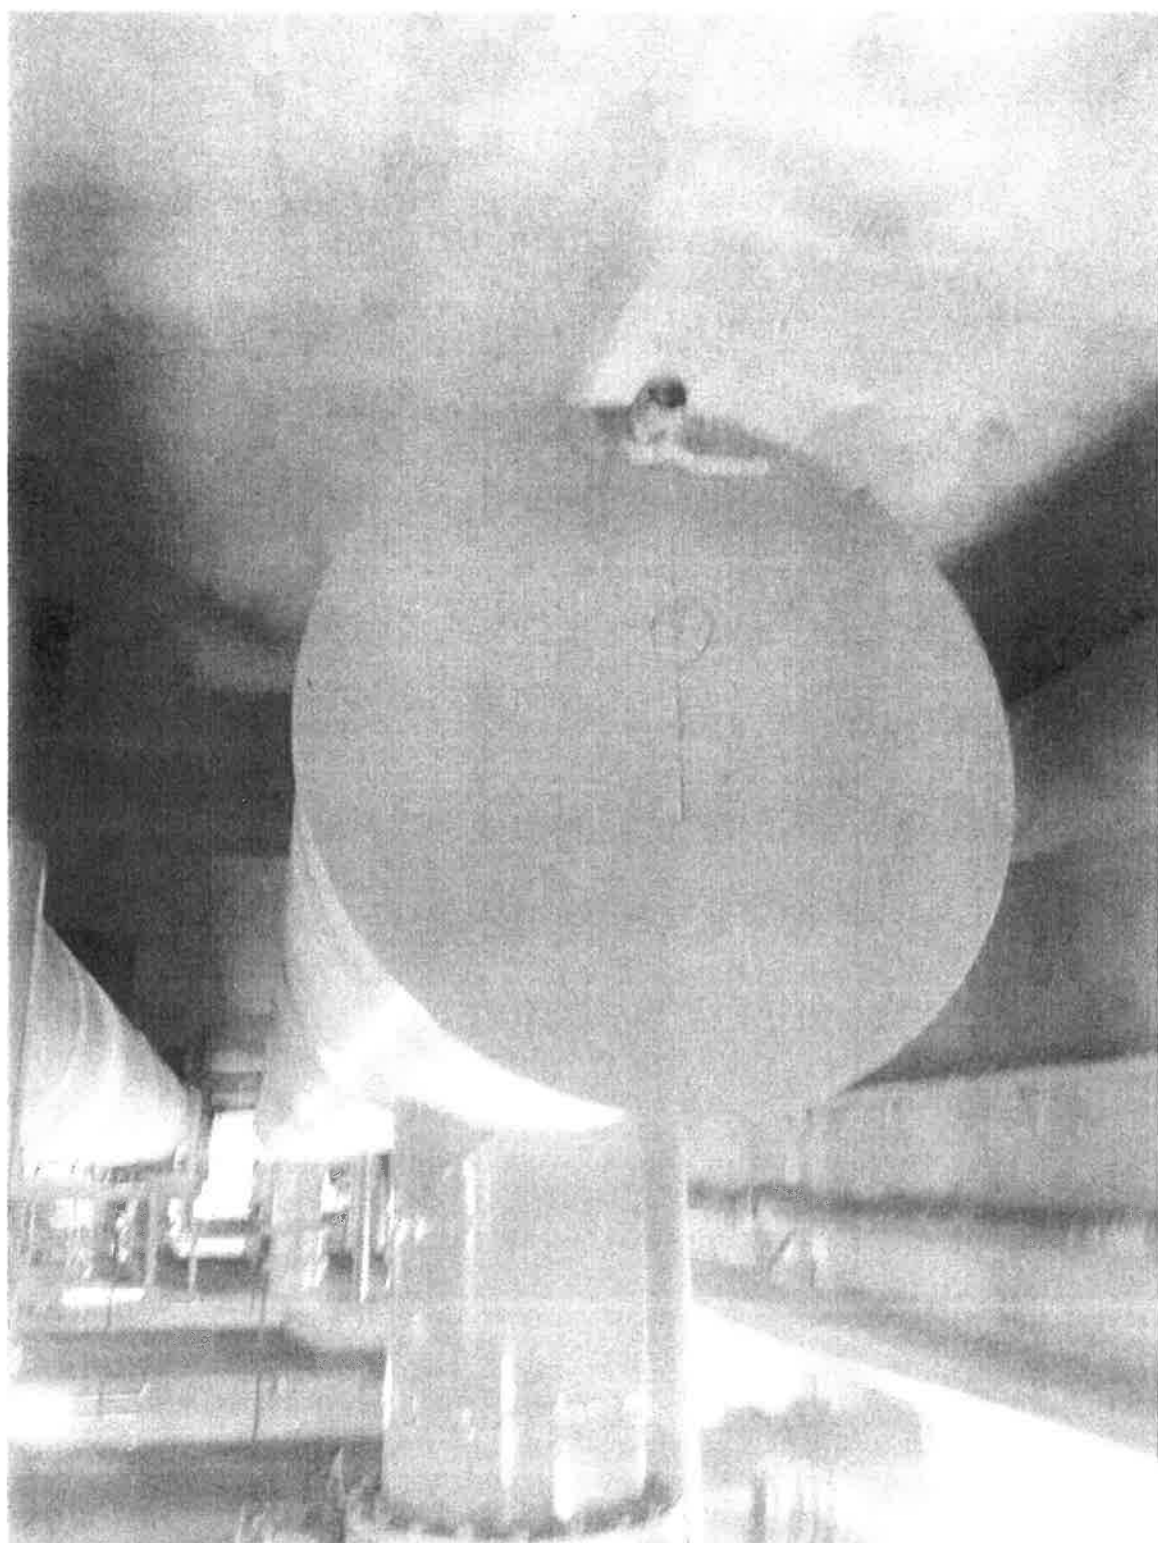

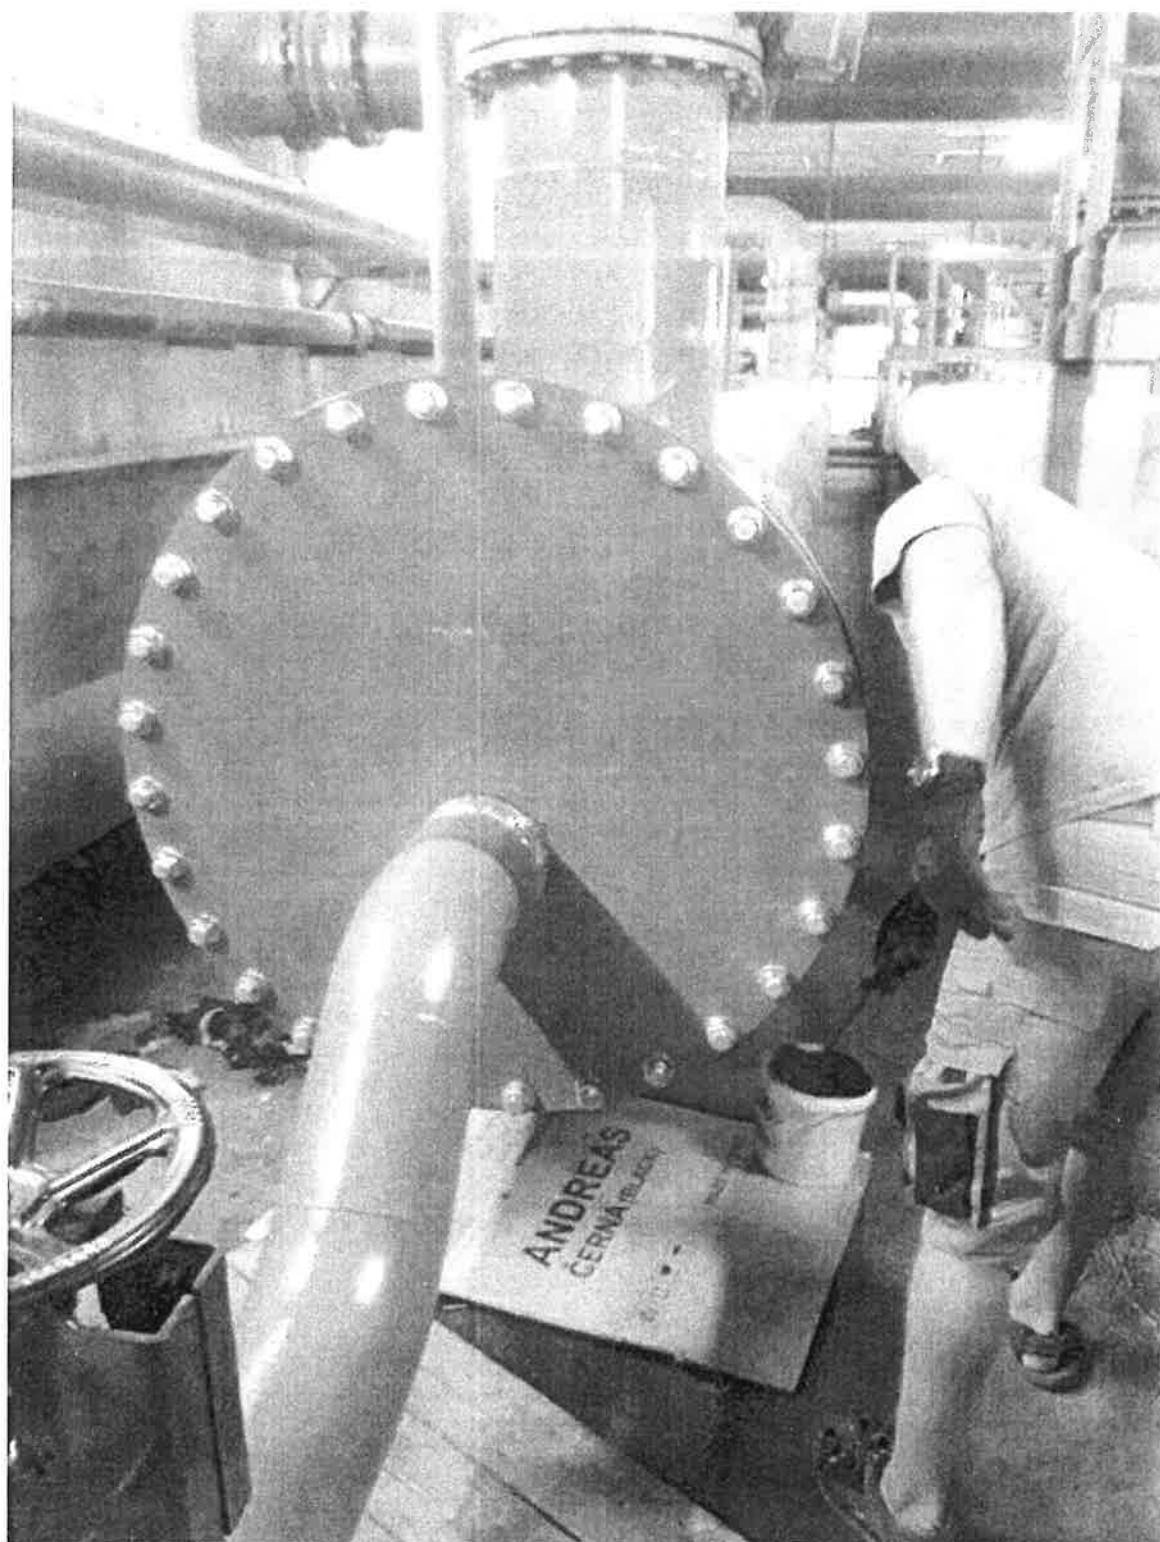

5.3 Zaslepovací příruba DN 1000

1	Přímý materiál												68790
2	Mzdy												10710
3	Odvody												3749
4	Stroje												
5	Ostatní přímé náklady								300km	12 Kč/Km			8547
6	Přímé zpracovací náklady												23006
	Přímé náklady												91796
7	Režie výrobní												11273
8	Režie správní												6211
	Nepřímé náklady												17484
	Náklady celkem												109280
9	Zisk												1215
10	Nekalkulované náklady												
	Jednotková cena celkem												110494

nákladový soupis prací (faktura MADRA)

nákladový soupis prací, materiálu

IS č.79 - Kalkulační sazby (montáž 2x510 Kč)

mapy.cz

Soběslav-Pardubice a zpět

plus

Toptrans - doprava mat. od distributora

Poz.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
	Zaslepovací příruby DN 1000, (DPS 02_pol. 2.6.2)				
3.	Příruba zaslepovací EN1092-1/05/S1 DN1000 PN10 mat.S235 - přípočet	ks	1,0	66 300 Kč	66 300 Kč
5.	Těsnění s ocelovou vložkou DN 1000mm G-ST, PN10; sklad. pol. SAP M109049001200 - přípočet	ks	1,0	2 490 Kč	2 490 Kč
7.	Po odříznutí stávajícího zaslepení potrubí DN 1000 mm, příprava a vybroušení svářecího místa; svářecí práce elektrodou, manipulace s přivařovací přírubou DN 1000 mm na pozici. - přípočet	hod.	10,0	510 Kč	5 100 Kč
9.	Montážní práce a manipulace se zaslepovací přírubou DN 1000 mm s gumovým těsněním DN 1000mm a spoj. mat. na pozici. - přípočet	hod.	4,0	510 Kč	2 040 Kč
10.	Montážní práce a manipulace se zaslepovací přírubou DN 800 mm s gumovým těsněním DN 800mm a spoj. mat. na pozici. - přípočet	hod.	2,0	510 Kč	1 020 Kč
11.	Mechanické očištění a odmaštění místa navaření příruby DN 1000 mm se zaslepovací přírubou DN 1000mm; základní nátěr + vrchní nátěr napojovaného místa a ocelových přírub, včetně mat. - přípočet	hod.	5,0	510 Kč	2 550 Kč
	Celková cena bez DPH				79 500 Kč

Přípočet materiál náklad celkem

68 790 Kč

Přípočet práce

10 710 Kč

Celkem přípočty

79 500 Kč

Pozn.

Spojovací mat. jsem při tvorbě VP neuvažoval, zanedbávající navýšení

Práce provedena

Vypracoval: Zíka P.

Datum: 13.11.2022

66810



FAKTURA

Daňový doklad

1201300

DODAVATEL IČ 08084572 DIČ CZ08084572

MADRA.cz s.r.o.

Lannova 2061/8

110 00 Praha 1

Peněžní ústav Československá obchodní banka,

III Uhrad'te na číslo účtu IIBIC (SWIFT): CEKOCZPP

288089947/0300

BLZ:

Číslo účtu dle měny :

CZK 288089947/0300 IBAN CZ24 0300 0000 0002 8808 9947

EUR 288812269/0300 IBAN CZ53 0300 0000 0002 8881 2269

USD 288863162/0300 IBAN CZ44 0300 0000 0002 8886 3162

PŘÍJEMCE

ENVI-PUR, s.r.o.

Na Vlčovce 13/4

160 00 Praha 6

Druh dopravy: Top Trans

název

množství mj cena za mj DPH celkem bez DPH

1	příruba plochá EN1092-1/01-B1 P250GH PN 10 DN 200	3,000	ks	799,00	--	2 397,00
2	příruba plochá EN1092-1/01/B1 P250GH PN16 DN150/159	2,000	ks	654,00	--	1 308,00
3	příruba plochá EN1092-1/01/B1 P250GH PN10 DN500/508	2,000	ks	3 660,00	--	7 320,00
4	Příruba zaslepovací EN1092-1/05/B1 DN1000 PN10 mat.S235	1,000	ks	66 300,00	--	66 300,00
5	Příruba zaslepovací EN1092-1/05/B1 DN500 PN10 mat.S235	1,000	ks	10 415,00	--	10 415,00
6	Příruba plochá EN1092-1/01/B1 DN1000/1016 PN10 mat.S235	1,000	ks	12 480,00	--	12 480,00
7	trubka bezešvá pr. 159 x 4,5 11 353	1,120	m	1 135,00	--	1 271,20
8	Trubka bzš. pr.508 x 11mm S235JRH	1,010	m	9 240,00	--	9 332,40
9	pálení	1,000	--	900,00	--	900,00
10	oblouk EN10253-1-A 90st.3D S235 159 x 4,5	1,000	ks	590,00	--	590,00
11	oblouk EN10253-1-A 90st. 3D 219,1 x 6,3 S235	1,000	ks	1 310,00	--	1 310,00
12	paleta dřevěná obyc- nevratný obal	3,000	ks	180,00	--	540,00
13	doprava TopTrans	1,000	--	4 767,00	--	4 767,00

Konst.symb. 8

Ev číslo 01-2-0001300

Var.symbol = EČDD : 1201300

Objednávka 70220715

Zakázka

Dod. l. č.:01-2-2461

ODBĚRATEL IČ 25166077 (00) DIČ CZ25166077

ENVI-PUR, s.r.o.

ENVI-PUR, s.r.o.

Na Vlčovce 13/4

160 00 Praha 6

Česká republika

18-07-2022

PŘIJATO

Den splatnosti 25.07.2022

Datum DPH 04.07.2022

Den vystavení 04.07.2022

Forma úhrady Př. k úhr.

Kód operace N - luzemsko, reverse

Povaha transakce 90

Dodací podmínky

Fakturovaná částka podléhá režimu přenesení daň.povinnosti,viz zák.o DPH,č235/2004 Sb., (§92a-92e) a jste povinni doplnit výši daně a přiznat daň místně příslušnému FÚ = daň odvede zákazník podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona o DPH

V případě nedodržení lhůty splatnosti činí úrok 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení, dle § 369 obch. zák

Až do úplného zaplacení zůstává předmět dodávky výhradním vlastnictvím dodavatele. Uvedené ceny stanoveny dohodou.

Vážení zákazníci, toto je originál naší faktury. Neobsahuje razítko a podpis. Dle Zákona o DPH č.235/2004 §28 to nejsou povinné údaje.

MADRA.cz s.r.o. tel.+420-315722002, 315722457 fax.

Zapsána v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 312657

Vystavil(a) Jana Tallerová

Strana 1



FAKTURA

Daňový doklad

1201300

DODAVATEL IČ 08084572 DIČ CZ08084572
MADRA.cz s.r.o.

Lannova 2061/8
110 00 Praha 1

Peněžní ústav Československá obchodní banka,

!!! Uhradte na číslo účtu IIBIC (SWIFT): CEKOCZPP
288089947/0300 BLZ:

Číslo účtu dle měny :

CZK 288089947/0300 IBANCZ24 0300 0000 0002 8808 9947

EUR 288812269/0300 IBANCZ53 0300 0000 0002 8881 2269

USD 288863162/0300 IBANCZ44 0300 0000 0002 8886 3162

PŘIJEMCE

ENVI-PUR, s.r.o.

Na Vlčovce 13/4
160 00 Praha 6

Druh dopravy: Top Trans

název

REKAPITULACE DPH 0%

Základ 118 930,60

Daň 0,00

CELKEM 118 930,60

hmotnost celkem kg :

Konst.symb. 8

Ev.číslo 01-2-0001300

Var.symbol = EČDD : 1201300

Objednávka 70220715

Zakázka

Dod. l. č.:01-2-2461

ODBĚRATEL IČ 25166077 DIČ CZ25166077

ENVI-PUR, s.r.o.

Na Vlčovce 13/4

160 00 Praha 6

Česká republika

Den splatnosti 25.07.2022

Datum DPH 04.07.2022

Den vystavení 04.07.2022

Forma úhrady Př. k úhr.

Kód operace N - tuzemsko, reverse

Povaha transakce 90

Dodací podmínky

množství mj cena za mj DPH celkem bez DPH

CELKEM

Zaokrouhlení 0,00

CZK 118 930,60



The realisation of the payment
of this invoice is monitored by
Payment Behavior Monitoring
of Czech and Slovak companies.

www.bisnode.cz



Realizace pláby této faktury
je sledována Monitorínem
platební kázně českých
a slovenských firem.

www.bisnode.cz

Fakturovaná částka podléhá režimu přenesení daň.povinnosti,viz zák.o DPH,č235/2004 Sb., (§92a-92e) a
jste povinni doplnit výši daně a přiznat daň místně příslušnému FÚ = daň odvede zákazník podle § 29
odst. 2 písm. c) zákona o DPH

V případě nedodržení lhůty splatnosti činí úrok 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení, dle § 369 obch. zák.

Až do úplného zaplacení zůstává předmět dodávky výhradním vlastnictvím dodavatele. Uvedené ceny stanoveny dohodou.

Vážení zákazníci, toto je originál naší faktury. Neobsahuje razítko a podpis. Dle Zákona o DPH č.235/2004 §28 to nejsou povinné údaje.

MADRA.cz s.r.o. tel.+420-315722002, 315722457 fax.

Zapsána v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 312657

Vystavil(a) Jana Tallerová

5.4_demotáž servoklapek

1	Přímý materiál													25578
2	Mzdy													5100
3	Odvody													1785
4	Stroje													
5	Ostatní přímé náklady							300km	12 Kč/Km					3600
6	Přímé zpracovací náklady													10485
	Přímé náklady													36063
7	Režie výrobní													5138
8	Režie správní													2831
	Nepřímé náklady													7969
	Náklady celkem													44032
9	Zisk													554
10	Nekalkulované náklady													
	Jednotková cena celkem													44585

nákladový soupis prací (faktura

nákladový soupis prací, materiálu

IS č.79 - Kalkulační sazby (montáž 2x510 Kč)

mapy.cz Soběslav-Pardubice a zpět

Poz.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
	Demontáž stávajících servoklapek a uzavření zaslepovací přírubou DN 500				
1.	Příruba zaslepovací EN1092-1 /05/S 1 DN500 PN 1 O mat.S235	ks	2,0	10 415 Kč	20 830 Kč
2.	Těsnění s ocelovou vložkou DN 500mm G-ST, PN10; sklad. pol. SAP M109049000500	ks	2,0	774 Kč	1 548 Kč
3.	Šroub A2; M24x120; sklad. pol. SAP M1040210241203	ks	40,0	55 Kč	2 200 Kč
4.	Matice A2; M24; sklad. pol. SAP M104031000024	ks	40,0	17 Kč	680 Kč
5.	Podložka 25mm; A2; sklad. pol. SAP M104041000025	ks	80,0	4 Kč	320 Kč
6.	Demontáž 2 kpl. stávajících servoklapek DN 500mm, přemístění z kolektoru k místu pro odvoz a montážní práce na uzavření 2 kpl. zaslepovacích přírub DN 500, včetně přírubových spojů a nátěrů.	hod.	10,0	510 Kč	5 100 Kč
	Celková cena bez DPH				30 678 Kč

Přípočty materiál	25 578 Kč
Přípočty práce	5 100 Kč
Celkem přípočty	30 678 Kč


Pozn.


Práce zatím neprovedena, nutno odsouhlasit TDI a provozem.


Platnost nabídky do konce roku 2022


Vypracoval: Zíka P.

Datum: 13.11.2022

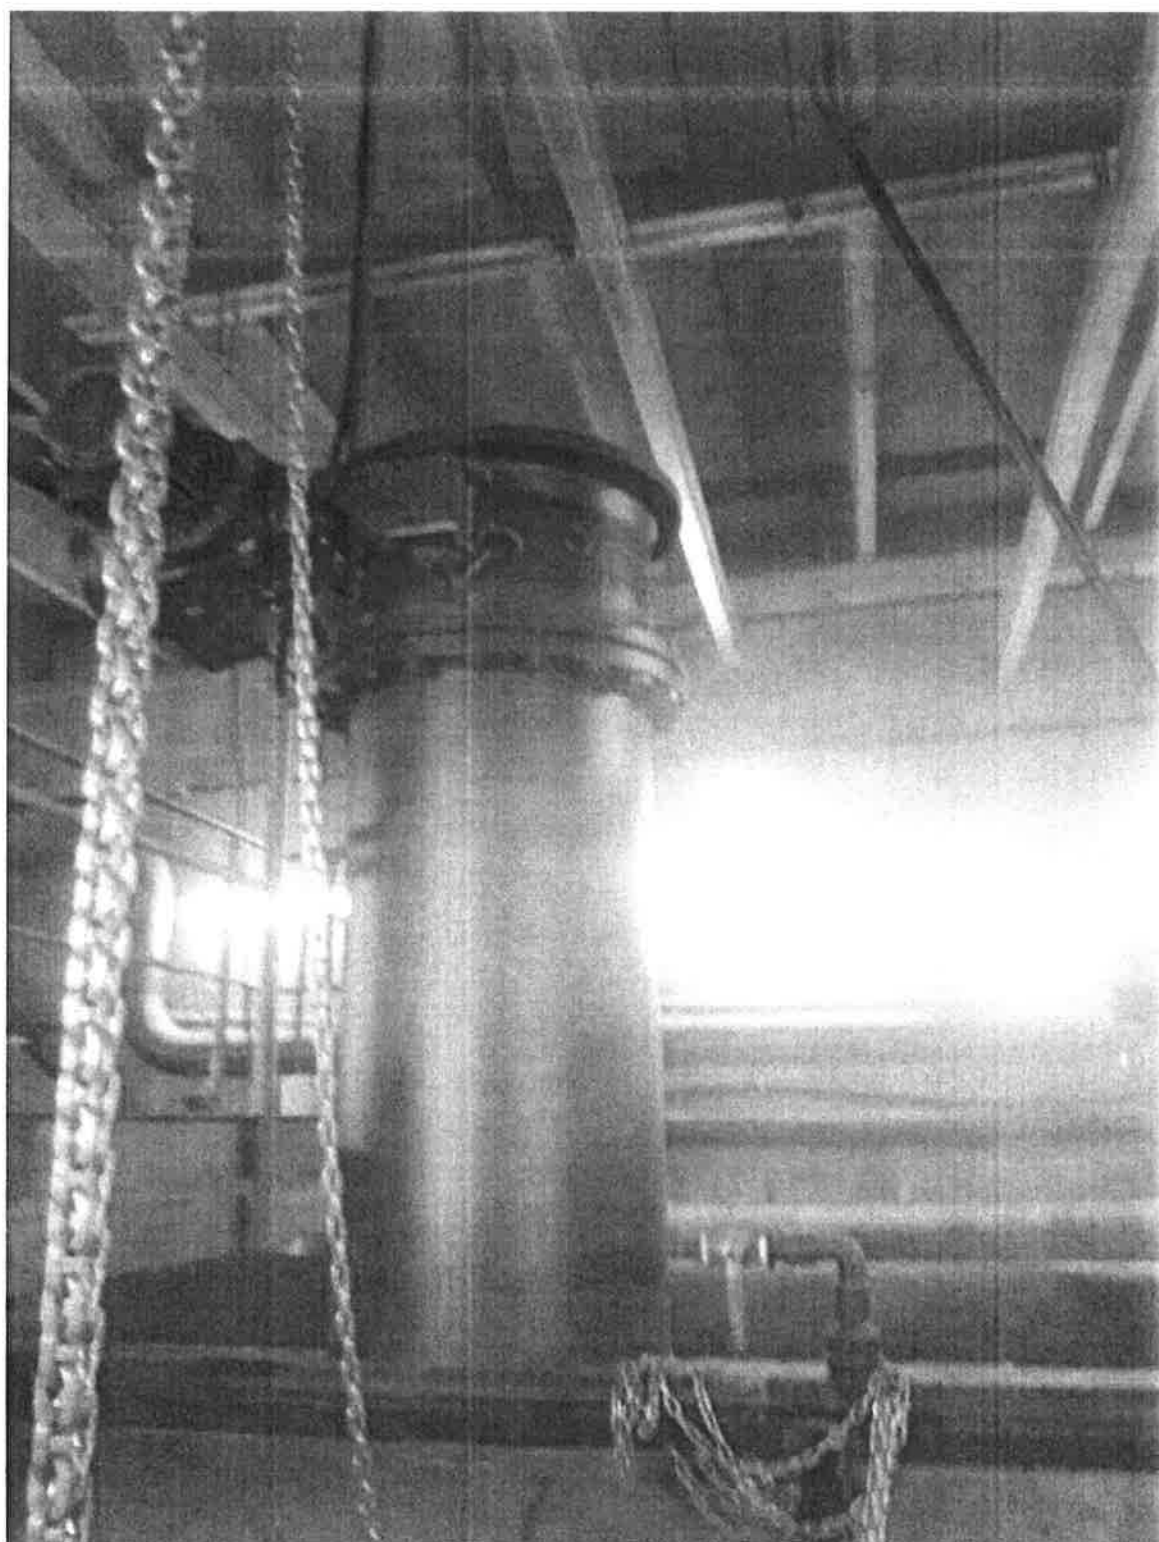

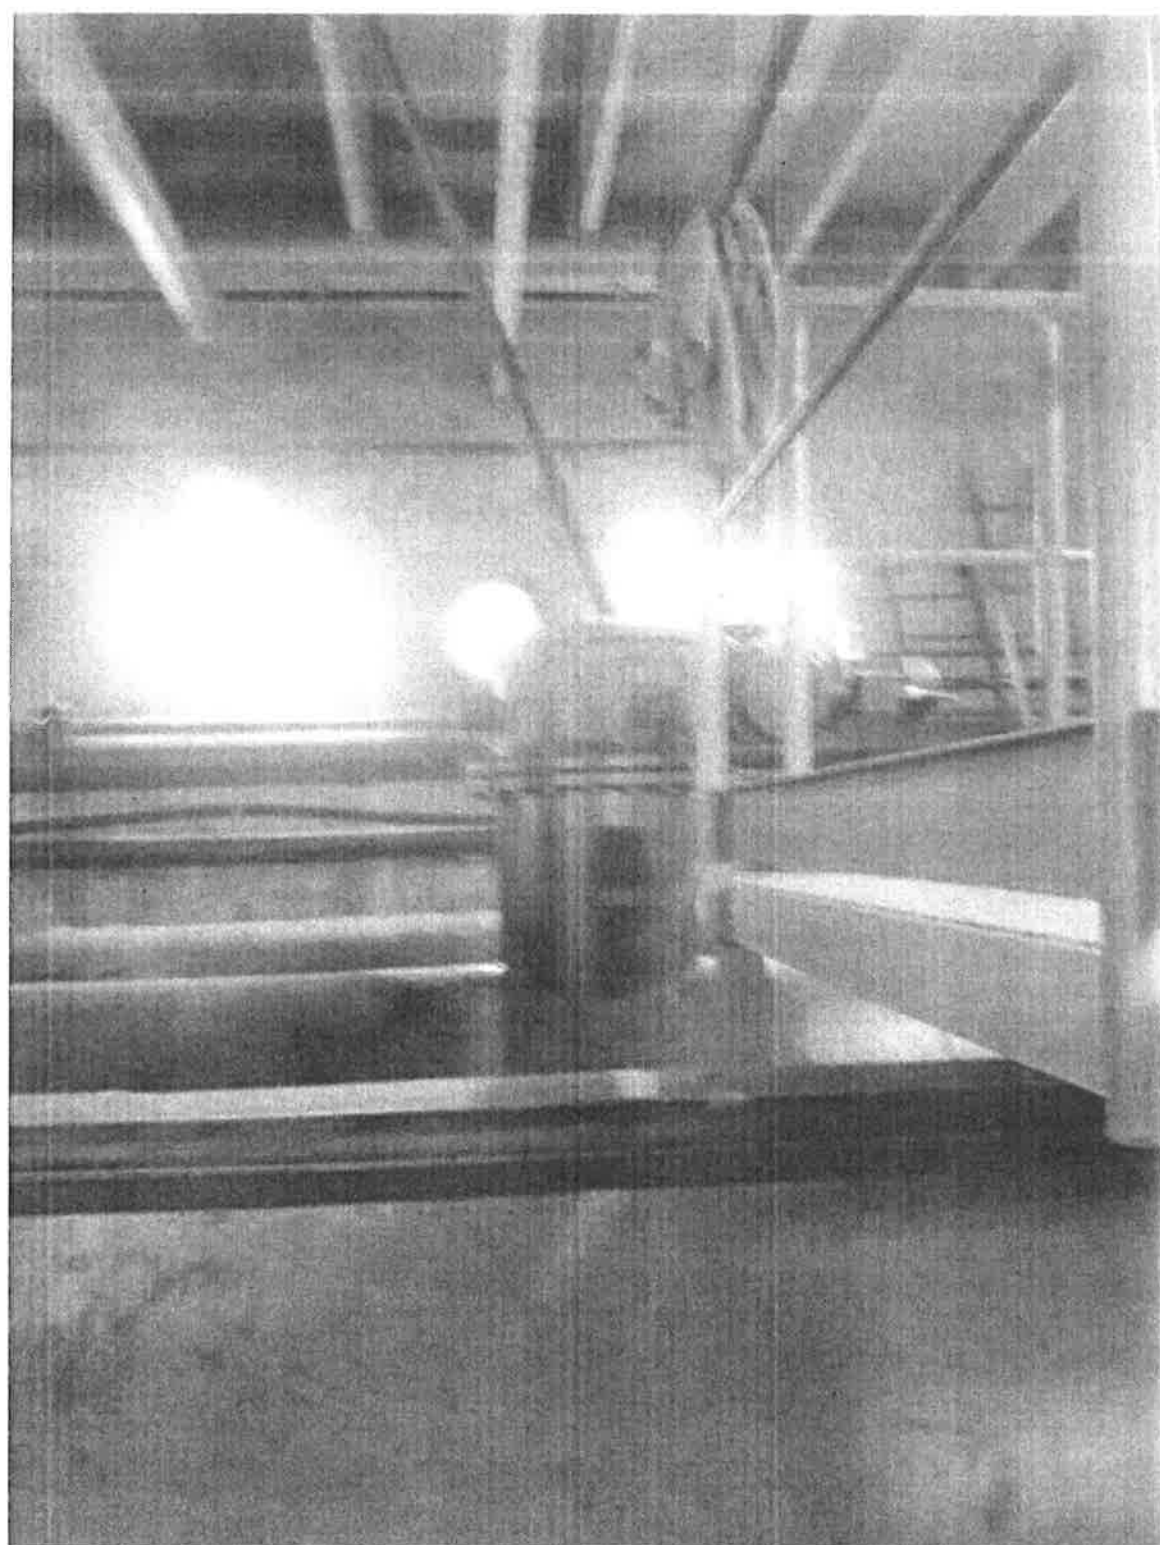

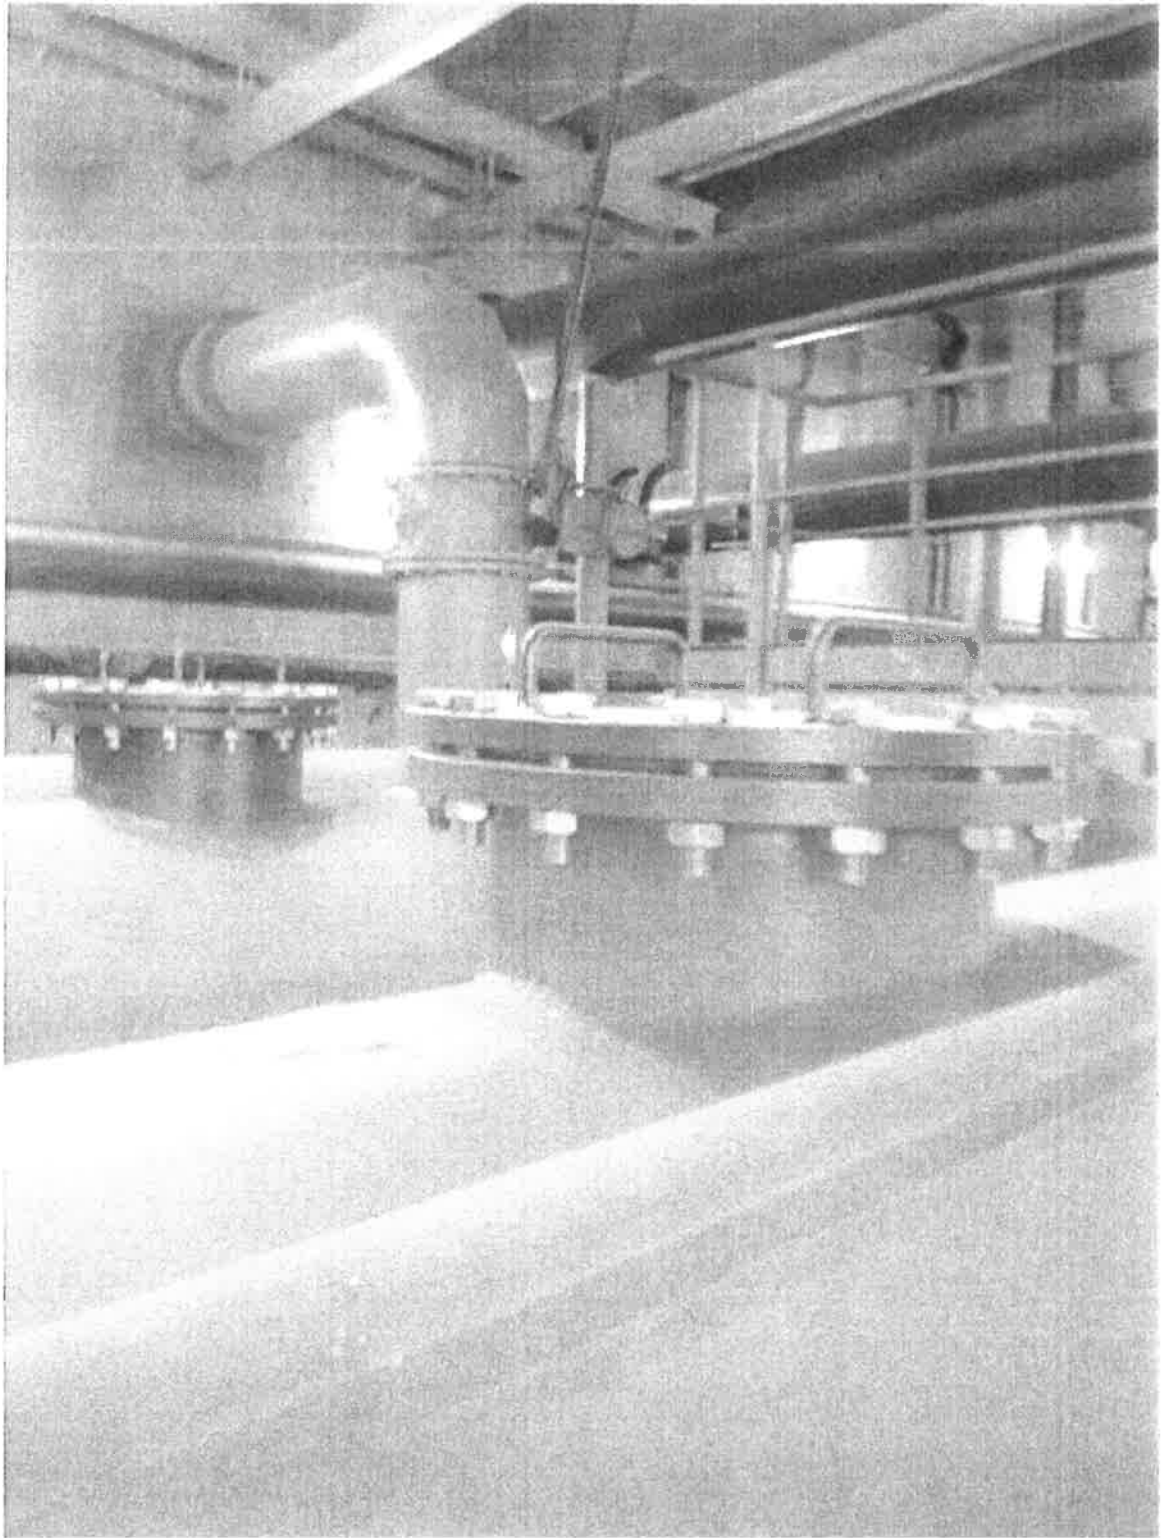

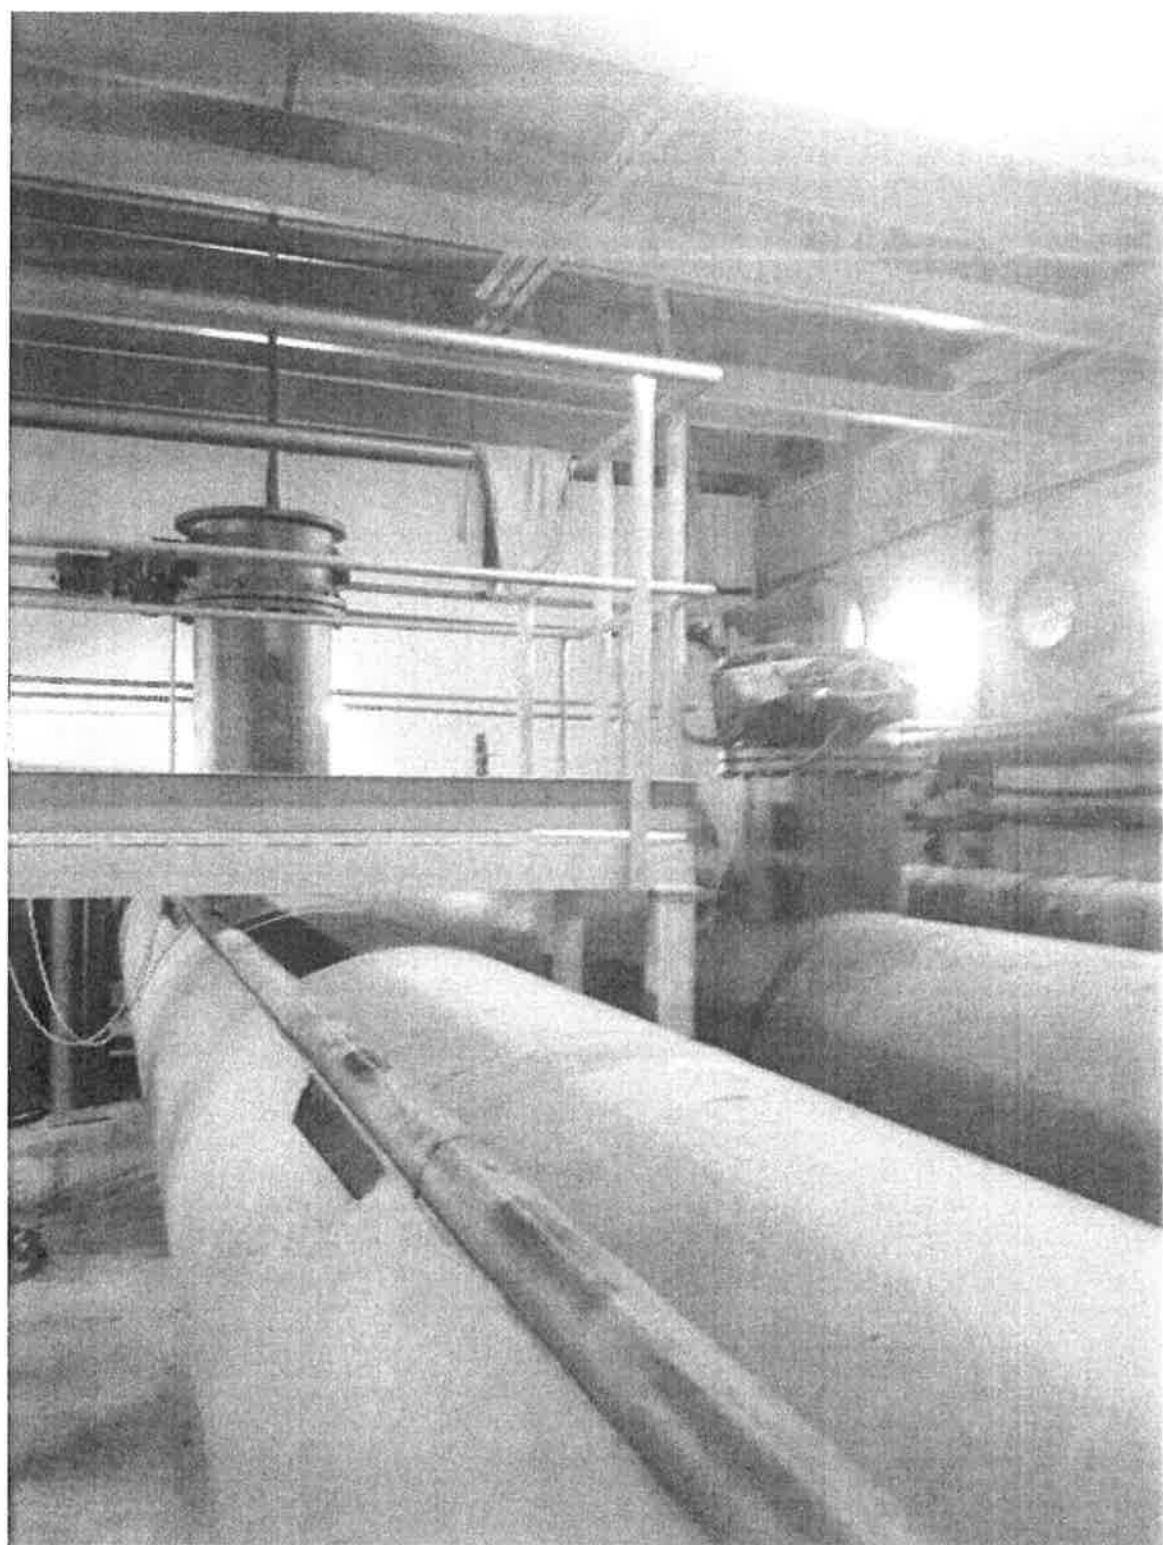

6_Spojky, armatury

	1	Kompenzátor pryžový DN 250, EPDM, pevné příruby		viz položka SOD 2.9.10	D+M	1	32270		32270
	2	Spojka potrubní UNI GRIP,Pn 16, nerez , s jištěním			D+M	12	3620		43440
		Celkem							75710



Zápis z 24. kontrolního dne stavby :

BČOV Rybitví – záměr D 07, příjem dovážených odpadů

Přítomní dle prezenční listiny:

22.02.2023


Č.	Jméno a příjmení	Společnost	Email/tel.	Podpis
1	Oldřich Vodička	VAK, a. s.	oldrich.vodicka@vakpce.cz 724 037 034	
2	Jiří Ježek	VAK, a. s.	jiri.jezek@vakpce.cz 775887561	
3	Miroslav Tománek	VAK, a. s.	miroslav.tomanek@vakpce.cz 724 306 174	
4	Milan Fichtner	VAK, a.s.	milan.fichtner@vakpce.cz 724 279 430	
5	Petr Dinuš	VAK, a.s.	petr.dinus@vakpce.cz 602 654 138	
6	Jiří Halíř	VAK, a.s.		
7	Pavel Zíka	ENVI-PUR s.r.o.	zika@envi-pur.cz 737240 821	
8	Julius Juhas	ENVI-PUR s.r.o.	julius.juhas@hotmail.com 732 191 394	
9	Petr Hromádko	SUMO, s.r.o.	petr.hromadko@sumo.team 770174150	
10	Martin Čáp	ČÁP CZ s.r.o.	info@martincap.cz 603593891	
11	Miloš Kočárník	ENVI-PUR s.r.o.	kocarnik@envi-pur.cz 731629782	

Na jednání bylo dohodnuto (tučně nové):

- další KD se bude konat dne 01.03.2023 v 11:00.
- sanované zhlaví mezi nádržemi AN13 a 12 odpadáva na původní konstrukci, dodavatel předloží návrh opravy s ohledem na již provedené konstrukce a s ohledem na počínající montáž zastřešení
- připravené svody potrubí stlačeného vzduchu vykazují oxidaci materiálů v okolí svarů, dále černé body v těle svaru, na již hotovém vedení vzduchu jsou velká množství přitavených částic cizorodého materiálu (zřejmě po řezání zábradlí). Byla provedena kapilární zkouška, která neprokázala nehomogenitu spoje. Dodavatel navrhne způsob sanace zoxidovaných částí



- byl schválen způsob přípravy podkladu čerpacích jímek, úprava žebříků přístupových lávek, způsob kotvení ovládacích mechanismů skrze pochůzné rošty (vč. příčné podpěry a úpravy roštů dle konkrétního ovládacího provku),
- dodavatel odevzdá originál stavebního deníku, 2 kopie archivuje pro kolaudaci a své použití - **trvá**
- provozovatel stavby navrhuje včlenění kompenzátoru na potrubní vedení stlačeného vzduchu v blízkosti materiálového přechodu sklolaminát x nerez, dodavatel stavby předloží cenovou nabídku – **schváleno dle kalkulace a nabídky z 15.2. (kompenzátor DN 250, EPDM viz SOD pol. 2.9.1 D+M 32270,- Kč bez DPH)**



- vzhledem k nerozebíratelnosti potrubí svodů stlačeného vzduchu a tím k nemožnosti demontáže zastřešení předloží dodavatel nabídku na včlenění rozebíratelného spoje STRAUB, tento spoj by byl proveden na 12-ti ks potrubí – **schváleno dle kalkulace a nabídky z 15.2. (spojka potrubní UNI GRIP, PN 16, nerez s jištěním, 12 ks, 3620,- Kč bez DPH za 1 ks D+M)**
- Z důvodu probíhající reklamace nesmí být zasahováno do kompozitních roštů lávky. Po předložení návrhu řešení (výpočet těsnosti, potvrzení výrobce o způsobu technického

řešení) a změnového listu bude schválen dodatek, kde bude uveden závazek prodloužení záruční doby na tuto dodávku a montáž. – **trvá , bude předložen dodatek**

- Objednatel stavby sestaví algoritmus řízení realizované technologie stavby. V algoritmu bude zohledněna potřeba řízení během další etapy stavby, která bude probíhat za provozu již dokončené části. - **trvá**
- Objednatel zajistí součinnost dodavatele zařízení fotokatalytické oxidace při jeho uvedení do provozu a napojení na aktuálně realizovanou stavbu. Byl předán kontakt pro koordinaci a provedení komplexních zkoušek. – **probíhá koordinace dodávky, vznik víceprací na el. propojení a zprovoznění**
- Provozovatel sdělí, zda je nutné, aby sondy O₂, PH, N fungovaly v celém rozsahu hladin 0,5 až 5 m. Pokud ano, tak zda mohou být pod úrovní 0,5 m. Pokud ne, tak v jaké úrovni hladiny mohou být umístěny - **trvá**
- Dodavatel stavby předloží výrobní dokumentaci technického řešení umístění sond O₂, PH, N - **trvá, probíhá návrh technického řešení (sonda N, vyžaduje konstantní hloubku zanoření i při pohybu hladin), (sondy O₂, PH musí být dle dodavatele trvale pod minimální hladinou manipulačního objemu)**
- Dodavatel stavby předloží výrobní výkres řešení jednotlivých prostupů zastřešením. Jako příloha byl poskytnut soutisk s uvedením potencionálních míst kolizí – **splněno dodavatel upraví svody dle konkrétních kolizních míst - prostupy svodů vzduchu u střešních segmentů 25, 24 (je ve spoji), 16, 17, 26, (je v hraně v těsné blízkosti spoje). Odtah vzdušiny nádrže AN 13.1 vychází do spoje střešního segmentu 21.**
- Dodavatel stavby potvrdí sanaci dilatačních spár dna v nádrži AN 13 (položka rozpočtu č. 21, SO 04 – zřejmě nebyla provedena z důvodu zaplavení dna), v případě neprovedení nesmí pokračující práce znemožnit její následnou sanaci (aerační elementy, čerpací jímky a kolena) – **trvá nebudou montovány aerační elementy**
- dle požadavku PD musí celková koncepce lávky, zastřešení, technologií a sanací splňovat požadavek na těsnost (viz zápis níže - 0,6 m² náhradní otvor na dvě nádrže) - **trvá**
- Kompozitní rošty lávky mezi nádržemi AN 13 a 14 budou na požadavek provozovatele ponechány stávající - **trvá**
- TDI bude přizván ke kontrolním zkouškám provedených konstrukcí (sanace, ŽB kce.), na příštím KD budou předloženy stavební deníky subdodavatelů a vyplněný KZP - **trvá**



- dodavatel stavby zajistí příslušnou antikorozi ochranu ocelových konstrukcí předepsanou v PD, bude doloženo prohlášením dodavatele nátěrů s uvedením druhu nátěrů a jejich tloušťky - **trvá**

Povrchové úpravy konstrukcí

- Každá povrchová úprava musí být dále prováděna v souladu s návodem k použití od výrobce nebo dodavatele (např. základní nátěr, teplota, příprava povrchu). Protikorozi ochrana ocelových konstrukcí bude vycházet ze stanovení prostředí dle příslušné normy a požadavků na životnost povrchových úprav.
- Nátěry ocelových konstrukcí budou provedeny dle ČSN EN ISO 12944-1 až 5: Nátěrové hmoty – Protikorozi ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. Dodržen musí být předepsaný způsob přípravy povrchu, způsob aplikace a nominální tloušťka v závislosti na typu nátěrové hmoty, při očekávané životnosti a stupni korozi agresivity prostředí. Vstupními požadavky jsou střední životnost nátěru (stupeň M, 5-15 let) a střední agresivita prostředí (stupeň C3), u ponořených či podzemních konstrukcí stupeň Im1 nebo Im3.
- Barevné řešení nátěrů musí odpovídat schválenému architektonickému řešení, provozním standardům areálu BCOV Pardubice a vzhledu stávajících objektů
- dodavatel stavby upozornil na otvor v přírodním žlabu, který bude rušit podtlak pod zastřešením – zajistí investor + AD – **trvá (bude řešeno normou stěnou pevně umístěnou ve žlabu, materiálové provedení bude upřesněno)**
- z důvodu předcházení rizikům je možné aktivní aeraci vypnout na dobu 8 hod za jeden pracovní den, maximálně dva dny po sobě - **trvá**
- montáž průtokoměrů bude provedena dle montážního návodu pro příslušný typ (uzemnění, těsnění...) – **trvá**
- veškeré podklady, návody, kalibrační listy, záruční listy a manuály k technologickým zařízením a strojům budou dodavatelem převzaty a archivovány v odděleném šanonu, budou předány na výzvu metrologa
- dodavatel stavby předloží ke kontrole stavební deníky subdodavatelů – **trvá**
- jižní zhlaví nádrže nebude používáno jako pochůzné, práce budou probíhat pouze z lešení - **trvá**
- DS upozorňuje na nutnost koordinace sanačních prací s konstrukcí zastřešení a s monolitickými konstrukcemi - **trvá**

SPLNĚNÉ ÚKOLY

- dodavatel stavby zašle koordinátorovi BOZP veškeré požadované dokumenty (seznam rizik, výrobní dokumentaci atd) - **splněno**
- **investor stavby** určí místo napojení splaškových vod produkovaných zařízením staveniště - **splněno**
- **dodavatel stavby** sdělí termín začátku provádění ŽB konstrukcí – **splněno 4.8.2022**

- TDI žádá o specifikaci nároků na těsnost zastřešení z důvodu správné funkčnosti fotokatalytické oxidace (stanovení náhradní plochy sacího otvoru?) – **splněno, celková netěsnost o ploše max 0,6 m²**
- dodavatelem stavby byla předložena a schválena výrobní dokumentace a technologické postupy ŽB. konstrukcí, sanací a ASŘ – jednotlivé připomínky byly konzultovány přímo při KD a budou doplněny do příštího KD – **zajistí dodavatel stavby - trvá termín odevzdání do 8.8.2022 – splněno odsouhlasena AD**
- **dodavatel stavby provede aktualizaci harmonogramu a finančního plánu stavby – trvá do 8.8.2022 – splněno (předáno k zhodnocení financování)**
- dodavatel stavby předloží výrobní dokumentaci pro monolitické betonové konstrukce a konstrukce zastřešení do 20.7.2022 a rozešle dle výše uvedeného adresáře – **trvá, bude doplněno řešení připomínek (kotvení sloupů a stěn, povrchová ochrana výztuže, hloubka kotvení) - splněno**
- dodavatel stavby předložil výrobní dokumentaci části elektro a ASŘ, dále zastřešení, dílčí část stavebně technického průzkumu – **splněno**
- do 1.7.2022 dodavatel stavby předloží výsledky stavebně technického průzkumu a rozešle je dle přiloženého adresáře – **splněno (doplnit, chemický rozbor betonu)**
- dodavatel stavby změní technologii řezání, nebo řezný materiál na nerezové potrubí tak, aby nedocházelo ke korozi řezaného materiálu - **splněno**
- betonové kotvení trubního vedení v kolektoru může být nahrazeno kovovou variantou příslušné třídy nerezové oceli
- vážní lístek z odvezených surovin bude předán neprodleně formou skenu na adresu: jiri.jezek@vakpce.cz; tomas.prorok@vakpce.cz - **splněno**
- projektant výrobní dokumentace monolitických konstrukcí byl telefonicky informován o kolizi stávajících ocelových desek v konstrukci nádrže, desky (4 ks) jsou v kolizi s kotvením příčných stěn – **řešení kotvení zajistí dodavatel stavby – splněno, bylo provedeno zápisem do stavebního deníku 7. a 8. 8.2022, ocelové desky budou provrtány, nebo bude kotevní výztuž navažena**

ZÁKAS STATIKA VAKPCE S.R.O.
ŘEŠENÍ DOTAZU STAVBY NA KOTVENÍ STĚN DO ŽELEZOBETONOVÝCH DESK. V PROJEKTU JE POŽADAVEK NA VYBOURÁNÍ PŘÍPADNÝCH PODLAHOVÝCH KENOSNÝCH ÚSTEV. DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SE TYTO ÚSTEVY NEVYBOURÁJÍ. DLE INFO TDI SE KENOSNÁ PODLAHA POUŽE VYKOTVAT. DOPORUČENÍ: STAVBA PROVEDE SOUHRN ZA UČELNÍ

POTVRZENÍ VÍŠE UVEDENÉHO. V PŘÍPADĚ KERATICKÝCH KENOSNÝCH ÚSTEV NEBÍ NUTNĚ PROVÁDĚNÍ DÍKEM V MÍSTĚ ULOŽENÍ STĚN, POTŘEBA ÚPRAVA PŘECHU DLE PD
ING. VALENTA
CL

- vrty provedeny a předloženy – bez vrstvy výplňového betonu v podlaze



- dodavatel stavby zajistí pevné ukotvení výškového bodu pro všechny subdodavatele - **splněno**
- dodavatel stavby aktualizuje seznam subdodavatelů a předloží ke schválení **splněno**
- dodavatel stavby předloží KZP stavby, včetně již provedených kontrol – **splněno**
- kontrolní a zkušební plán – **splněno**
dohoda o připojení a odběru elektrické energie – **splněno, dohoda u vedoucího ČOV**
seznam poddodavatelů stavby – **splněno**
certifikace poddodavatelů stavby - **splněno**
přehled rizik vznikajících při pracovních, nebo technologických postupech – **splněno – doplnit STABEDO splněno**
- dodavatel stavby provede stavebně technický průzkum dle PD a platných ČSN, pokud nebude schopen dodavatel zajistit přítomnost autorizované osoby v oboru diagnostika staveb, požádá autorský dozor o nahrazení nebo určení jiné odbornosti – **splněno**
- po provedení výztuže bude objednatel a autor výrobní dokumentace přizván k převzetí výztuže – **splněno**
- dodavatel stavby ve spolupráci se zhotovitelem výrobní dokumentace provedli zápis do hl. st. deníku ke dni 21.9.2022, v zápisu jsou popsány drobné změny ŽB konstrukcí, které byly odsouhlaseny všemi stranami přímo při konání KD (napojení hlavního trámu lávky na kluzné ložisko lokálním zesílením trámu, prostup DN 200 v hlavním trámu – pro vedení vzduchu, vysekání kapsy uložení hlavního trámu, ochranný nátěr výztuže příčných trámků a ztužidel sloupů – 5 cm, prostup podesty pro osazení míchadla – požadovaná minimální rezerva z důvodu těsnosti)
- vytyčení ŽB konstrukcí musí respektovat konstrukci zastřešení, lávky, sanací.... – prostorová koordinace nových a stávajících konstrukcí
- bude předložen náčrt řešení roštů lávky, příčných trámků a průvlaku - **splněno**
- **dodavatel** ŽB konstrukcí požádal investora o umístění věžového jeřábu pro lepší dopravu výztuže a bednění, v koordinaci s investorem bude specifikováno místo napojení el. energie, dále bude předána veškerá dokumentace týkající se dodržování BOZP koordinátorovi stavby - **splněno + aktualizace autojeřáb, jeřáb**

- doplnění plánu organizace výstavby, včetně popisu prací – umístění jeřábu do situace vč. kolizí – **splněno**
- dodavatel sdělí nutnou dobu podepření ŽB konstrukcí potvrzenou statikem – **splněno (28 dní)**
- na základě technického průzkumu bude stanoven technologický postup a specifikace materiálů pro jednotlivé druhy sanací (plocha, výztuž, trhliny, dilatace, napojení na nové konstrukce, zhlaví s lávkou..), dodavatel předloží autorskému a technickému dozoru postup k odsouhlasení – **splněno 8.8.2022 (konkrétně budou specifikovány veškeré detaily řešení napojení, prostupů, koutů.. mimo řešení zhlaví, které bude upřesněno po jeho odbourání) – částečně splněno, jižní zhlaví ubouráno, dostatečná rovinnost, možnost pouze otryskání a nátěru (zaslání technického listu nátěru zhlaví) – splněno, odsouhlasen materiál MASTERSEAL 6100 FX**
- v návaznosti na finanční harmonogram bude projednána možnost proplacení dodaných a částečně zabudovaných technologických částí – **zajistí investor stavby - SPLNĚNO**
- **dodavatel** ŽB konstrukcí předloží podklady pro zhodnocení změny kotvení konstrukcí oproti PD a dá ke schválení projektantovi a investorovi – **splněno**
- pro pískování zhlaví nádrže bude použito lešení, nebo zachytý systém – **splněno**
- Dodavatel stavby aktualizuje a předá koordinátorovi BOZP požadované podklady. - **splněno**
- Dodavatel stavby předloží výrobní dokumentaci s technickým řešením kabelových tras a jejich:
 - kotvení na zábradlí (přivaření závitové tyče na stojky zábradlí, pro upevnění konzol),
 - přechod ze zábradlí ke konkrétním spotřebičům (v ochranných trubkách kotvených v ose příčných trámků na chemické kotvy),
 - umístění kabelových tras v kolektoru (min 10 cm nad podlahou na ocelové pozinkované stojně),
 - kotvení kabelových tras nesmí být realizováno vrtáním a šroubováním do konstrukcí z „černé“ oceli, veškeré narušení povrchové úpravy musí být opraveno schváleným technologickým postupem. - **splněno**
- hlavice průtokoměrů budou umístěny buď přímo na průtokoměru, nebo na samostatném podstavci vedle průtokoměru, podstavec bude umožňovat běžné montážní práce na technologickém potrubí (dodavatel stavby prověří možnosti umístění hlavice přímo na tvarovce průtokoměru), (metrolog p. Bína poskytl podklady které byly předány f. SUMO)



v příloze je držák převodníku Siemens, který se objednává k odděleným verzím průtokoměrů. Pozor ten se objednává zvlášť, nechodí automaticky. Tento držák jde na zeď i na trubku. Oddělená verze průtokoměru se dá změnit na kompaktní, popis je v návodu k montáži. Každopádně je nevhodné dělat z oddělené verze kompaktní, protože ti zbydou kabely cívky a buzení a právě ty držáky převodníků ti zbydou.

S pozdravem

Petr Bína



- Prostupy z kolektoru do nádrže budou provedeny v nadezdívce (mezi žebry střešních panelů) – bylo zvoleno umístění v nosné stěně z důvodu vhodnosti napojení dalších tras. - **splněno**
- **Objednatel stavby (p. Dinuš) odsouhlasí umístění kabelových tras v kolektoru. - splněno**
- Deblokační krabice pro jednotlivé spotřebiče budou umístěny na volné zdi v kolektoru - **splněno**
- Dodavatel stavby provede kontrolu nově instalovaných zábradlí a doloží soulad s ČSN 74 330, měření výšky zábradlí je v rozmezí 104 – 106 cm – **splněno**
- dodavatel stavby provede aktualizaci harmonogramu prací s vyznačením období pro technologickou odstávku při přechodu na novou nádrž – **splněno, odesláno provozovateli ke konzultaci termínu vyčištění nádrže AN 14**
- Dodavatel stavby předloží nabídku a technické řešení ochrání sloupů míchadel proti účinkům abraze (laminace 8 ks sloupů do výšky 1,5 m). – **splněno, předáno provozovateli k odsouhlasení, nedoporučeno projektantem**
-
-



Adresář:

<u>jméno</u>	<u>tel:</u>	<u>email:</u>	<u>zařazení</u>
Vodička Oldřich	724 037 034	oldrich.vodicka@vakpce.cz	manažer provozovny BČOV
Miroslav Tománek	724 306 174	miroslav.tomanek@vakpce.cz	vedoucí odd. údržby
Milan Fichtner	724 279 430	milan.fichtner@vakpce.cz	vedoucí skupiny
Jiří Ježek	775 887 561	jiri.jezek@vakpce.cz , jirkajezek@gmail.com	investiční oddělení
Jan Chaloupka	607 991 273	chaloupkaj@centrum.cz	koordinátor BOZP
Miloš Kočárník	731 629 782	kocarnik@envi-pur.cz	manažer pro klíčové projekty
Pavel Zíka	737240 821	zika@envi-pur.cz	stavbyvedoucí
Julius Juhas	732 191 394	julius.juhas@hotmail.com	mistr
Martin Čáp	603 593 891	martin.cap@martincap.cz	ČÁP CZ s.r.o.
Jiří Unger	608 114 990	unger@ekoeko.cz	EKOEKO s.r.o.
Martin Bílek	775 141 375	bilek@stabedo.cz	STABDEDO s.r.o.
Keno Dimov	602 773 695	keno@ecodec.cz	ECODECMAN s.r.o.
Petr Hromádko	770 174 150	petr.hromadko@sumo.team	SUMO, s.r.o.

V Pardubicích dne 15.02.2023

zapsal: J. Ježek

Prohlášení o nosnosti kompozitních poklopů a krytů PREFAPLATE s odvodňovacími otvory

Charakteristika a popis užití:

Kompozitní poklopy PREFAPLATE jsou určeny pro zakrytí otvorů v konstrukcích uvnitř i vně staveb, zejména pro aplikace v prostorách s požadavky na odolnost vůči korozi a působení chemikálií a v prostorách s prostředím vlhkým nebo mokrým. Jsou použity v zákrytových, přechodových, stropních deskách objektů inženýrských nebo průmyslových staveb a v dopravních komunikacích. Jsou ukládány do kompozitního nebo nerezového rámu osazeného v konstrukci, případně jsou samostatně instalovány na nosné konstrukci kompozitní, ocelové či betonové. Poklopy mají deklarovanou třídu reakce na oheň, jsou bez požární odolnosti. Poklopy se zpravidla vyrábějí na míru pro konkrétní tvar a rozměry dle požadavku objednatele. Mohou být konstruovány jako plné kompozitní desky nebo jako sendvičová struktura, jejíž jádro je tvořeno zpravidla kompozitním roštem PREFAGRID nebo PREFAPOR. Rošty mohou být rovněž potaženy jen z jedné strany.

Kompozitní poklopy a kryty:

- lze použít v prostorech se specifikovanými požadavky na požární bezpečnost na základě zvláštního posouzení.
- lze je použít na konstrukce v přímém styku s pitnou vodou.
- mají protiskluzný povrch
- vyhovují těmto normám:

ČSN EN ISO 14122-2	„Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 2: Pracovní plošiny a lávky
ČSN 73 2030	„Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení“
ČSN 74 6930	„Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení“
ČSN EN 124-1	„Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, požadavky a zkušební metody“
ČSN EN 124-5	„Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 5: Poklopy a vtokové mříže z kompozitu“

PREFA KOMPOZITY, a.s.

Kulkova 10/4231

615 00 Brno

www.prefa-kompozity.cz



Nosnost krytů PREFAPLATE

Kryty PREFAPLATE mají deklarovanou nosnost, která je zajištěna tím, že se jedná o:

- Plnou desku z kompozitního materiálu nebo
- Desku z laminátem potaženého roštu, přičemž nosnost zajišťují rošty PREFAGRID nebo PREFAPLATE, a s příspěvkem potahu k nosnosti se nepočítá

Ať už plné desky nebo rošty, které jsou použity pro jejich výrobu jsou průběžně testovány ve vlastních laboratořích firmy v rámci systému ISO 9001:2016 a v akreditované zkušebně - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka Brno, AO 204

V některých případech může dojít při laminaci potahu na jádro z nosného roštu ke vzniku pnutí, které je způsobeno smrštěním pojiva při jeho vytvrzení. Projevuje se to zejména u jednostranně potažených krytů. Důsledkem vzniku pnutí je prohnutí krytu.

Na základě výše uvedeného a pro vzorové technické řešení prohlašujeme, že dodané kompozitní kryty Prefaplate vykazují průměrný průhyb do 15 mm na rozpětí 2 m v podélném směru a do 3 mm na rozpětí 1 m v příčném směru. Z důvodu vzniku kaluží a potencionálně namrzlých ploch navrhujeme odvodňovací otvory, které jsou pouze v potahu krytu a nezasahují do jeho nosné části. Toto řešení zaručuje, že neztratí svoji nosnost a ani není ovlivněna jejich životnost. Nedílnou součástí tohoto prohlášení je detail uložení a kotvení jednotlivých dílců a schéma s umístěním a průměrem jednotlivých otvorů.

Toto prohlášení lze podložit záruční dobou v délce 60 + 12 měsíců. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad 2 x záruční prohlídku, která proběhne do 30 ti dnů od výzvy investora.

PREFA KOMPOZITY, a.s.

Kulkova 10/4231, 615 00 Brno

IČO: 26949881, DIČ: CZ26949881

V Brně dne 13. 2. 2023

Ing. Jan Prokeš, Ph.D.
představitel managementu pro jakost

PREFA KOMPOZITY, a.s.

Kulkova 10/4231

615 00 Brno

www.prefa-kompozity.cz




PREFA KOMPOZITY

Příloha: Vzorové technické řešení kompozitních krytů Prefaplate s odvodňovacími otvory



PREFA KOMPOZITY, a.s.
Kulkova 10/4231
615 00 Brno
www.prefa-kompozity.cz

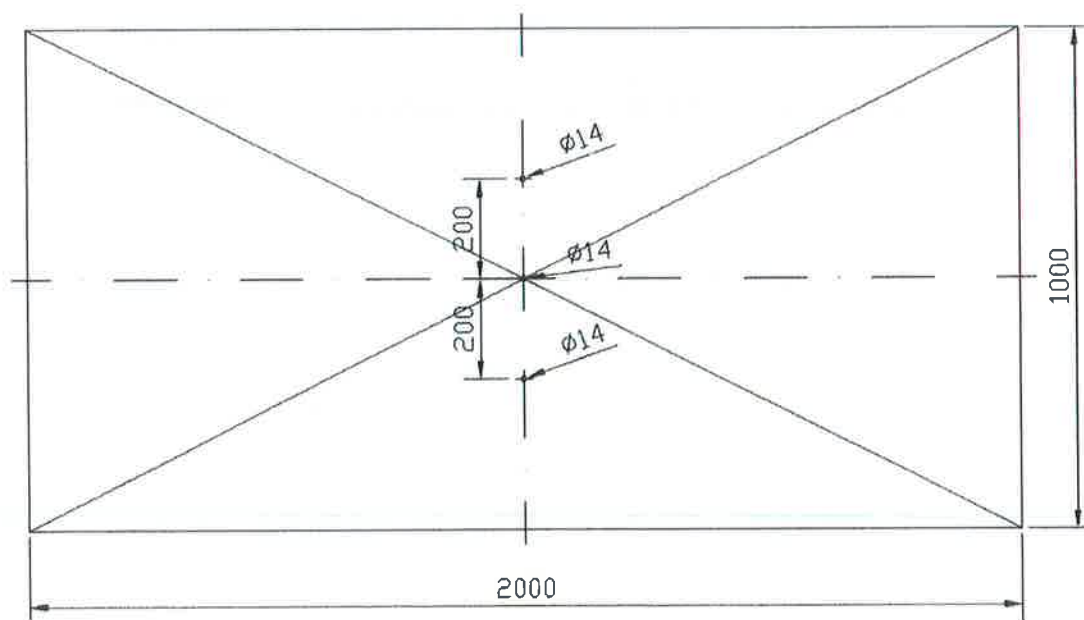

ENVI-PUR, s.r.o.

Hlavní kancelář a výroba

Wilsonova 420

392 01 Soběslav

V Soběslavi dne 27.2.2023


PŘÍLOHA Č. 1 – k Prohlášení o nosnosti kompozitních poklopů a krytů PREFAPLATE s odvodňovacími otvory

Věc: Výpočet vrtaných otvorů do pochozího kompozitového roštu

Ze zápisu z KD dne 22.2.2023

„-dle požadavku PD musí celková koncepce lávky, zastřešení, technologií a sanací splňovat požadavek na těsnost (viz zápis níže - 0,6 m² náhradní otvor na dvě nádrže)“

Návrh vrtání otvoru pro odvod vody

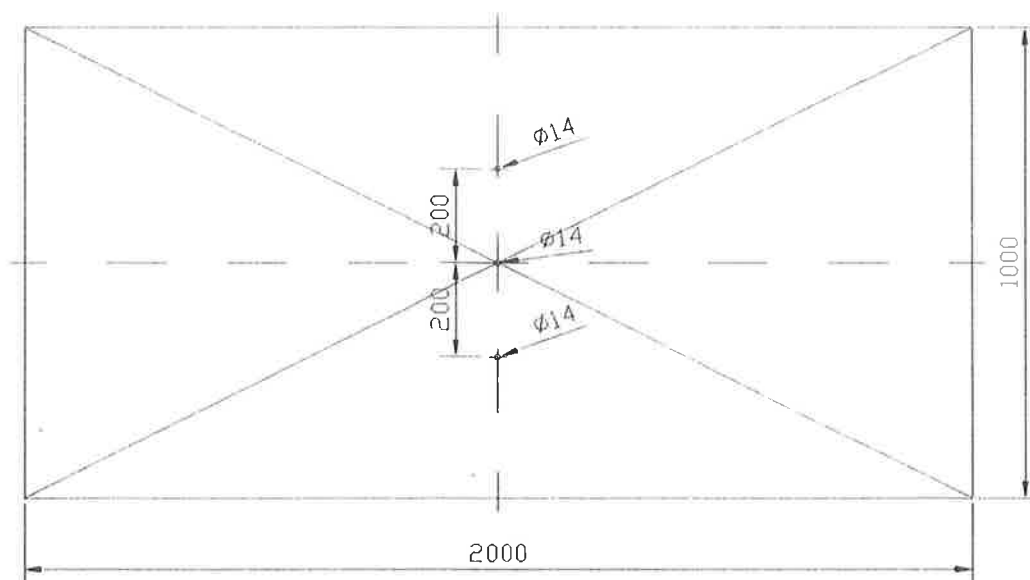

Výpočet celkové plochy vrtaných otvorů

Deska má rozměry 1000 mm x 2000 mm (72 ks)

$S = 3,14 \times r^2 = 3,14 \times 0,007 \times 2 = 3,14 \times 4,9 \times (10^{-5}) = 1,5 \times (10^{-4}) \text{ m}^2 \times 3 \text{ (otvory)} \times 36 \text{ (desek v sekci 1+2)} = 0,00054 \text{ m}^2$. To je celková plocha pro odtok dešťové vody a možnost svévolného odkapu ze sekce 1,2.

Závěr:

Celková plocha vrtaných otvorů splňuje požadavek projektu nepřekračující 0,6m².

Ing. Miloš Kočárník
Manažer pro klíčové projekty
kocarnik@envi-pur.cz

ENVI-PUR, s.r.o.
Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6
Tel.: 220 923 008, fax: 220 972 305
IČO: 25166077 DIČ: CZ25166077



9_lávka, podvěsný koš

1	Přímý materiál								4 ks			77843
2	Mzdy								4ksx4lidi x 5hod= 20	x 510		40800
3	Odvody											14280
4	Stroje								4ksx5000			20000
5	Ostatní přímé náklady								300km	32Kč/Km		9600
6	Přímé zpracovací náklady											84680
	Přímé náklady											162523
7	Režie výrobní											41493
8	Režie správní											22864
	Nepřímé náklady											64357
	Náklady celkem											226880
9	Zisk											4471
10	Nekalkulované náklady											
	Jednotková cena celkem											231351

Jed.Cena

Celkem 4 ks lávky	4	57838
-------------------	---	-------

nákladový soupis prací (soupis SAP)

nákladový soupis prací, materiálu

IS č.79 - Kalkulační sazby (510 Kč/hod)

Lešení 4 x 5000 Kč

mapy.cz Soběslav-Pardubice a zpět

demontáž, zpětná montáž (přesun)

300 km/deleno 4 ks = 75Km/1 ks lávky


Kusovník

Kód produktu: AF0002
 Popis produktu: Pomocný kusovník Friml - Lávka
 Množství: 1
 Typ: Výroba

Datum: 21/03/2023
 Čas: 14:28
 Uživatel: Friml Adam
 DIČ: CZ25166077

#	Artikl	Popis artiklu	MJ	Množství	Zásoba	Sklad	Cena za kus	Celkem
1	M10404100001310	Podložka 13 A4 9021v	ks	64	42	021-1	5,25	336,00
2	M1040410000130	Podložka 13 A4 125	ks	64	368	021-1	2,46	157,44
3	M1040410000106	Podložka 10.5 A4 9021 v	ks	16	34	021-1	3,65	58,40
4	M1040410000105	Podložka 10.5 A4 125	ks	16	27	021-1	1,20	19,20
5	M10403100001200	Matice M 12 A4 DIN 934	ks	64	12	021-1	4,30	275,20
6	M1040310000102	Matice M 10 A4 934	ks	16	325	021-1	2,96	47,36
7	M1040210120401	Šroub M 12x40 A4 933	ks	64	46	021-1	9,80	627,20
8	M1040210100400	Šroub M 10x40 A4 933	ks	16	12	021-1	8,70	139,20
9	M10601060601002001	Plech 6x1000x2000 AISI 316L 1D	ks	3,25	0,96	044-1	11.328,00	36.816,00
10	M1060101040040021	Jekl 40x40x 2 AISI 316 (1.4404)	m	16	3,5	021-1	369,00	5.904,00
11	120	Vodní paprsek-řezání		1		021-1	28,00	28,00
12	121	Vodní paprsek / Laser – programování		60		021-1	11,67	700,20
13	122	Vodní paprsek / Laser – manipulace		172		021-1	8,00	1.376,00
14	123	Laser- řezání		129		021-1	60,00	7.740,00
15	8010	R0010-PRÁCE-výroba KOVO		20		021-1	480,00	9.600,00
16	310	Výstupní kontrola + příjem na sklad		1		021-1	1,00	1,00
17	600	Odvoz výrobku na sklad		1		021-1	1,00	1,00
18	M104063012100	Kotva MUNGO m2r 12x15/110 A4	ks	32	351	021-1	65,80	2.105,60
19	M10222010030030382	Rošt 30x30/38 1220x4000 kompozitní PREFAGRID	ks	1	4	021-1	11.911,00	11.911,00

Komponenty celkem: 77.842,80 CZK
Nadřazená cena: 77.842,80 CZK

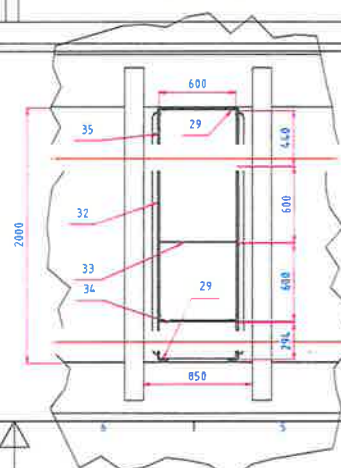

35	a	Roř 30x30x28	120x4000	140 mm	180 mm	HM22-10005001000	
kompozit PROFESION							
36	a	Roř 30x30x28	120x4000	170 mm	180 mm	HM22-10005001000	
kompozit PROFESION							
37	b	Roř 30x30x28	120x4000	160 mm	180 mm	HM22-10005001000	
kompozit PROFESION							
38	a	Podvořek lárky					27136-276-2
39	a	Kulva HUNG 60x110x170 AB				HM22-10005001000	
40	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
41	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
42	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
43	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
44	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
45	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
46	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
47	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
48	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
49	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
50	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
51	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
52	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
53	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
54	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
55	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
56	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
57	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
58	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
59	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
60	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
61	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
62	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
63	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
64	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
65	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
66	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
67	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
68	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
69	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
70	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
71	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
72	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
73	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
74	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
75	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
76	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
77	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
78	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
79	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
80	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
81	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
82	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
83	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
84	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
85	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
86	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
87	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator
88	a	Progr	Plastizator	Dřev	Gal	plastizator	Plastizator

21.03.2023

VINOCEKL

Ing. Kubala





02734 COV.Pandol

Sestava A1

Podvěžené

Course report

LD21:

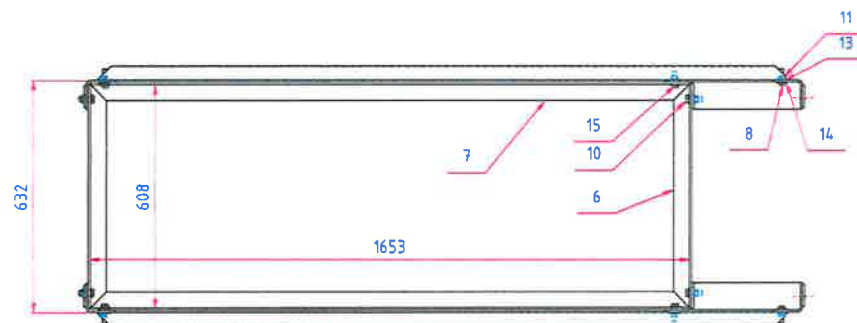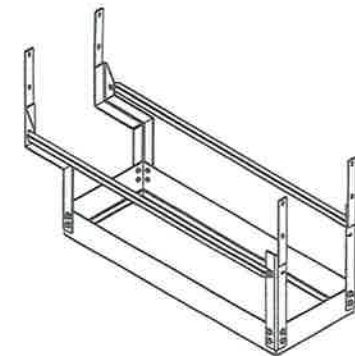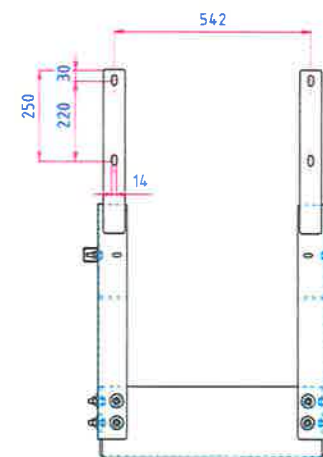
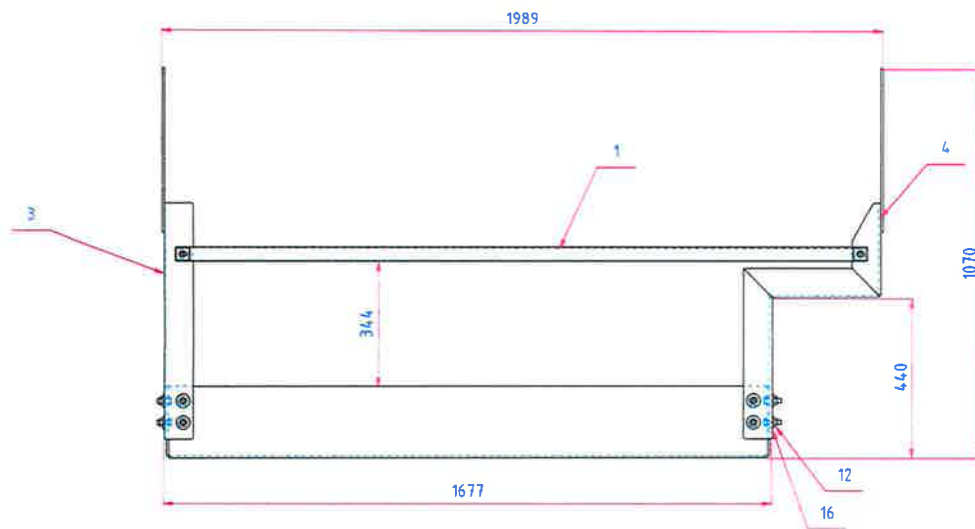


Díly kotvit a šroubovat
dle potřeby při montáži



Díly z hraněných plechů P6
mat.: AISI 316L

16	16	Podložka 13 A4 9021v				M10404100001310	
15	16	Podložka 13 A4 125				M1040410000130	
14	4	Podložka 10.5 A4 9021v				M10404100001010	
						6	
13	4	Podložka 10.5 A4 125				M1040410000105	
12	16	Matice M 12 A4 DIN 934				M10403100001200	
11	4	Matice M 10 A4 934				M1040310000102	
10	12	Šroub M 12x40 A4 933				M1040210120401	
9	4	Šroub M 12x40 A4 933				M104021012035	
8	4	Šroub M 10x40 A4 933				M1040210100400	
7	2	L1					D2136-276-1
6	2	L2					D2136-276-2
5	1	Noha 1					D2136-276-3-0
4	1	Noha 3					D2136-276-4-0
3	1	Noha 2					D2136-276-5-0
2	1	Noha 4					D2136-276-6-0
1	2	Z1					D2136-276-7
Poz	Ks	Popis	Polotovár	Délka	Šířka	Skiz polotovaru	Číslo výkresu

Kurz	4	2768-cK	Číslo výkresu				
Platnost od	21.03.2023	Projekt/Zakázka od	D2136-fov-Pardubice	Reviz	18.67 kg	Verze	1/1
Kreslil	VNOUCEKL	Podpis	Podvěsná lávka	Číslo výkresu			
Šel	Ing. Kubálek						
Číslo výkresu				D2136-276-0			



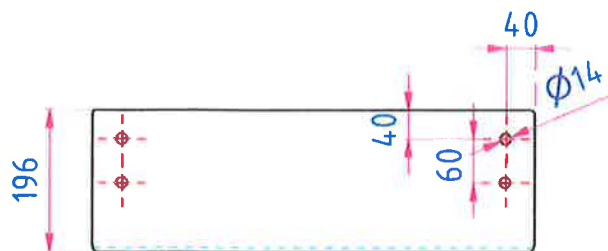



Rozvin (1 : 10)

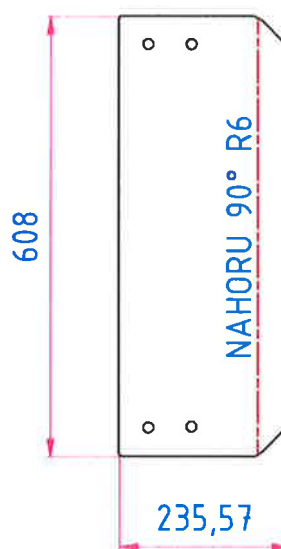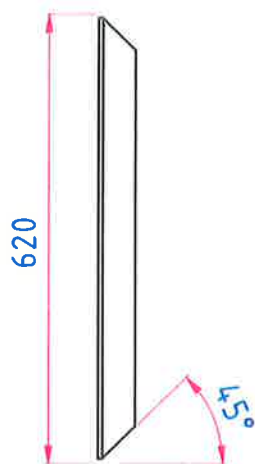

Plech 6x1000x2000		AISI 316L 1D	618 mm	243,6 mm	M10601060601002001	Ano		
Polotovarov			Délka	Šířka	Skl.č.poloťovaru	Výpalek		
Ks/Kpl:	Dle ISO:		Číslo výrobní zakázky:			enviropur		
8	2768-cK							
Platnost od:		Projekt/Zakázka odběratele:			Revize:	Hmotnost:	Měřítko:	List:
20.03.2023		D2136-ČOV-Pardubice				6,79 kg	1 : 10	1/1
Kreslil:	Popis:		Číslo výkresu:					
VNOUCEKL	L2							
Schválil:	Hranění		D2136-276-2					
Ing. Kubálek								
Cesta souborů: C:\Vaulf_pracovní\dokumentace\03 DOKUMENTACE BC\D2136 ČOV Pardubice\výkresy\D2136-276-2 L2.idw								


Cesta souborů: C:\Vault\pracovní\dokumentace\03 DOKUMENTACE BC\D2136 ČOV Pardubice\výkresy\D2136-276-2 L2.idw

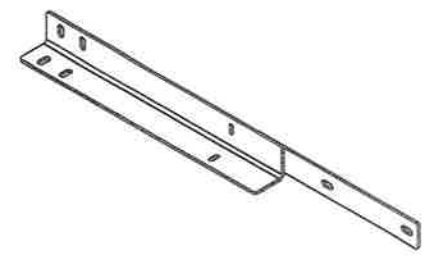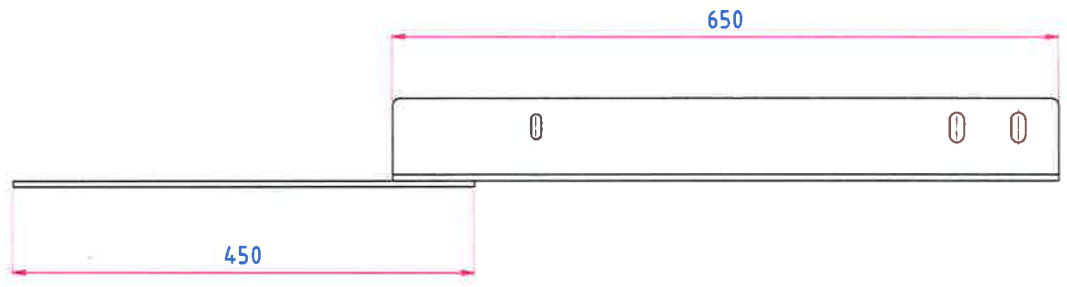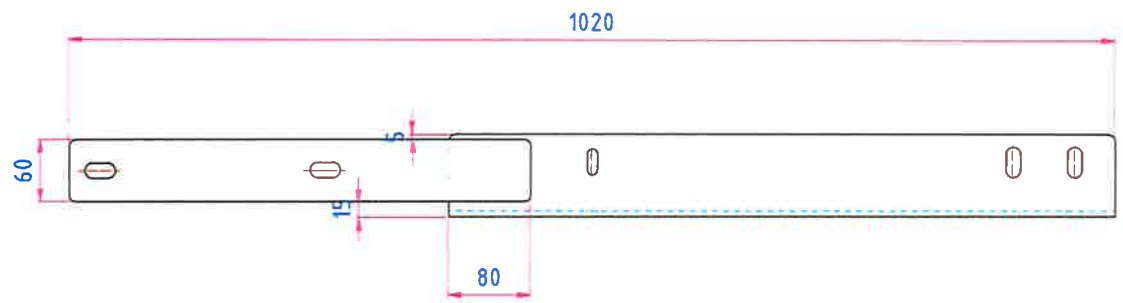

Svařenec

2	1	N1_2		D2136-276-3-2
1	1	N1_1		D2136-276-3-1
Poz.	Ks	Popis	Rozměr	Číslo výkresu


Ks/Kpl:	4	Ole ISO:	2768-cK	Číslo výrobní zakázky:							
Platnost od:	20.03.2023	Projekt/Zakázka odůvodnění:	D2136-ČOV-Pardubice	Revize:		Hmotnost:	5,86 kg	Měřítko:	1 : 5	Lisť:	1/1
Kreslil:	VNOUCEKL	Popis:	Noha 1	Číslo výkresu:	D2136-276-3-0						
Schválil:	Ing. Kubálek										
Cesta souboru:	C:\Vaud\pracovní\dokumentace\03 DOKUMENTACE BC\02136 ČOV Pardubice\výkresy\02136-276-3-0 Noha 1.dwg										

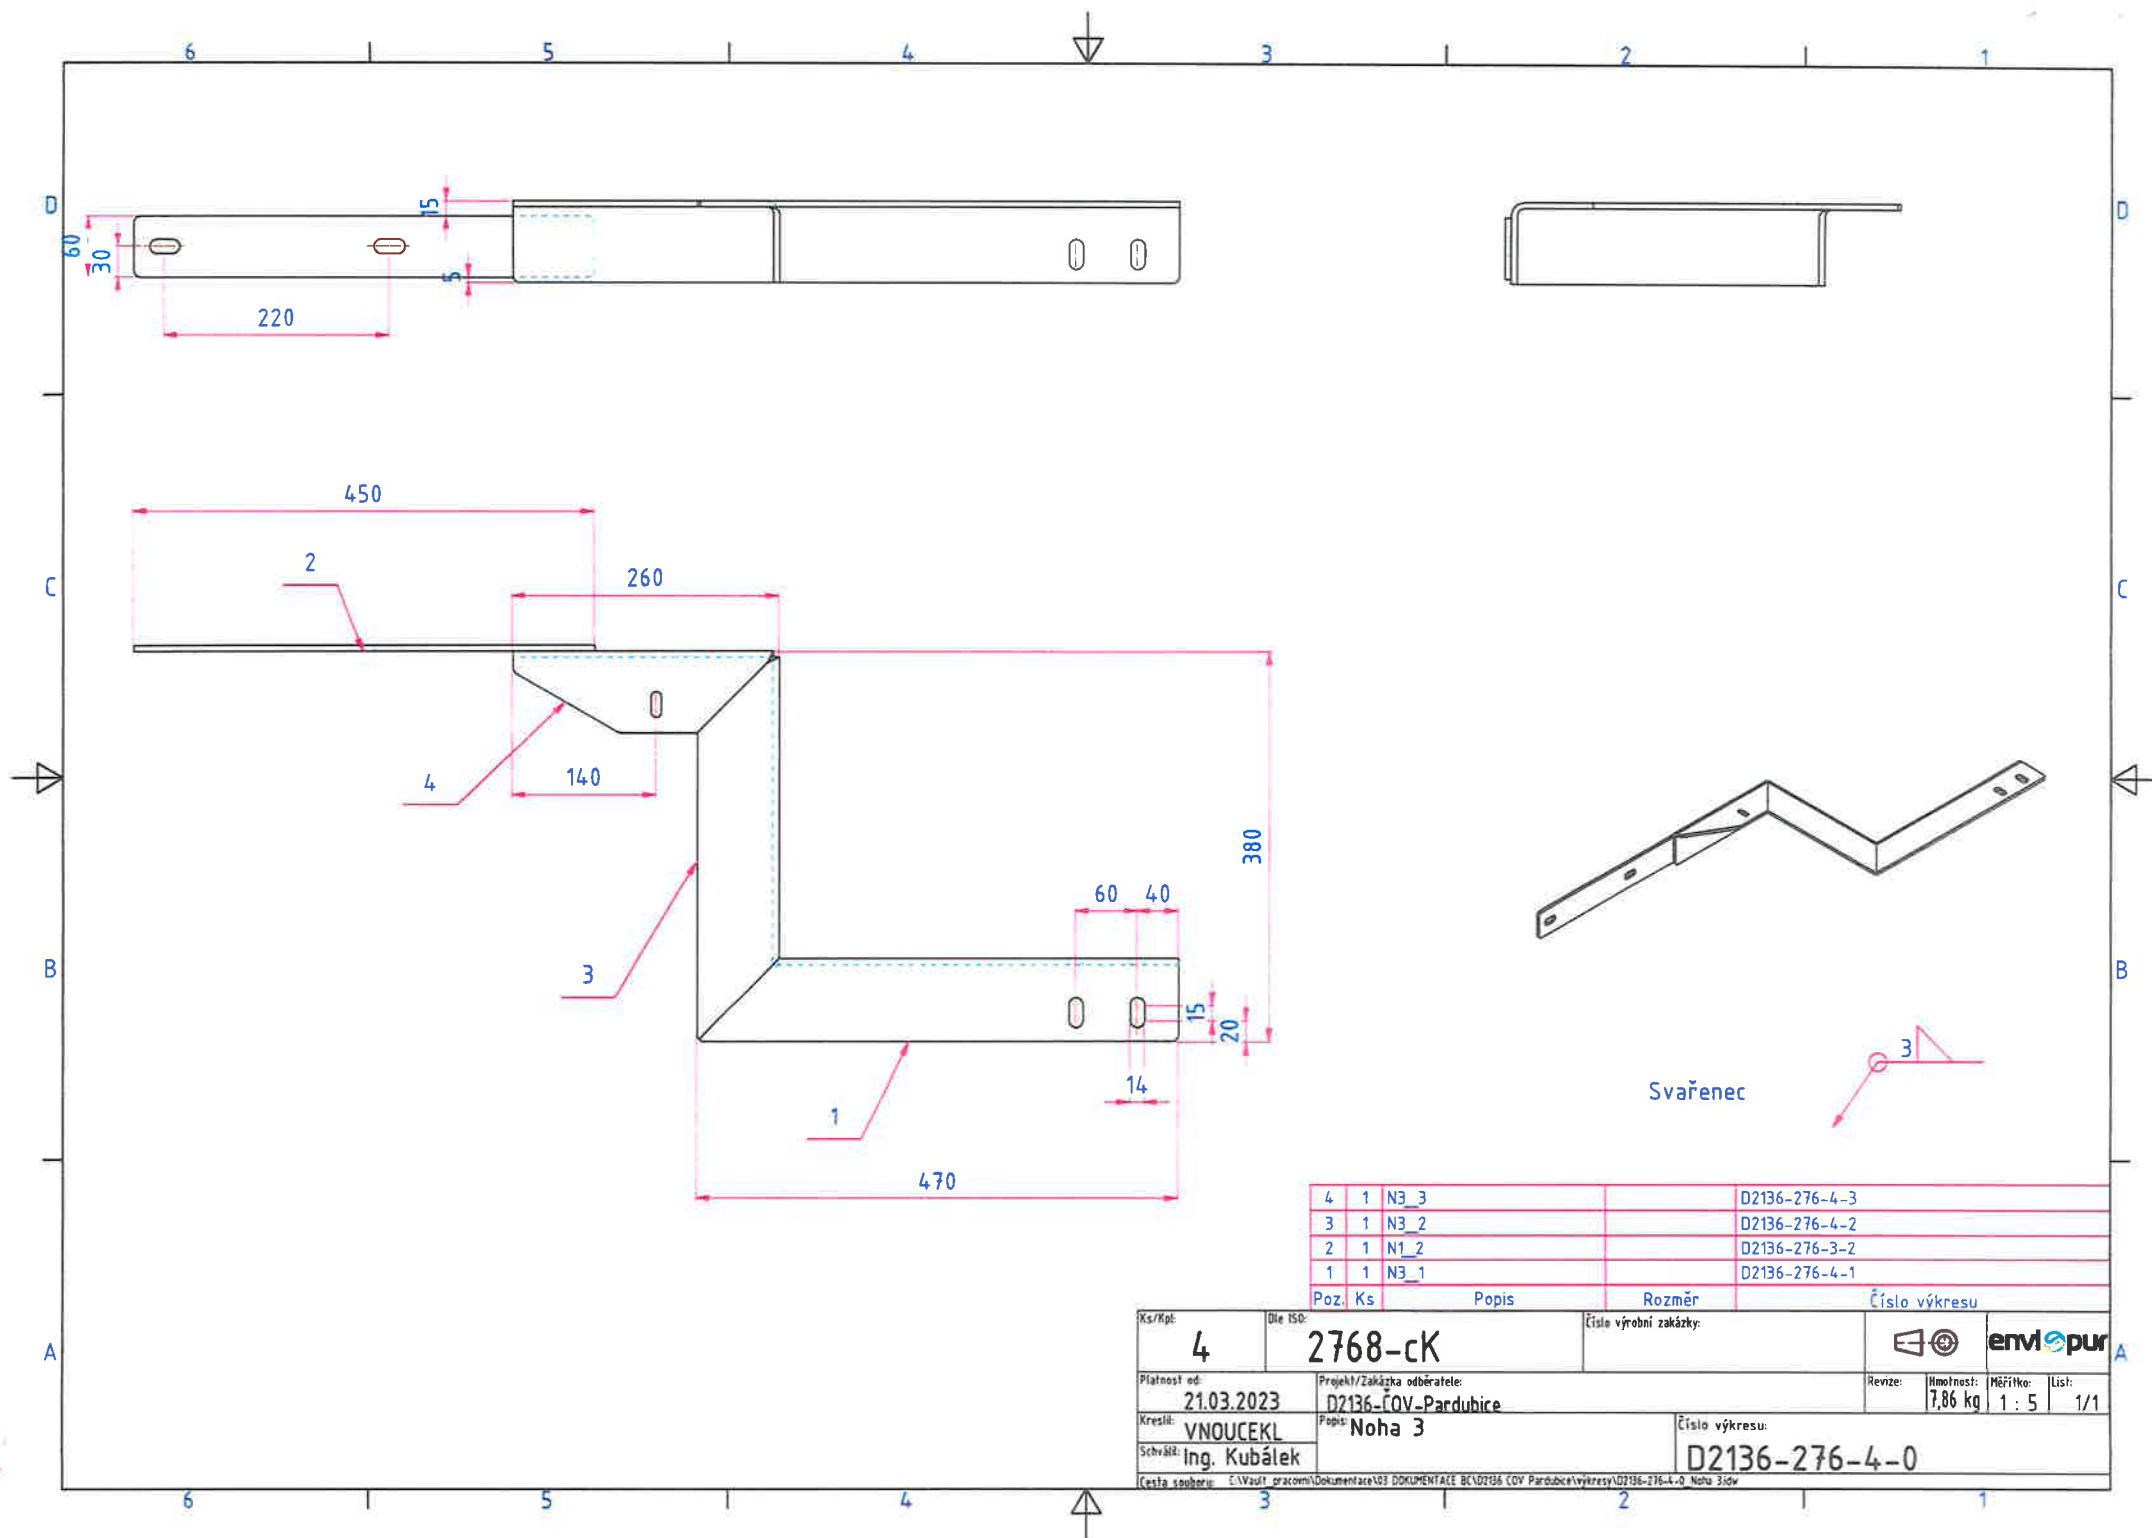

4	1	N3_3		D2136-276-4-3
3	1	N3_2		D2136-276-4-2
2	1	N1_2		D2136-276-3-2
1	1	N3_1		D2136-276-4-1
Poz.	Ks	Popis	Rozměr	Číslo výkresu

Ks/Kpl:	4	Dle ISO:	2768-cK	Číslo výrobní zakázky:							
Platnost od:	21.03.2023	Projekt/Zakázka od:	D2136-ČOV-Pardubice	Revize:		Hmotnost:	7,86 kg	Měřítko:	1 : 5	Lis:	1/1
Kreslil:	VNOUCEKL	Popis:	Noha 3	Číslo výkresu:							
Schválil:	Ing. Kubálek										
Číslo souboru:	C:\Vaut\pracovní\ Dokumentace\03 DOKUMENTACE BC\02136-ČOV Pardubice\výkresy\02136-276-4-0 Noha 3.dwg										

D2136-276-4-0

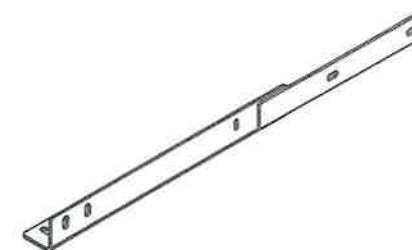

2	1	N1_2		D2136-276-3-2
1	1	N1_1		D2136-276-3-1
Poz.	Ks	Popis	Rozměr	Číslo výkresu

Ks./Kpl:	Dle ISO:	Číslo výrobní zakázky:		
4	2768-cK			
Platnost od: 20.03.2023 Kreslil: VNOUCEKL Schválil: Ing. Kubálek		Projekt/Zakázka oděratele: D2136-COV-Pardubice Noha 2	Revize: 5,86 kg Měřítko: 1 : 5 List: 1/	
Číslo výkresu: D2136-276-5-0		Číslo výkresu: D2136-276-5-0		
Cesta souboru: C:\Vauti\pracovni\Documentare\03 DOCUMENTACE\BC\2136 COV-Pardubice\výkresy\2136-276-5-0 Noha 2.dwg				

